


Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O

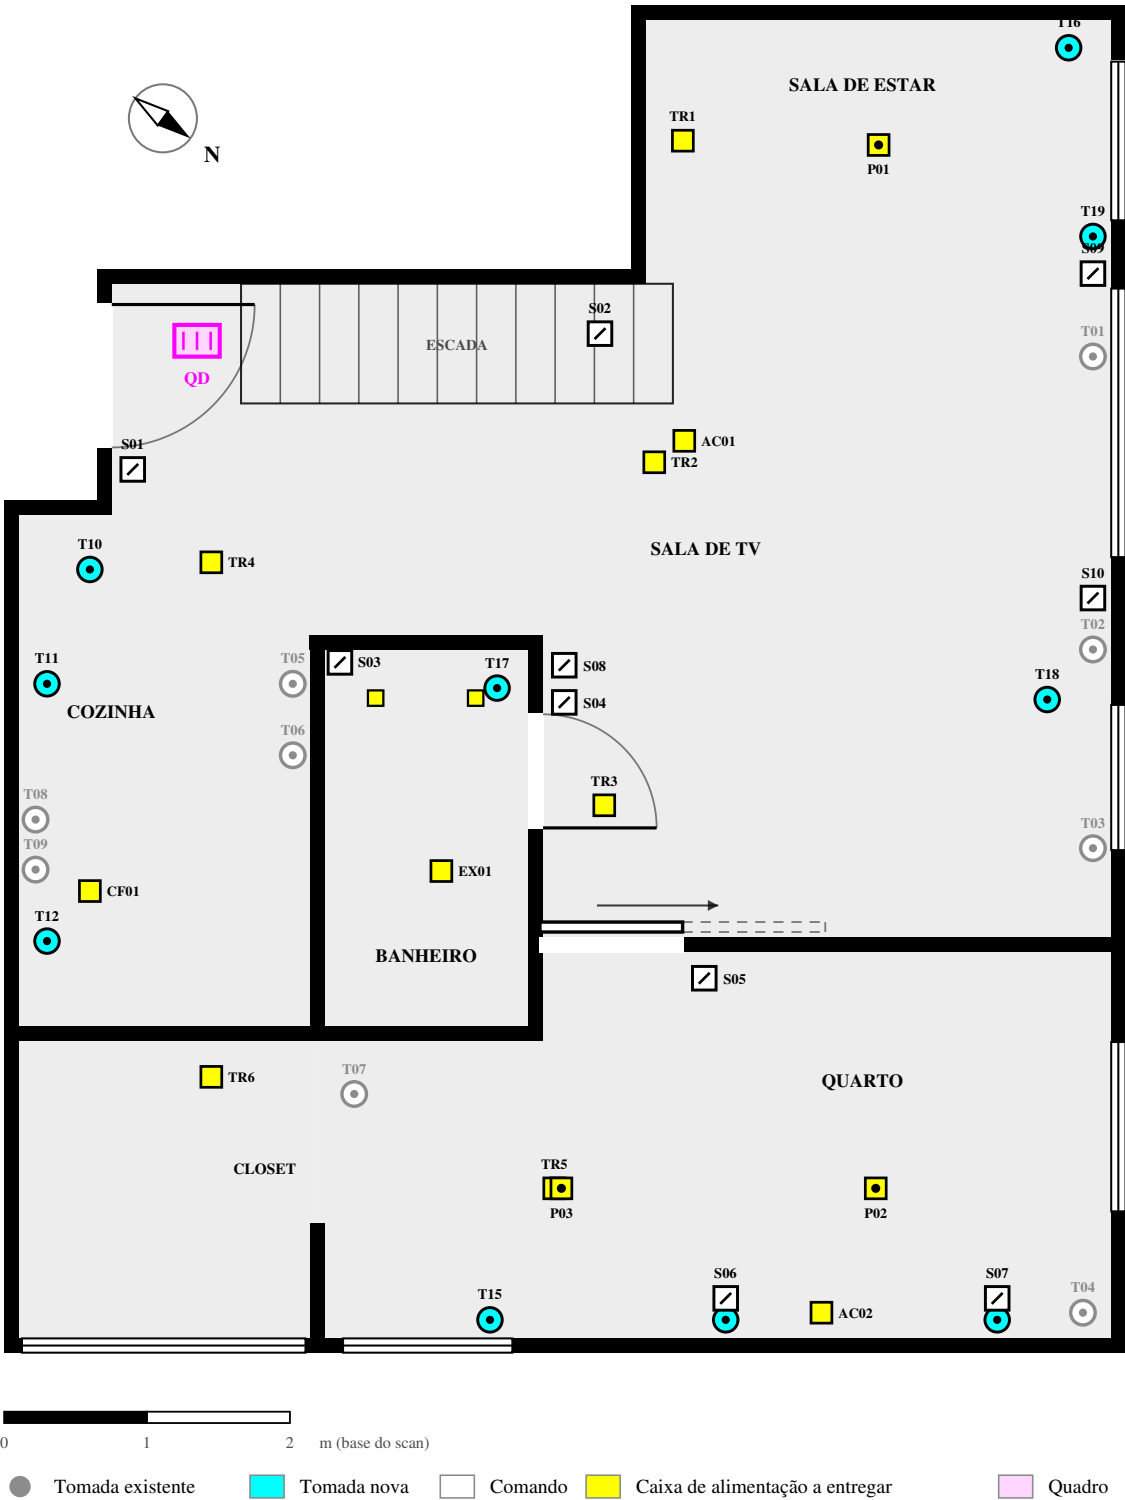

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T19	Tomadas novas, T18 é espera no teto	10 pontos
S01–S10	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	10 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
AL1	Alimentação de trilho no teto — entregar caixa (ver FO4)	6 pontos
AL2	Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)	3 pontos
AL3	Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)	2 pontos
AL4	Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)	2 pontos
AL5	Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)	2 pontos
AL6	Espera do motor da claraboia: caixa T18, eletroduto e guia até S10 (ver FO6)	1 ponto
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Levantamento e ensaio — E02.**
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- Estudo de demanda e projeto executivo.**
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- Marcação de pontos em obra.**
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- Infraestrutura embutida — IN1.**
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- Infraestrutura aparente no teto — IN2.
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
- Descidas, caixas e passagem de cabos.**
Concluir antes do piso.
- Entrega das alimentações — AL1 a AL6.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4), o ar (FO5) e a claraboia (FO6, 2027/28) instalarem sem abrir laje.
- Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
- Ensaio — EN.
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- Ligação final e acabamento de placas.
Somente após a pintura concluída.
