


Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. O

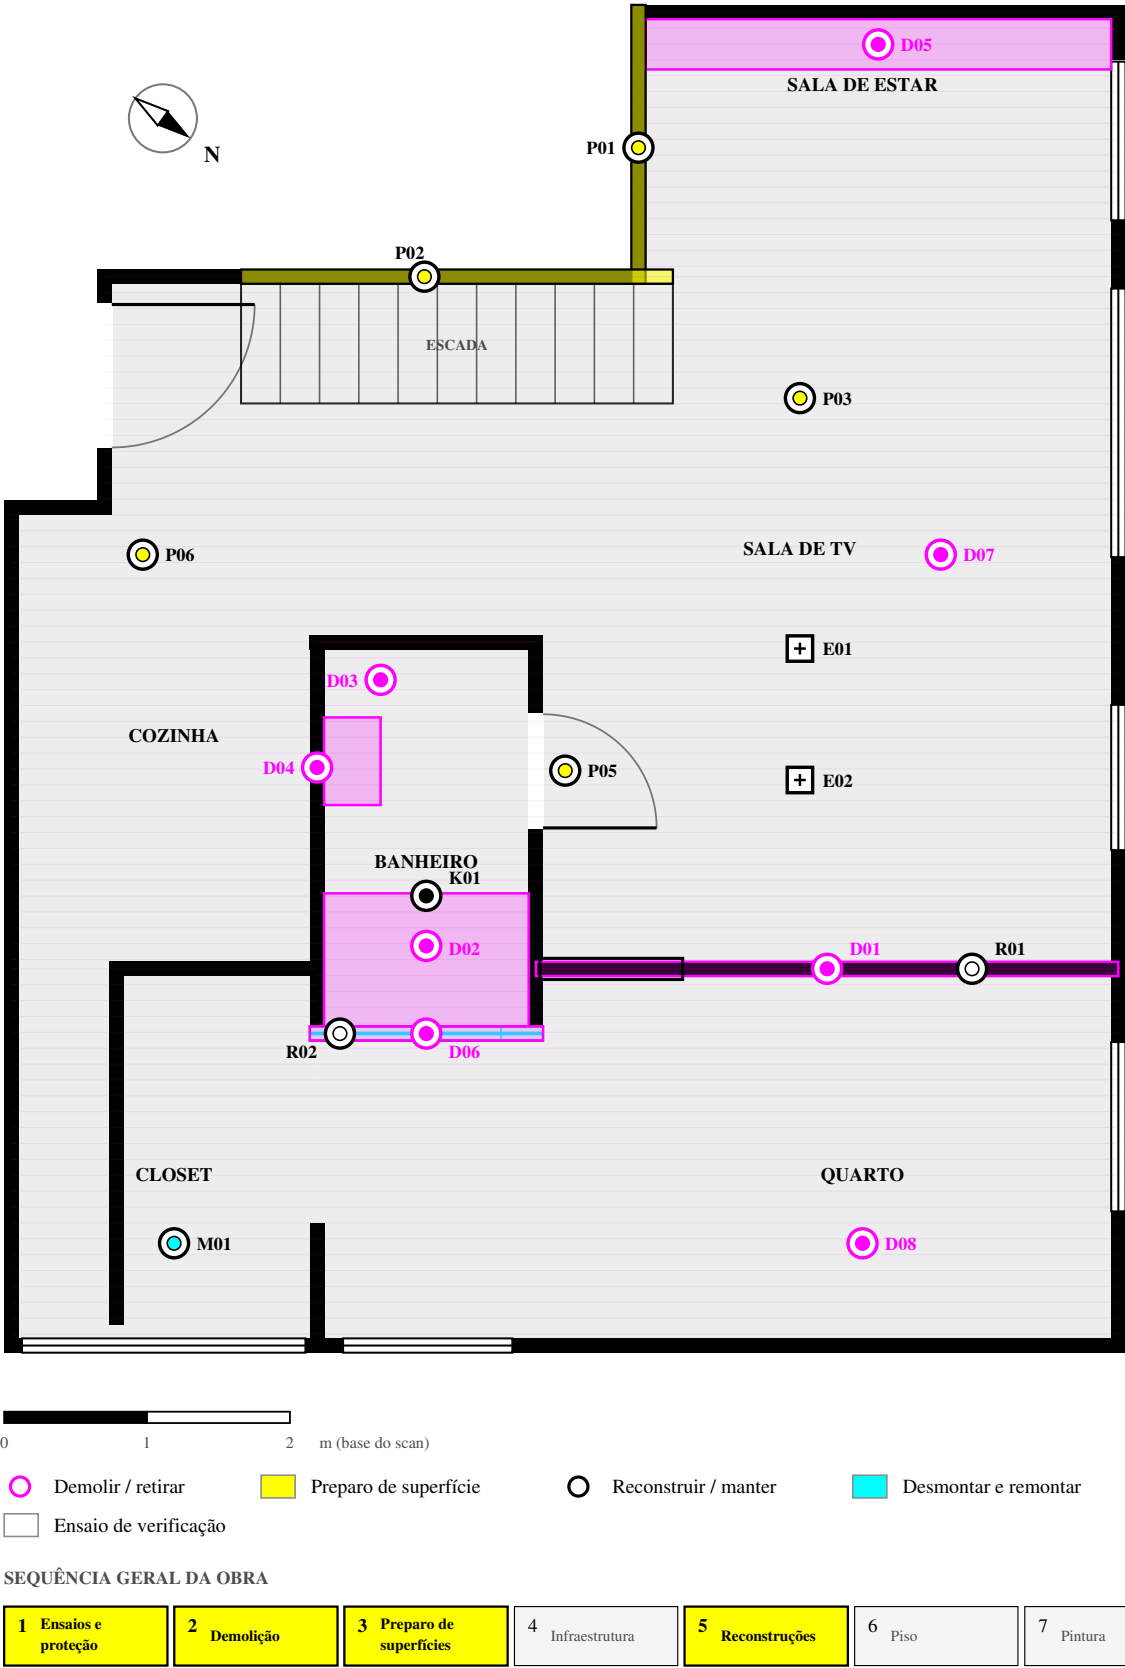

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	1 ensaio
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	1 ensaio
M01	Desmontar closet, etiquetar módulos e ferragens, acondicionar	1 conjunto
D05	Retirar canto alemão da sala de estar	1 conjunto
D07	Retirar forro — 100%	60,30 m²
D01	Demolir drywall entre sala de TV e quarto	4,08 m
D02	Demolir fechamento e base do box do banheiro	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Demolir parede atrás do espelho e da bancada do banheiro	2,64 m a conferir
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m²
D03	Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje	3,80 m²
P01	Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento	1,95 m
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	a confirmar
P04	Demais paredes com revestimento retirado	mapear em obra
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m²
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado	60,30 m²
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única
R01	Reconstruir drywall sala de TV/quarto com vão de porta 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 vão
R02	Construir parede de fechamento do fundo do box	1,63 m
K01	Vidro do box — MANTER e proteger	1 peça

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Ensaios antes de qualquer demolição — E01 e E02.**
Resultado por escrito antes de abrir parede ou piso.
- 2 Proteção e canteiro.**
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
- 3 Desmontagem — M01 e D05.**
Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão da sala de estar.
- 4 Forro — D07, 100%.**
Libera a laje e revela a altura livre real.
- 5 Vedações — D01, D02, D06 e D04.**
- 6 Pisos e base — D08 e D03.**
Banheiro desce até a laje.
- 7 Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.**
- 8 Laje — P03.**
Restauro, descascamento e limpeza.
- 9 Reconstruções — R01 e R02.**
R01 fecha somente após a infraestrutura elétrica embutida.
- 10 Contrapiso e nível — P06 e P05.**
Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.
