


Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do caderno de estudo REV. M

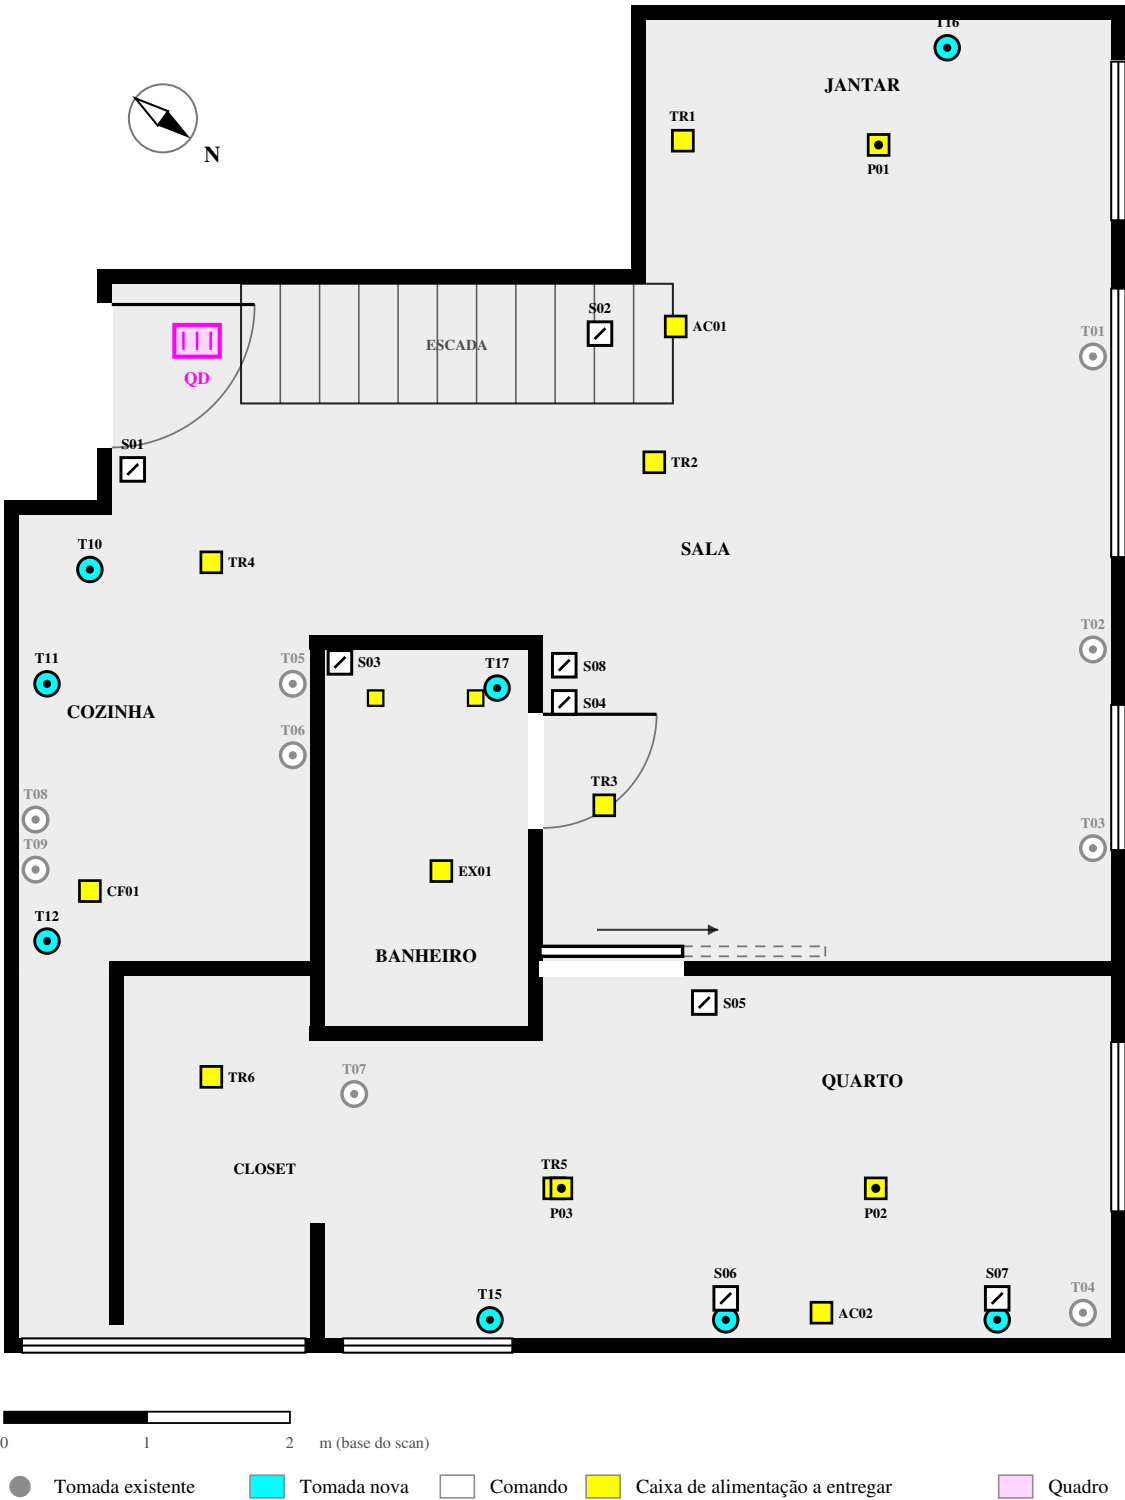

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T17	Tomadas novas	8 pontos
S01–S08	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	8 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
AL1	Alimentação de trilho no teto — entregar caixa (ver FO4)	6 pontos
AL2	Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)	3 pontos
AL3	Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)	2 pontos
AL4	Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)	2 pontos
AL5	Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)	2 pontos
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Levantamento e ensaio — E02.**
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- 2 Estudo de demanda e projeto executivo.**
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- 3 Marcação de pontos em obra.**
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- 4 Infraestrutura embutida — IN1.**
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- 5 Infraestrutura aparente no teto — IN2.**
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
- 6 Descidas, caixas e passagem de cabos.**
Concluir antes do piso.
- 7 Entrega das alimentações — AL1 a AL5.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4) e o ar-condicionado (FO5) instalarem sem abrir parede ou laje.
- 8 Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.**
- 9 Ensaio — EN.**
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- 10 Ligação final e acabamento de placas.**
Somente após a pintura concluída.
