


Escopo da alteração

Detalhe cozinha · closet · banheiro, no estado atual, com o que sai e o que entra.

1 parede nova · 2 trechos demolidos

deslocamento de 0,45 m para o sul

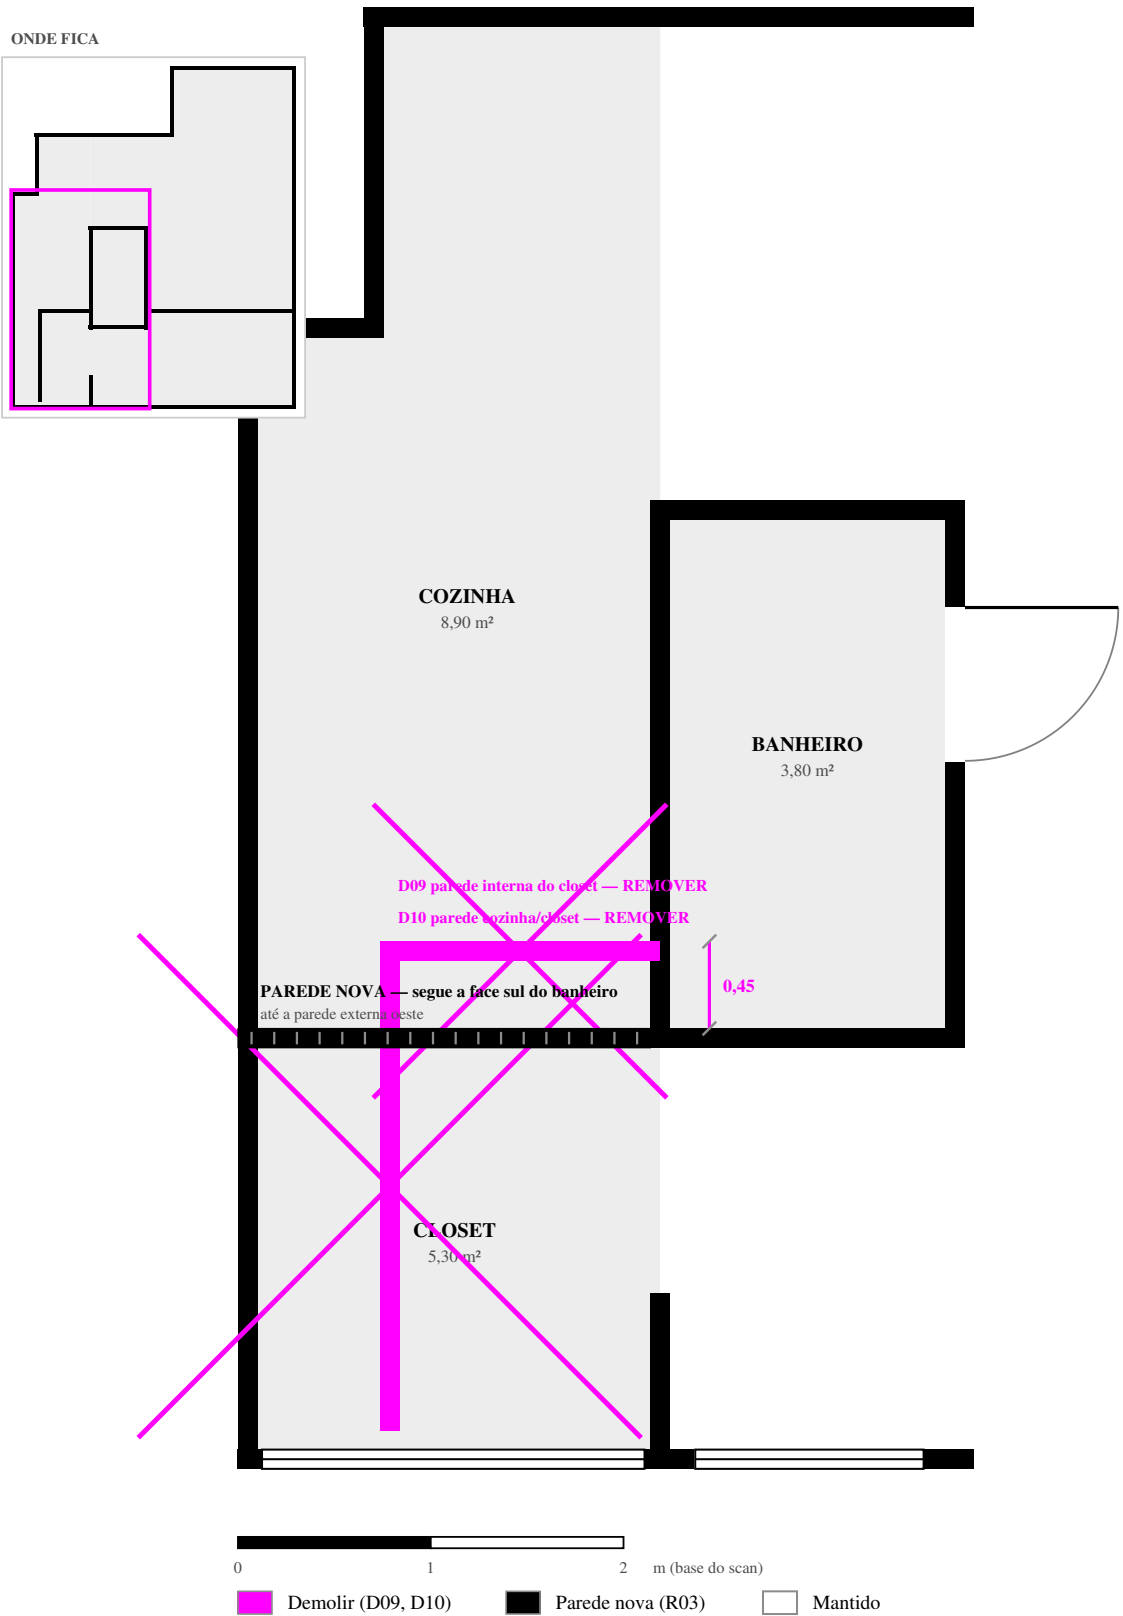

DEMOLIÇÃO

ID	O que sai	Quantidade
E03	Ensaio: confirmar natureza da parede (estrutural ou não) antes de qualquer corte	2 paredes
D09	Demolir parede interna do closet — sem função estrutural aparente	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — trecho existente	1,45 m
P07	Preparar as duas faces do corte para receber a parede nova	4,08 m²

CONSTRUÇÃO

ID	O que entra	Quantidade
R03	Construir parede nova, alinhada à parede sul do banheiro	2,17 m
R04	Estender a parede nova até a parede externa oeste	inlui em R03
P08	Revestir e pintar as duas faces da parede nova	4,34 m²
T12*	Reavaliar posição de T12 (tomada forno/lava-louças) — folga aumenta	1 ponto

A leitura desta folha.

A planta é o estado ATUAL, com a demolição marcada em magenta e a parede nova desenhada cheia, em preto, sobreposta na posição final. O deslocamento é exato: 0,45 m para o sul, medido face a face das duas paredes.

Por que esta parede e não outra.


A parede nova reaproveita o alinhamento que já existe — a face sul do banheiro — em vez de criar uma cota nova. Isso simplifica a execução: um só traço reto, do banheiro até a fachada, sem escora.

Planta proposta cotada

MainFloor completo, com a parede cozinha/closet na posição nova. Demais ambientes sem alteração.

cozinha 9,82 m² · closet 4,38 m²

mesma base do scan — REV. M

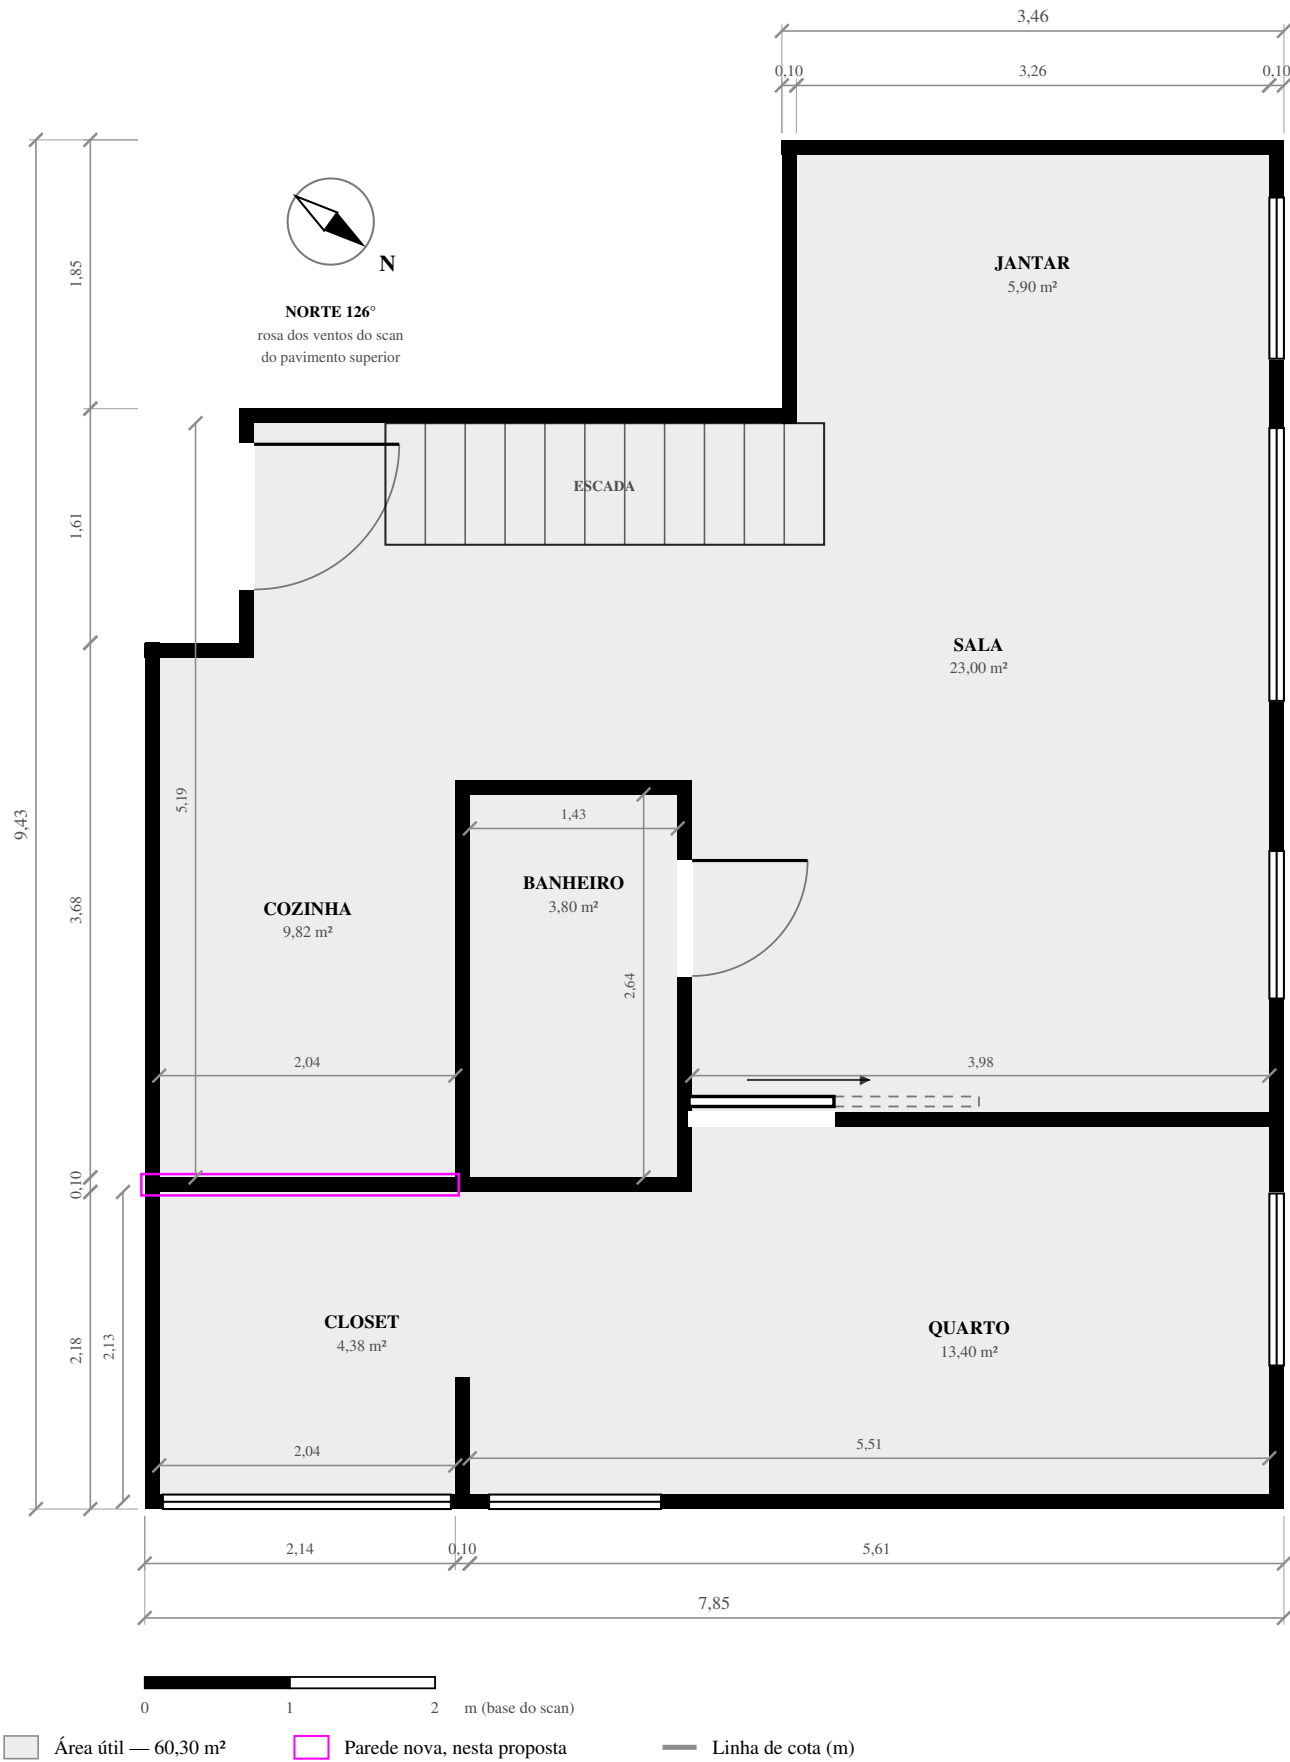

COMPARATIVO DE ÁREAS

Ambiente	Área atual	Área nesta proposta	Diferença
Cozinha	8,90 m²	9,82 m²	+0,92 m²
Closet	5,30 m²	4,38 m²	−0,92 m²
Soma das duas	14,20 m²	14,20 m²	sem variação
MainFloor — total	60,30 m²	60,30 m²	sem variação

Só duas salas mudam de área.

Sala, quarto, jantar e banheiro seguem exatamente como na REV. M — mesmas cotas, mesmas esquadrias, mesma numeração de portas e janelas.

A largura interna comum não muda.

Cozinha e closet continuam com 2,04 m de largura livre — a mesma parede externa oeste e a mesma parede do banheiro/quarto os limitam dos dois lados. Só a parede que os separa entre si é que se move.

J06, a janela do closet, não é afetada.

Fica na parede sul (fachada), que esta alteração não toca. A profundidade do closet diminui pelo lado norte — o vão da janela permanece o mesmo.


Cotas extraídas do modelo do scan e arredondadas ao centímetro, com a parede cozinha/closet na posição desta proposta. Planta de estudo. Substitui a Prancha 01 apenas nesta proposta alternativa — a REV. M segue como está.

Demolição e construção

Sequência de execução desta alteração — orientação de escopo, não laudo.

7 passos · 2 paradas

ver Prancha 04 para os riscos

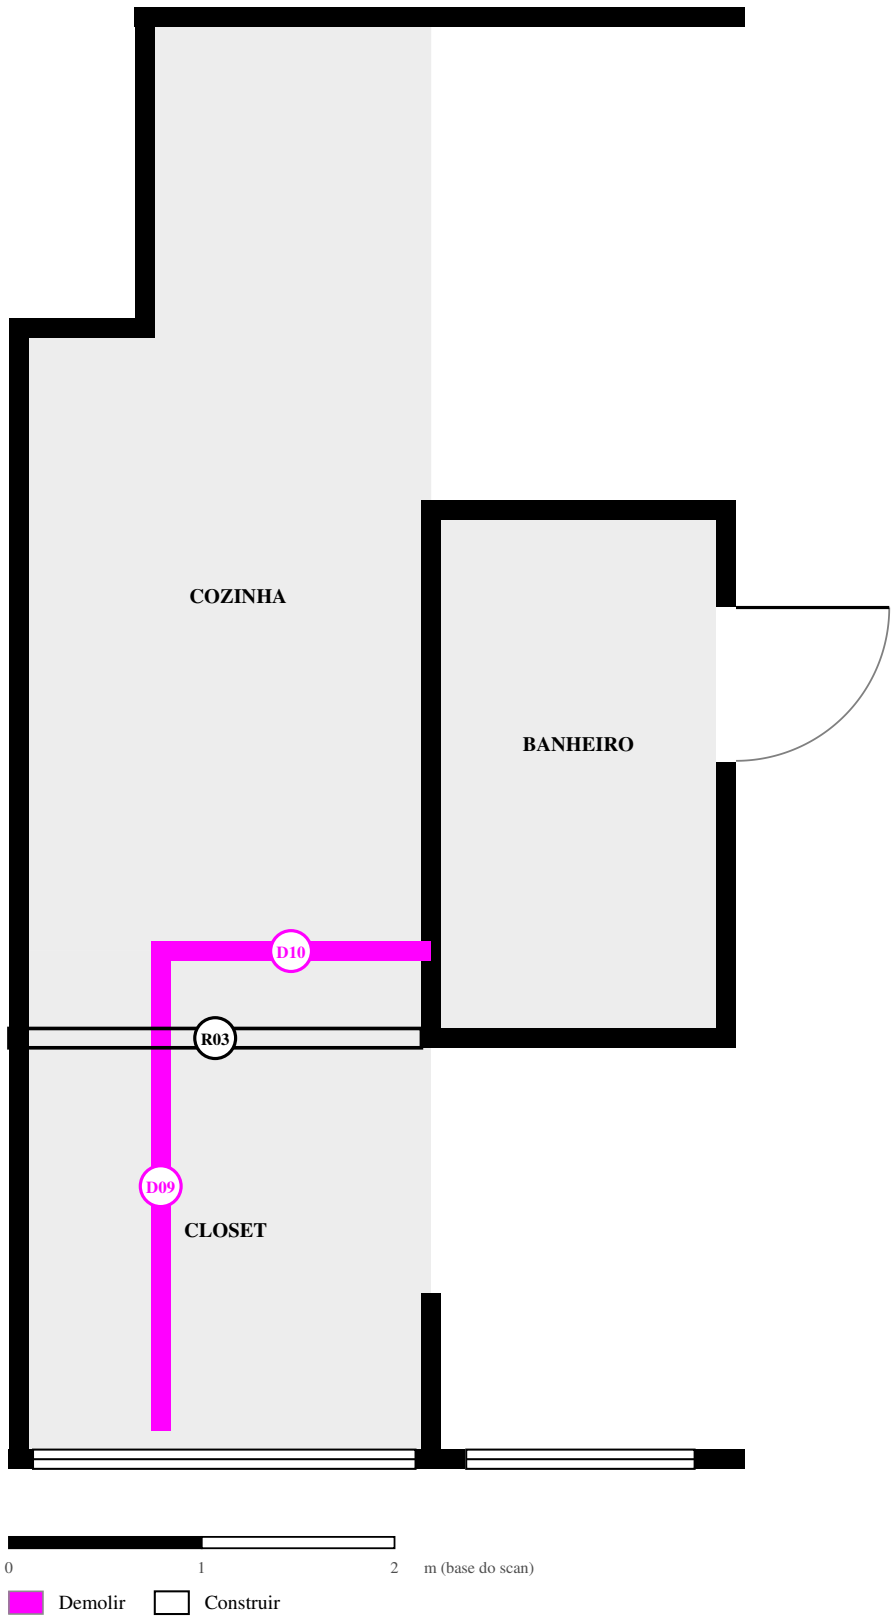

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Ensaio estrutural — E03.**
Confirmar com engenheiro que as duas paredes não têm função estrutural antes de qualquer demolição. Não há projeto estrutural do edifício disponível nesta emissão — orientação de escopo, não laudo.
- 2 Verificar interferências ocultas.**
A parede antiga corre junto à cozinha: confirmar se há hidráulica ou gás embutidos no trecho antes de abrir. Nenhum ponto elétrico documentado nesta faixa além de T12, que fica mais afastado com a mudança.
- 3 Demolição — D09 e D10.**
A parede interna do closet (D09) e o trecho cozinha/closet (D10).
- 4 PARADA — Marcação da nova parede antes de levantar.**
Conferir o alinhamento com a face sul do banheiro e o esquadro contra a parede externa oeste. Uma vez levantada, o erro custa desmontar.
- 5 Construção — R03.**
Mesma espessura das demais paredes internas, 0,10 m. Confirmar material (drywall ou alvenaria) pelo que for encontrado nas paredes vizinhas.
- 6 Revestimento e pintura — P08, nas duas faces.**
- 7 Entrega com nível e esquadro conferidos.**
Não iniciar armário novo do closet (M01) sem essa conferência.

Nada aqui é laudo estrutural.

Sem acesso ao projeto estrutural do edifício, a leitura desta alteração é visual, sobre o scan. O ensaio E03 é o que transforma essa leitura em decisão segura — não pular esse passo por parecer óbvio.

Quadro comparativo e riscos

O que muda, o que não muda, e o que precisa de confirmação antes da obra.

4 pontos catalogados · 1 impasse

orientação de escopo, não laudo

ÁREAS — ANTES E DEPOIS

Ambiente	Área atual	Área proposta	Diferença
Cozinha	8,90 m²	9,82 m²	+0,92 m²
Closet	5,30 m²	4,38 m²	−0,92 m²
Soma das duas	14,20 m²	14,20 m²	sem variação
MainFloor — total	60,30 m²	60,30 m²	sem variação

DIMENSÕES — FACE A FACE

Grandeza	Atual	Proposta	Leitura
Largura interna (comum)	2,04 m	2,04 m	sem variação
Profundidade da cozinha	3,18 m	3,63 m	+0,45 m
Profundidade do closet	2,59 m	2,13 m	−0,45 m
Posição da parede	—	0,45 m ao sul	alinhada ao banheiro

REGISTRO DE RISCO — ESTA ALTERAÇÃO

R1	Estrutura · Natureza da parede não confirmada em análise — pedir confirmação ao engenheiro antes de demolir Nenhum projeto estrutural do edifício foi disponibilizado nesta emissão. As duas paredes leem como alvenaria de vedação de 0,10 m, sem viga ou pilar aparente no scan — mas o scan não enxerga o que está dentro da parede. PORTÃO: ensaio E03 (percussão + inspeção visual do entorno) antes do D09/D10.	IMPASSE
R2	Marcenaria · Armário do closet perde profundidade M01 precisa de módulo novo, não o mesmo remontado A profundidade útil do closet cai de 2,58 para 2,13 m. Armários e cabideiros projetados para a medida antiga não cabem mais. M01 (desmontar, etiquetar e acondicionar) segue igual, mas a remontagem exige projeto de marcenaria novo, não a simples devolução dos módulos existentes.	ATENÇÃO
R3	Hidráulica/gás · Interferência oculta na parede antiga confirmar em campo antes da demolição Nenhum ponto hidráulico ou de gás está documentado nesta faixa da cozinha, mas o levantamento é por scan óptico — não enxerga tubulação embutida. Abrir com cautela e ter um hidráulico de prontidão no primeiro corte.	ACOMPANHAR
R4	Acesso · Entrada do closet não está no escopo desta alteração confirmar em campo O levantamento não registra porta no closet. O acesso hoje parece vir do quarto, num vão de cerca de 1,27 m na divisa closet/quarto, que esta alteração não toca. Confirmar em campo que esse vão realmente é a entrada antes de fechar a parede nova — se não for, o closet fica sem acesso.	ACOMPANHAR

O que não muda.

Sala, quarto, jantar, banheiro: mesmas cotas, mesmas esquadrias, mesma numeração de portas e janelas da REV. M. Nenhuma instalação elétrica documentada precisa ser remanejada — T12 só ganha mais folga.

O que muda.

Uma parede interna se desloca 0,45 m para o sul, alinhando-se com a parede do banheiro. Cozinha ganha 0,92 m² de profundidade; closet perde a mesma faixa. A soma das duas áreas — e a área total do MainFloor — não muda: é a mesma casca, com a parede interna numa posição nova.

Por que a área total do MainFloor não muda.

A parede que se move é 100% interna, entre dois ambientes que já pertenciam ao apartamento. Não há ganho nem perda de área contra a fachada, a caixa de escada ou qualquer parede externa.

O que esta proposta não resolve.

Não inclui projeto de marcenaria novo para o closet (a profundidade menor pede módulos redesenhados, não os mesmos remontados — ver R2). Não confirma a natureza estrutural das paredes (ver R1, o único impasse aberto desta proposta) nem o acesso do closet pelo quarto (ver R4) — os dois pedem confirmação em campo antes da obra.

Como isto se encaixa no caderno REV. M.

Esta é uma proposta PARALELA — um estudo de opção, não uma revisão. Se aprovada, as folhas equivalentes da REV. M (Prancha 01, Prancha 02, Prancha 09 e o pacote de fornecedores) precisam ser atualizadas para incorporar esta alteração — o que não foi feito nesta emissão.
