


Cortina e claraboia

Cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável e fechamento elétrico da claraboia (2027/28). Vidro não furável: tudo apoia no concreto em volta.

FO6 — CORTINA / CLARABOIA

extraído do caderno de estudo REV. O

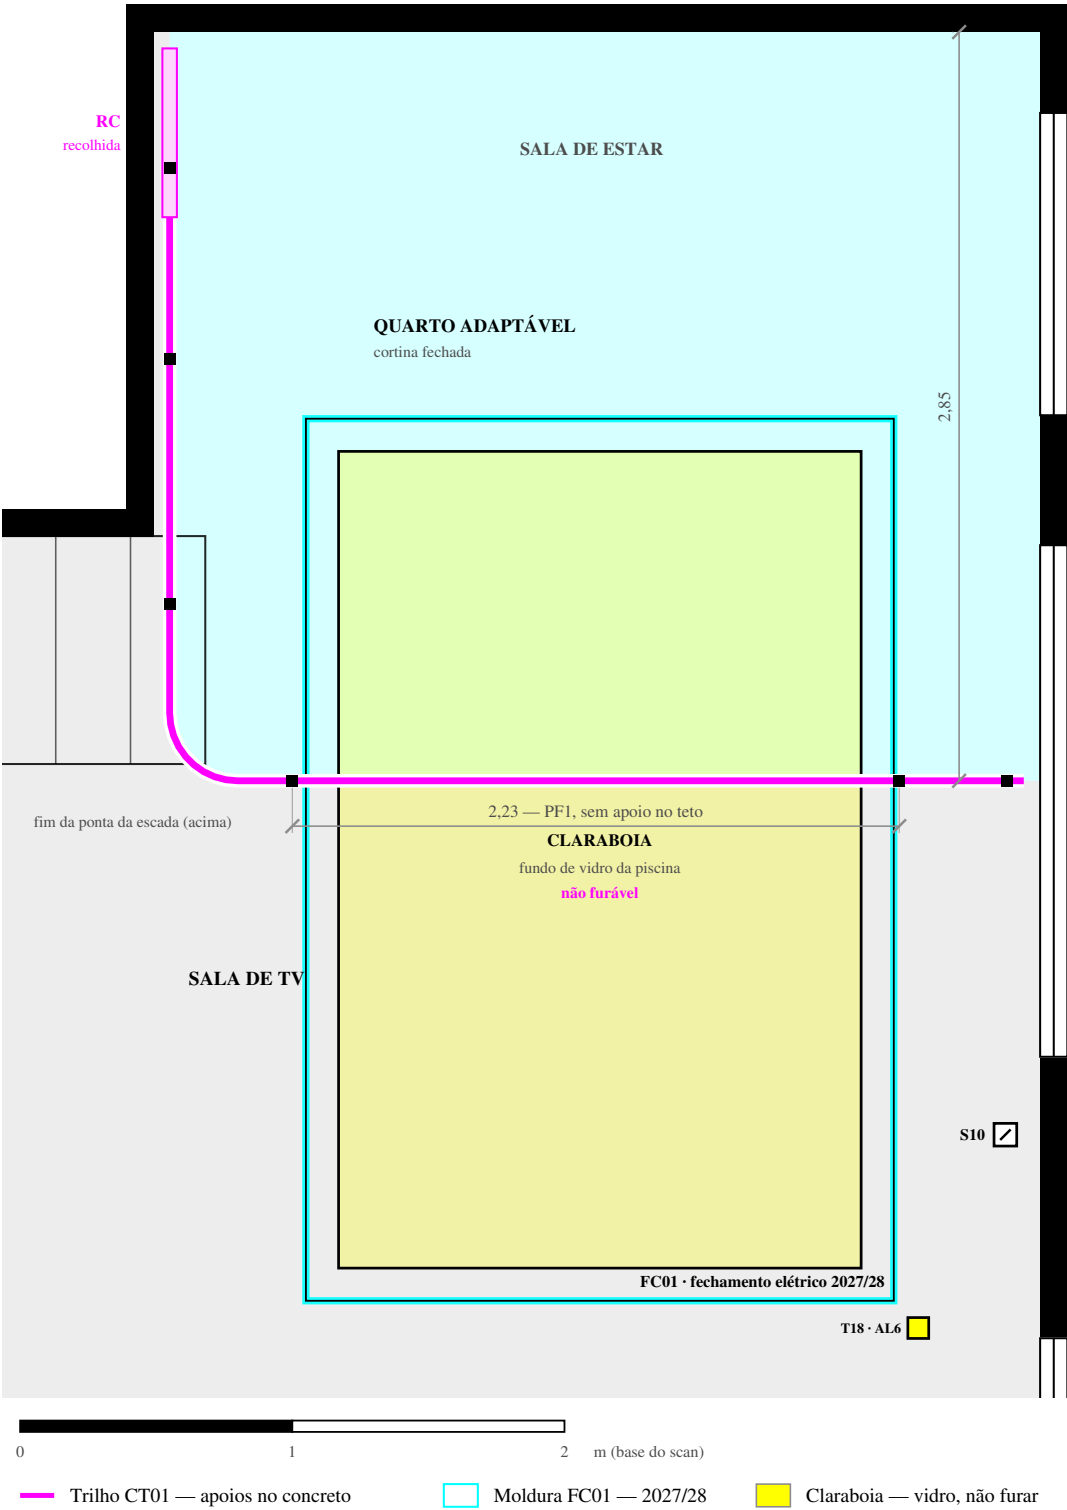

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
CT01	Trilho de cortina reto, com uma curva, do canto da sala de estar à fachada leste	5,72 m
PF1	Perfil autoportante sob a claraboia, com o trilho preso nele	2,23 m de vão
AP	Apoios no concreto — nunca no vidro nem na faixa da moldura	6 pontos
CT02	Cortina de tecido, pé-direito inteiro — franzido 2x, blackout a definir	~11,4 m de largura
RC	Pacote recolhido no canto noroeste da sala de estar	~0,62 m de trilho
MR1	Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura FC01	10,80 m de perímetro
FC01	2027/28 — fechamento elétrico: moldura, motor e painel	1 conjunto
FC02	2027/28 — ligação na espera T18 e programação do comando S10	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Estrutura em volta da claraboia.**
O vidro não é furável. Confirmar com engenheiro onde há viga de borda da piscina e onde o concreto admite apoio, antes de marcar qualquer furo.
- Medição em obra da linha da cortina.**
Vira no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte. Medir vidro, ponta da escada e a J02: se tiver montante central, o trilho termina nele.
- Espera da claraboia entregue pela elétrica — AL6 (FO3).**
Caixa T18 fora da moldura, eletroduto aparente e guia até o S10. Antes da pintura.
- Apoios e perfil autoportante — AP e PF1.
Somente fora da faixa de 0,12 m em volta do vidro. 2,23 m sem apoio no teto.
- Pintura da laje concluída antes do trilho.
- Montagem do trilho CT01.
Trilho reto junto à parede, passando sobre o degrau; curva só no fim da ponta.
- Cortina CT02.
Medir a altura final com o piso pronto; folga de ~1 cm do piso acabado.
- 2027/28 — fechamento elétrico FC01 e FC02.**
Moldura na faixa reservada, motor ligado na espera T18, comando S10. Não pode interferir no perfil PF1 que cruza por baixo da claraboia.
