


Elétrica

Pontos de força, comando e teto num único mapa. Posições de referência: conferir em obra antes de abrir caixa.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do caderno de estudo REV. L

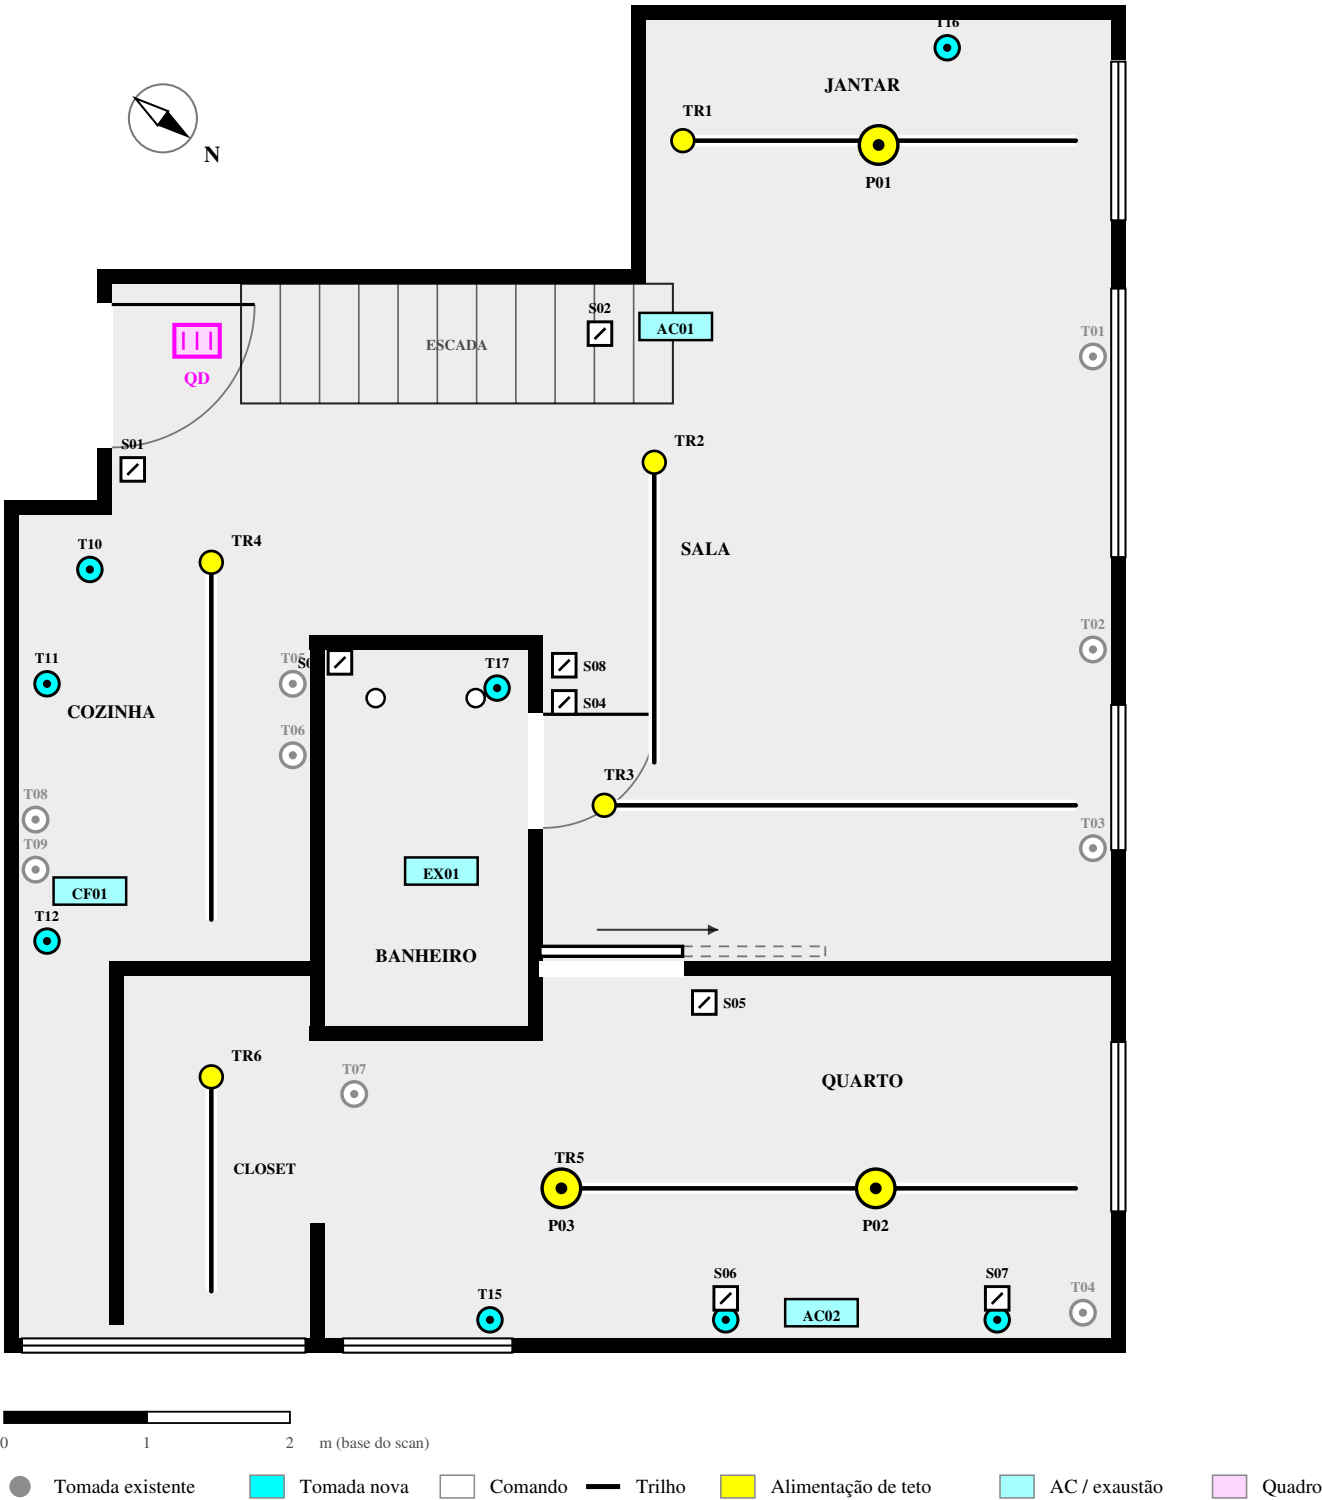

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	Ensaio e proteção	2	Demolição	3	Preparo de superfícies	4	Infraestrutura	5	Reconstruções	6	Piso	7	Pintura	8	Marcenaria e luminárias
---	-------------------	---	-----------	---	------------------------	---	----------------	---	---------------	---	------	---	---------	---	-------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T17	Tomadas novas	8 pontos
S01–S08	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	8 pontos
TR1–TR6	Pontos de alimentação de trilho eletrificado no teto	6 pontos
P01–P03	Pontos de luminária de destaque — jantar, cama e office	3 pontos
EM	Embutidos no forro do banheiro	2 pontos
AC	Alimentação de evaporadoras AC01 e AC02	2 pontos
EX	Alimentação de exaustor do banheiro e coifa da cozinha	2 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1

Levantamento e ensaio — E02.

Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- 2

Estudo de demanda e projeto executivo.

Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- 3

Marcação de pontos em obra.

Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- 4

Infraestrutura embutida — IN1.

Concluir antes de fechar a drywall R01.
- 5

Infraestrutura aparente no teto — IN2.

Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos e vigas.
- 6

Descidas, caixas e passagem de cabos.

Concluir antes do piso.
- 7

Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
- 8

Ensaio — EN.

Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- 9

Luminárias, trilhos e acabamentos.

Somente após a pintura concluída.
