


Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados

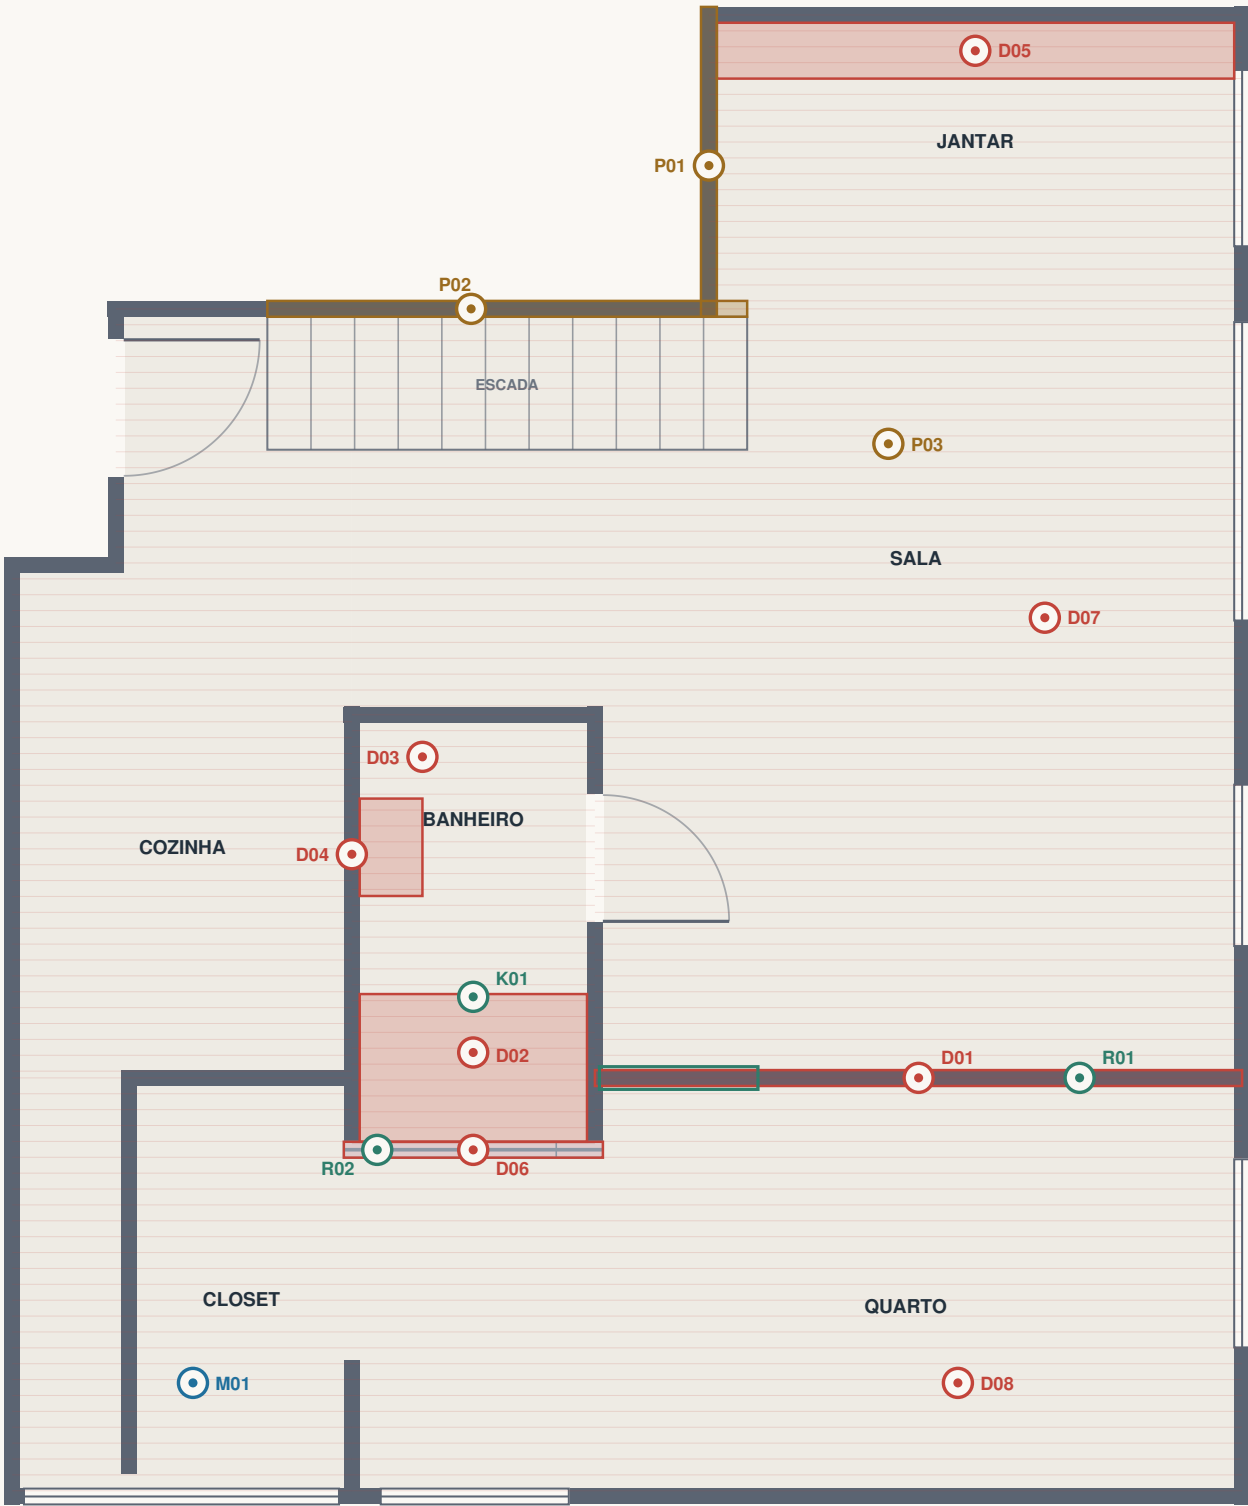

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro	3,80 m²
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta 1,00 × 2,30 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça

Esta planta mostra o estado existente.

O fundo do box aparece como o pano de vidro chão-teto que existe hoje (D06) e a drywall ainda sem porta. O estado proposto — parede fechando o box e drywall nova com porta — está desenhado nas Pranchas 03, 04 e 05.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e é reconstruída (R01), agora com uma porta de 1,00 × 2,30 m, na mesma altura da porta de entrada. O pano de vidro do fundo do box cai e vira parede (R02). Orçar demolição e reconstrução como serviços separados.

Banheiro: reforma integral.

Saem piso, revestimentos, fechamento do box e a parede atrás do espelho e da bancada. O vidro do box (K01) segue marcado para manter — confirmar se a reforma o preserva.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.

Hoje isso está mapeado no jantar (P01) e sob a escada (P02) — as duas paredes ficam, só perdem espelho e revestimento. P04 cobre o que aparecer depois: não tem alvo fixo em planta, mas entra no mesmo serviço. Definir o nível de acabamento antes de orçar: massa, lixa e demão de fundo não são a mesma linha que regularização de parede castigada.

A laje inteira é serviço, não sobra da demolição (P03).

Com o forro fora (D07), a laje aparece como está: restos de fixação, marca de fôrma, desnível, fissura, eventual ferro exposto. Prever restauro, descascamento, limpeza e preparo dos 60,30 m², e definir com a empreiteira o acabamento — concreto nu, selador, verniz ou pintura. É esse plano que recebe trilho, evaporadora e calha: quanto mais torto, mais aparece.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.



Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição. Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.

Piso monolítico

Sistema único em todo o MainFloor, com o banheiro à parte. Cores ilustrativas; nenhum produto, espessura ou acabamento especificado.

proposta de cumaru encerrada

piso contínuo — sem junta de material entre ambientes secos

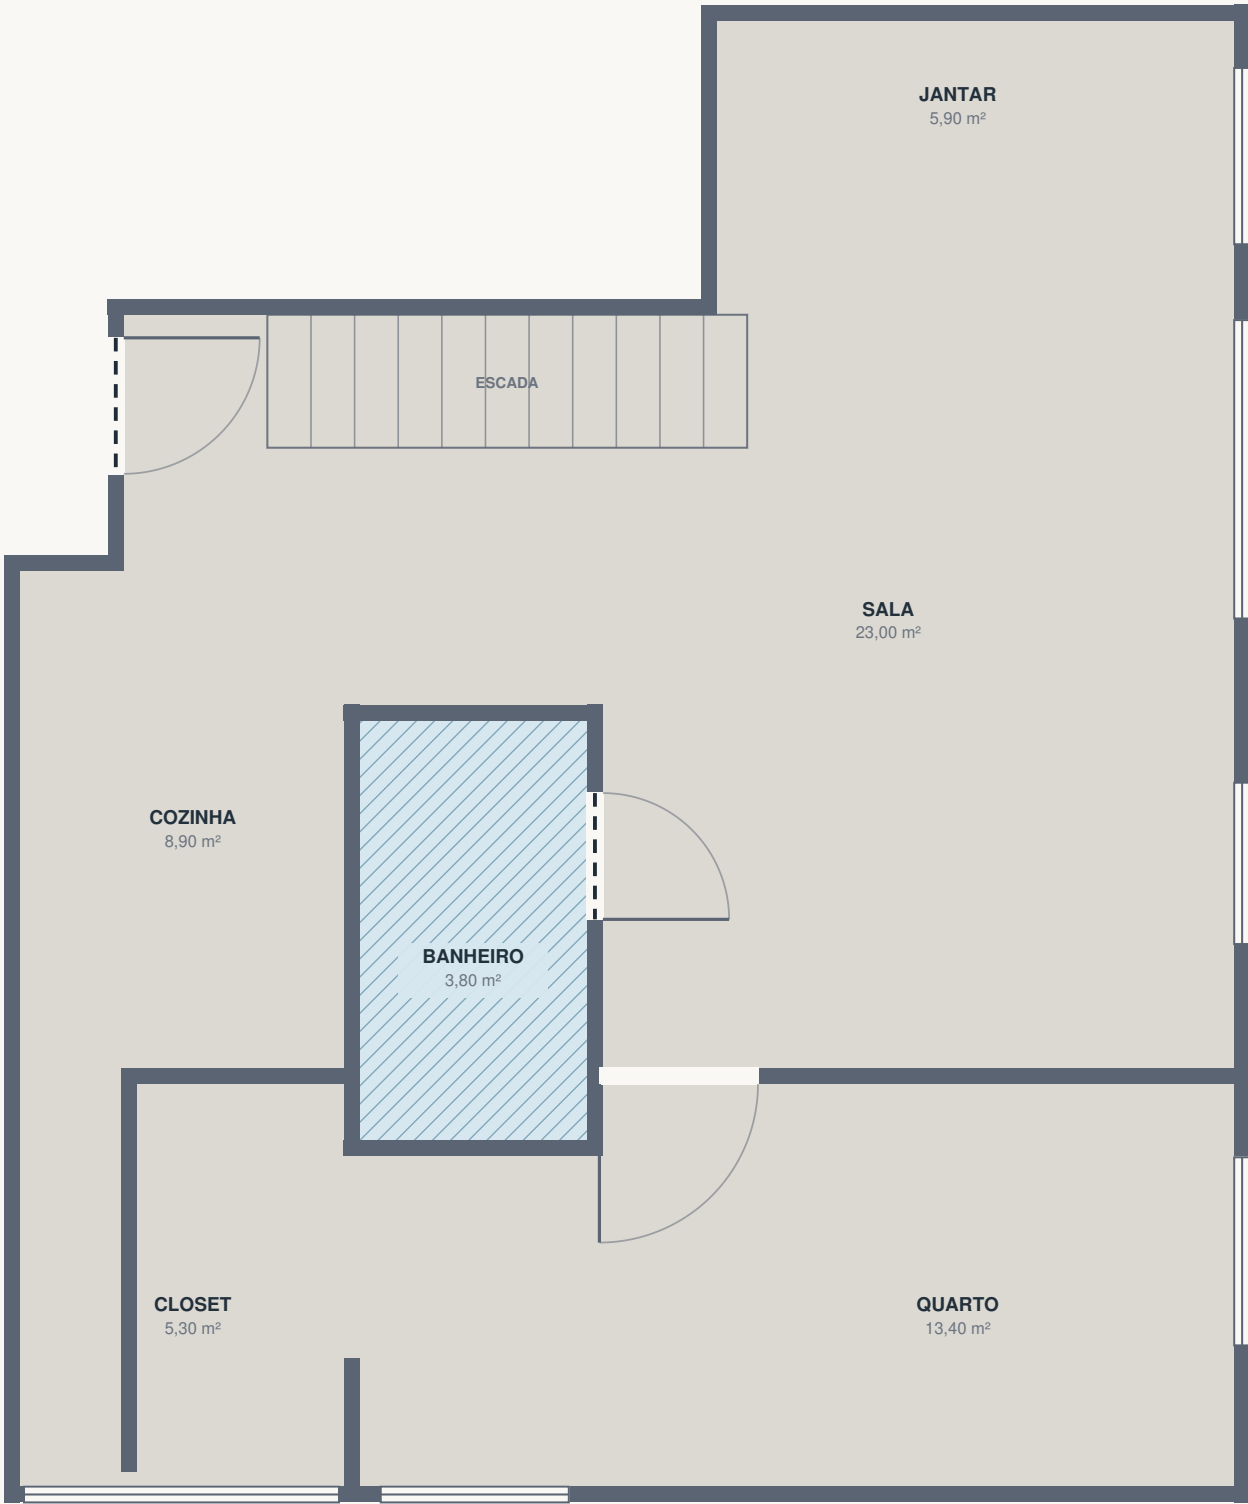

QUADRO DE ÁREAS

Ambiente	Sistema	Área
Sala	monolítico contínuo	23,00 m²
Quarto	monolítico contínuo	13,40 m²
Cozinha	monolítico contínuo	8,90 m²
Jantar	monolítico contínuo	5,90 m²
Closet	monolítico contínuo	5,30 m²
Monolítico — total	cinco ambientes, sem junta de material	56,50 m²
Banheiro	sistema à parte, área molhada	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

Um sistema só, sem junta de material entre os ambientes secos.
Com o cumaru fora, a ponta em curva da cozinha perde a função: ela existia apenas para resolver o encontro entre a madeira e o monolítico. O piso corre contínuo da entrada ao quarto, e as únicas transições que sobram são a soleira do banheiro e a da porta de entrada.

Juntas de movimentação são projeto, não improvisado de obra.
Monolítico contínuo em 56,50 m² trabalha: prever juntas conforme o sistema escolhido, nos vãos de porta e nos encontros com a estrutura. Posição e desenho entram no executivo, junto com o fornecedor — uma trinca num piso sem junta não tem remendo invisível.

A base manda no resultado.
Depois de retirar os pisos existentes (D08), conferir nível, aderência, umidade e fissuras do contrapiso em toda a extensão. Espessura, sistema e acabamento ainda não estão especificados: cor e textura do desenho são ilustrativas.

O banheiro fica fora do monolítico.
Sistema próprio, com impermeabilização, caimento para o ralo e acabamento antiderrapante. Com o piso demolido, conferir o rebaixo da laje; a impermeabilização precisa subir também na parede nova do fundo do box (R02).

Encontro com a parede.
Rodapé embutido, negativo ou pintura direta mudam o preparo das paredes e o corte do piso: definir antes de a empreiteira fechar o preparo para pintura.


Sequência importa mais que no piso em régua.
O monolítico entra depois das paredes prontas e antes da marcenaria: o closet (M01) só volta depois do piso curado. Prever tempo de cura e proteção da superfície até o fim da obra.

Sem reserva de corte.
Aplicação moldada in loco não tem perda de régua, mas isso não é margem zero: prever retrabalho de textura e acerto de bordas. Os degraus da escada estão fora da conta; o piso sob a escada permanece.

Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Reservas de posição, não quantidade final de luminárias nem de equipamentos.

sem forro — tudo aplicado na laje
piscina do pavimento superior sobre a sala

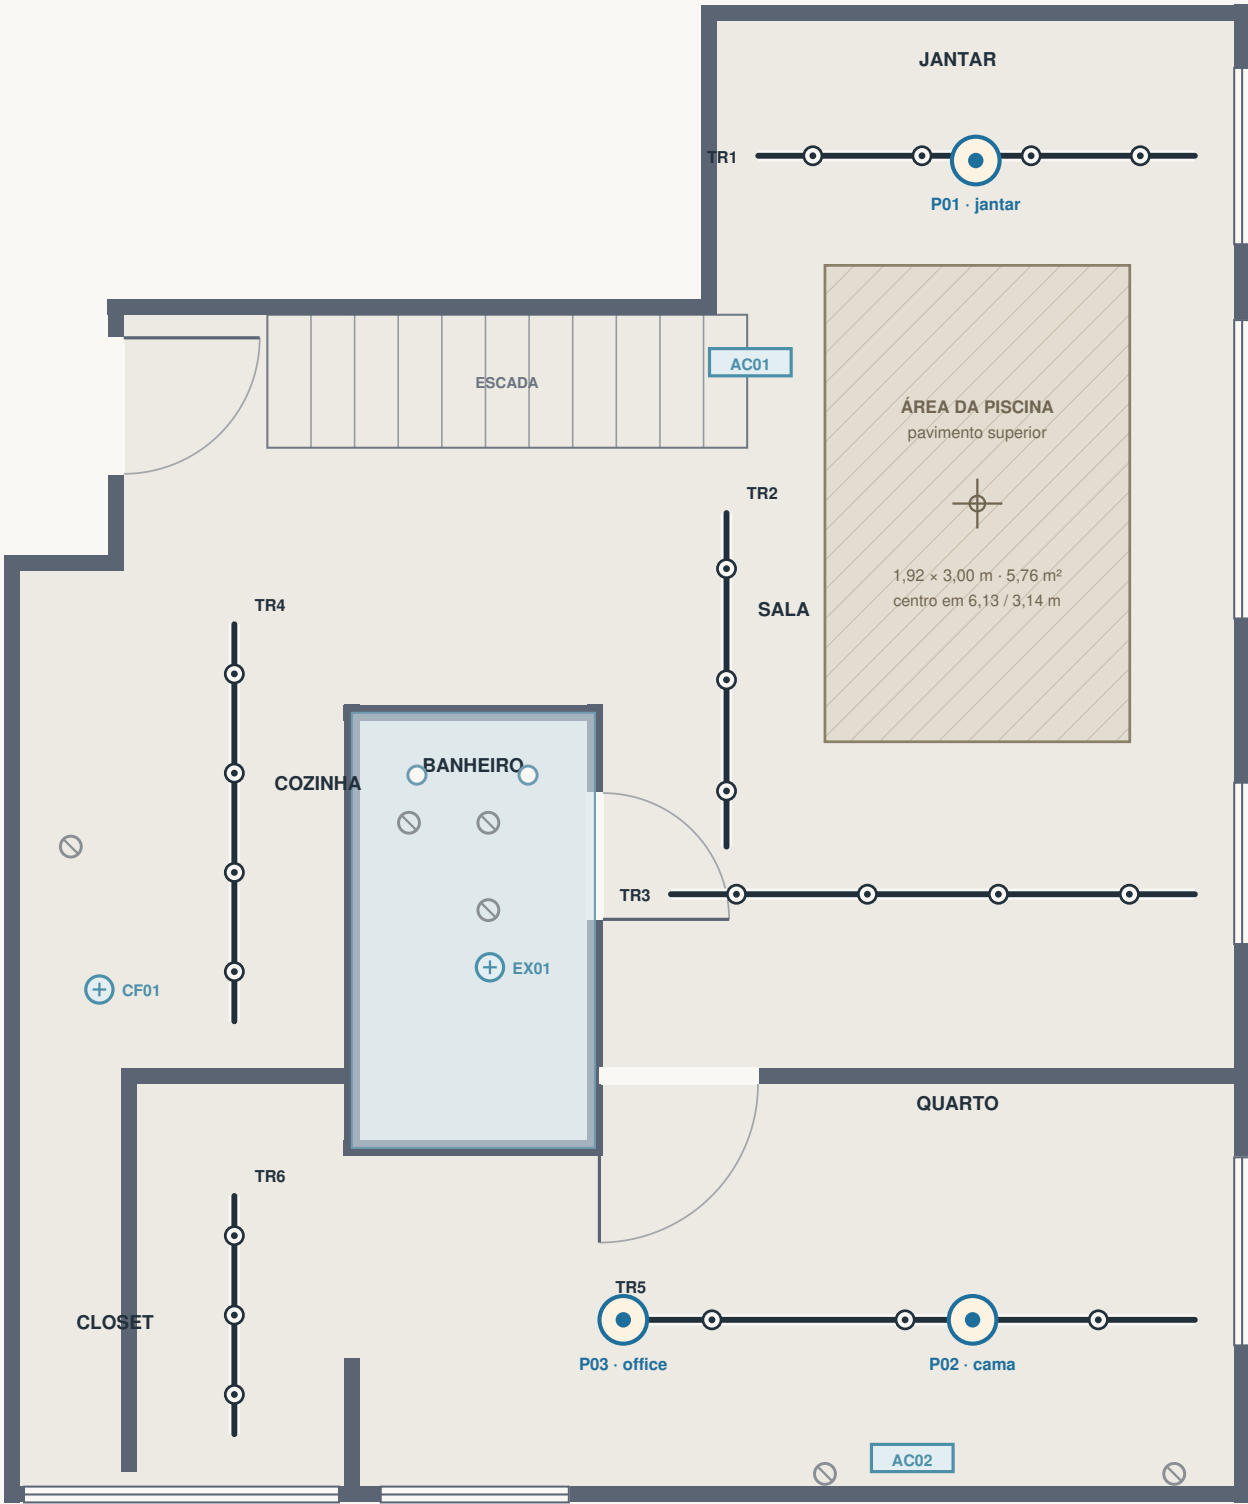

0

1

2

m (base do scan)

Trilho eletrificado + spots de sobrepor

Luminária de destaque (corpo maior)

Ponto existente — confirmar

Embutido no forro do banheiro

Ar-condicionado / exaustão

ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

Ambiente	Alvo geral	Fluxo inicial	Temperatura de cor
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	37,80 m²	22.680 BTU/h	30.240 BTU/h
Quarto + closet	18,70 m²	11.220 BTU/h	14.960 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado.

Toda a iluminação passa a ser aplicada — trilhos eletrificados, spots de sobrepor e pendentes. Nada de embutido fora do banheiro, único ambiente que mantém forro para abrigar a exaustão e a luminária do box.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— jantar, cama e office. Corpo e diâmetro maiores que os spots dos trilhos, em pendente ou plafon de sobrepor. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T.

Ar-condicionado sem forro: não há plenum para dutar.

Evaporadoras hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação elétrica correm aparentes, em calha, com caimento contínuo. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade entre unidades.

A piscina do pavimento superior fica sobre a sala — 1,92 × 3,00 m, centrada em

6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Essa laje não recebe furação: nem luminária, nem trilho, nem evaporadora ou tubulação podem invadi-la, e a região exige impermeabilização e sobrecarga verificadas em estrutura. Nenhum trilho a invade: TR2 corre a oeste e TR3 passa 0,96 m ao sul.

A reserva AC01 caía dentro da projeção da piscina.

Foi deslocada para oeste, mantendo a insuflação para sala e jantar. A posição definitiva depende de confirmar apoio acima do limite sala/jantar e o modelo da condensadora existente: não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro 99,56 m³/h; coifa 279,82 m³/h — este só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura no fogão. Coifa e exaustão pedem rotas próprias: não interligar.


Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada. Carga térmica não é carga final: claraboia, insolação, escada aberta e ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado de aparelhos.

Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização, sem circuitos executivos. Posições existentes conforme marcação do cliente sobre o estudo anterior.

quadro junto à porta de entrada

trajetos aparentes: não há forro

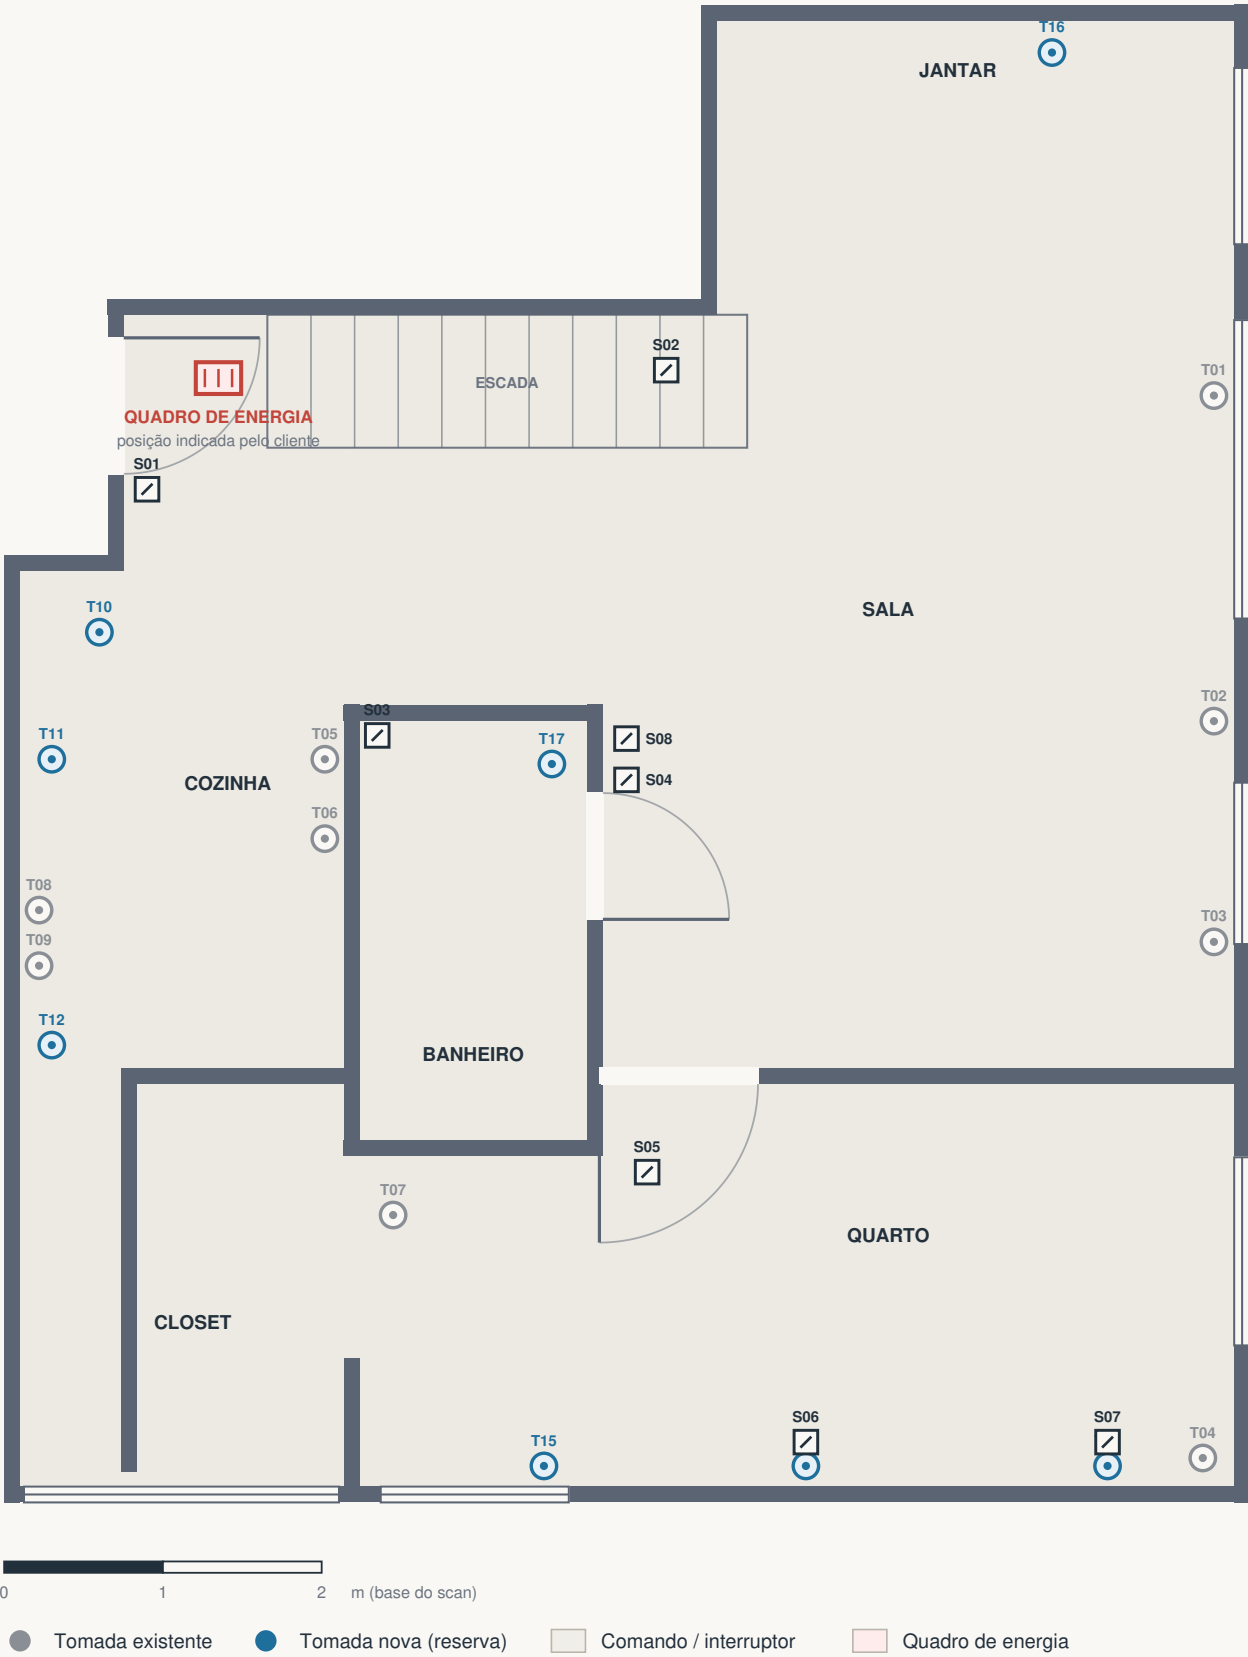

RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	8 reservas — T10 a T17	não é número normativo nem total final
Comandos	8 posições — S01 a S08, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada, no início da extensão da cozinha. Confirmar espaço livre, altura e a circulação da porta antes de fixar. Todo o resto do traçado sai dele.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes.

A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 04; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento:

tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m.

As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta.

Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T17 são reservas novas do estudo.

Comandos revisados nesta folha.

O comando que caía dentro do box saiu; o que ficava junto à porta do quarto passou a S05, agora ao lado da porta nova da drywall. S06 e S07 são os dois novos comandos da cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 04.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito:

S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 jantar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta nova (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala (TR2 e TR3).

S08 é o novo comando da luz da sala.

Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4x2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Circuitos, seções, disjuntores, aterramento, DR, demanda e proteção contra surtos

ficam a cargo do projeto elétrico após o levantamento. Não usar estas reservas como projeto para o eletricista executar.
