


Iluminação

Trilho eletrificado e luminárias sobre a laje aparente. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3): aqui é montagem, não fiação.

FO4 — ILUMINAÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. M

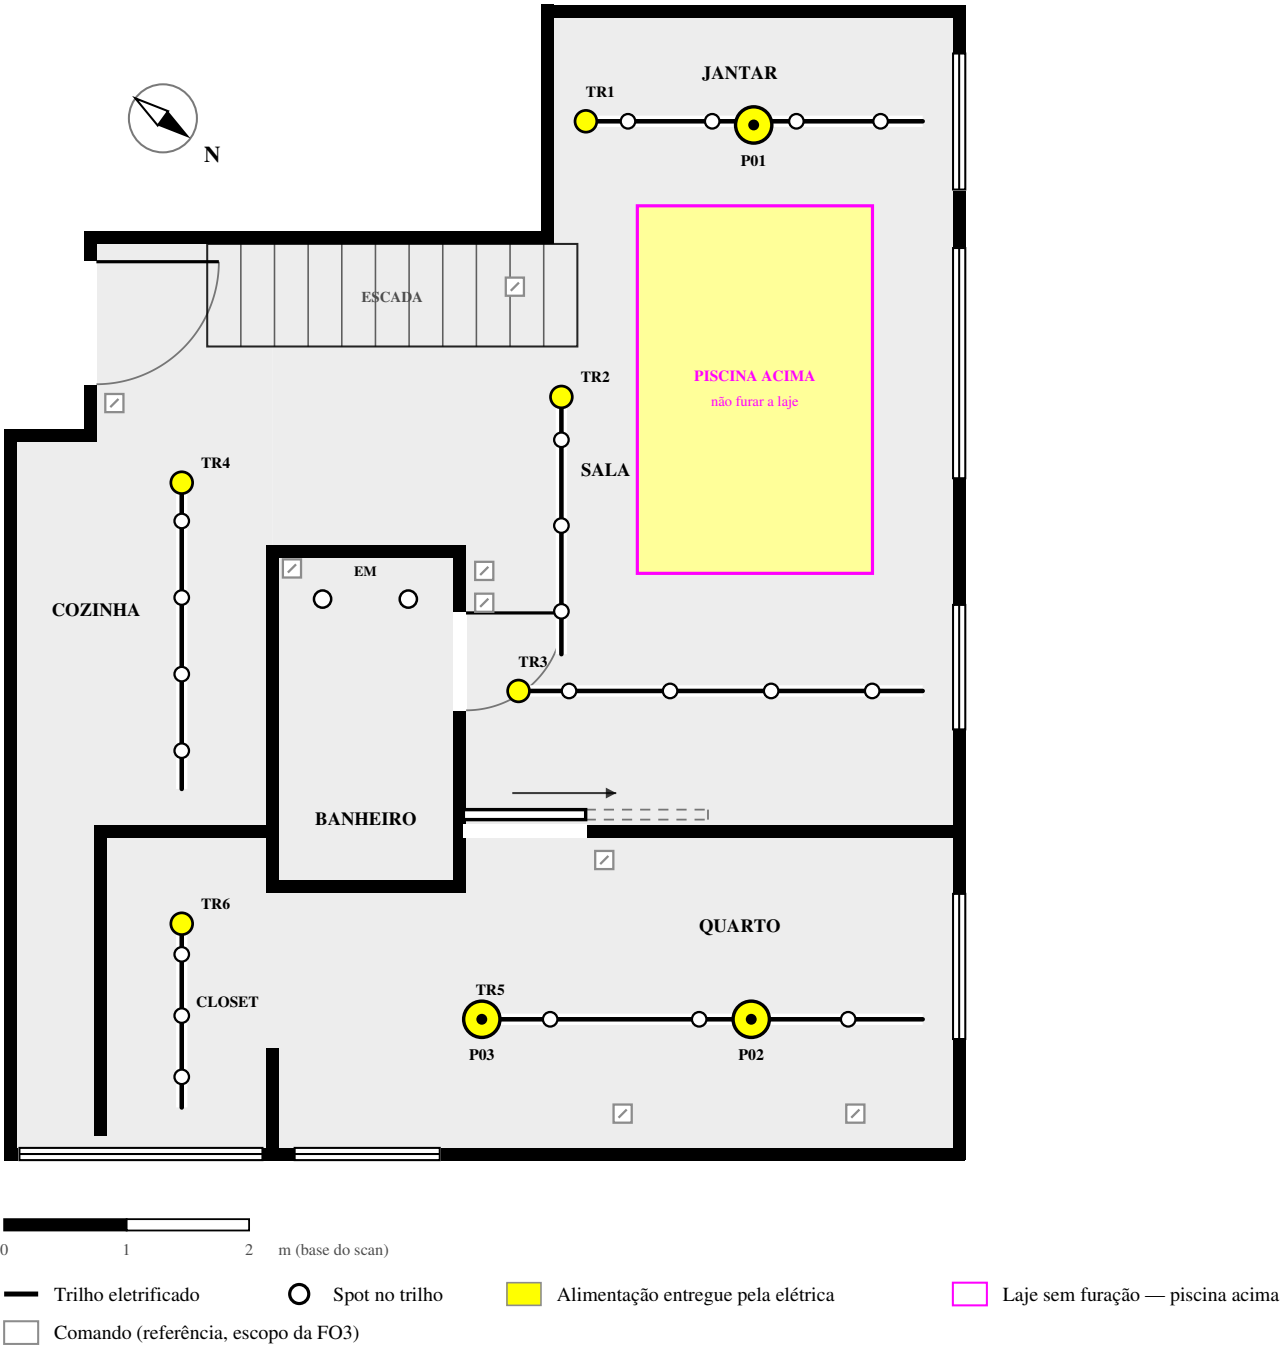

ALVO POR AMBIENTE — PARA SELEÇÃO DE SPOT

Ambiente	Nível	Fluxo alvo	Temperatura
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
TR1	Trilho eletrificado — jantar, 4,75 a 7,50 m	2,75 m · 4 spots
TR2	Trilho eletrificado — sala, eixo 4,55 m	2,10 m · 3 spots
TR3	Trilho eletrificado — sala, 4,20 a 7,50 m	3,30 m · 4 spots
TR4	Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m	2,50 m · 4 spots
TR5	Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m	3,65 m · 3 spots
TR6	Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m	1,50 m · 3 spots
—	Total de trilho e de spots nos seis trechos	15,80 m · 21 spots
P01	Luminária de destaque — jantar, pendente ou plafon	1 peça
P02	Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5	1 peça
P03	Luminária de destaque — office, no eixo do TR5	1 peça
EM	Embutido no forro do banheiro — único ambiente com forro	2 peças
CT	Conector, emenda e terminação de trilho	a definir
FX	Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso	a medir

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1
- Recebimento das alimentações da elétrica — AL1, AL2 e AL3.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado (FO3, passo 7). Conferir posição de cada uma antes de comprar trilho.
- 2
- Conferência da laje preparada — P03.**
A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista. Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
- 3
- Marcação dos eixos no teto.**
Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
- 4
- Zona sem furação — piscina do pavimento superior.**
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Nenhuma fixação, furo ou passagem dentro dele.
- 5
- Pintura concluída antes de instalar.**
Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
- 6
- Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.**
- 7
- Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.**
P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
- 8
- Embutidos do banheiro — EM.**
- 9
- Ajuste de foco e entrega.**
Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	Ensaios e proteção	2	Demolição	3	Preparo de superfícies	4	Infraestrutura	5	Reconstruções	6	Piso	7	Pintura	8	Marcenaria e luminárias
---	--------------------	---	-----------	---	------------------------	---	----------------	---	---------------	---	------	---	---------	---	-------------------------
