Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados

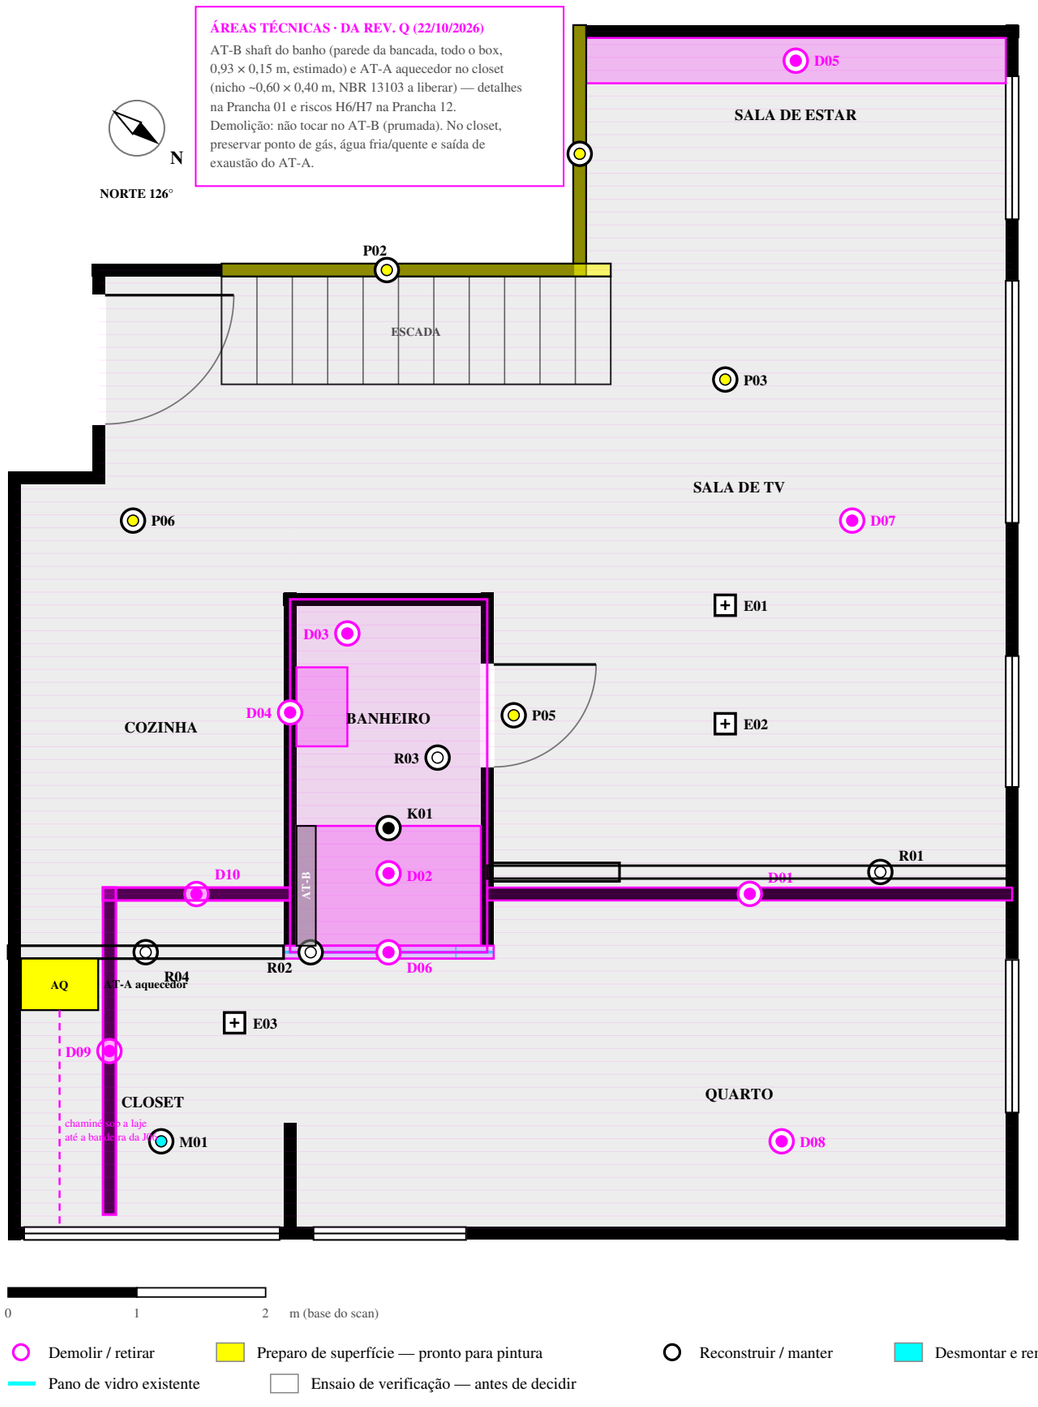

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala de TV e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo	3,80 m² — descer até a laje
D04	Banheiro: revestimento de todas as paredes, bancada, cuba, louças e metais	16,70 m² de parede + 1 conj.
D09	Parede interna do closet — só depois do E03	2,54 m
D10	Parede cozinha/closet, trecho existente — só depois do E03	1,45 m
D05	Canto alemão da sala de estar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%, inclusive o do banheiro	60,30 m² — fora do banheiro, laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
P05	Nivelar o banheiro com o piso da casa	cota única — soleira sem degrau
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso	60,30 m² — plano e nivelado
R01	Nova drywall sala de TV/quarto, 0,17 m ao norte, com porta de correr	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
R03	Forro novo do banheiro, resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m² — embutidos e exaustor
R04	Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste	2,17 m · 2 faces
M01	Desmontar o closet; volta com módulos novos (0,45 m mais raso)	1 conjunto — inventário
K01	Vidro do box — manter (A) ou trocar (B): ver FO7	1 peça
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	antes de decidir a troca
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	megômetro — antes de decidir
E03	Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro	antes de D09 e D10

Esta planta mostra o estado existente.
Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para o quarto — está nas Pranchas 03 a 08.

Demolir para refazer, não só demolir.
A drywall sala de TV/quarto cai e volta 0,17 m ao norte (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

Banheiro: reforma completa — paredes, piso e teto (REV. O).
Sai tudo até o osso: revestimento das quatro paredes, bancada, louças e metais (D04), box (D02), piso e base até a laje (D03) e o forro (D07), que volta novo (R03) a 2,40 m com embutidos e exaustor. O piso renasce na cota da casa (P05): soleira sem degrau, contenção no ralo linear.

Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).
Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.
Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

Alternativo A: a parede cozinha/closet desce 0,45 m (D09, D10 e R04).
Sem projeto estrutural do edifício: o ensaio E03, com engenheiro, vem antes de demolir. Abrir a D10 com cautela (hidráulica ou gás embutido). O closet fica 0,45 m mais raso: M01 volta com módulos novos, não os mesmos remontados.

Ensaios antes de decidir (E01, E02 e E03).
Estanqueidade na hidráulica, isolamento na elétrica e estrutura das paredes cozinha/closet. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição.
Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.
