Projeto executivo de paginação

Revestimento de parede do banheiro com a linha Bouché (Portobello). Análise dos cinco arquivos recebidos, nova paginação com cortes iguais nas duas pontas de cada parede, nas duas opções de peça, mais quantitativo, escopo de serviços e roteiro de execução.

RESULTADO EM QUATRO NÚMEROS

17,94 m²
de parede líquida
quatro paredes até o forro, vão da porta descontado

49%
é o menor corte da malha
3,65 cm na opção B; na opção A o menor é 8,15 cm (53%)

9,25 cm
em cima e embaixo
mesma fiada nas quatro paredes: as juntas fecham nos cantos

25 · 67
caixas A · B
com a embalagem real (36 e 26 peças), reserva de 10%

O QUE ESTA EMISSÃO ENTREGA

- Leitura crítica dos cinco PDFs: o que está certo, o que está errado e o que oferece risco, com a caixa de 1,44 m² que não existe no produto e as fiadas que não fecham nos cantos.
- Paginação refeita com o eixo no centro de cada parede e cortes iguais nas duas pontas, nas opções A (15,5 × 15,5) e B (7,5 × 15,5).
- Planificação e elevações cotadas das quatro paredes, com numeração de colunas e fiadas, vão da porta P02 e vidro K01 no lugar.
- Régua de modulação (marcas em cm) para levar a malha do papel para a parede.
- Quantitativo em peças e em caixas reais, lista de corte por dimensão e consumíveis estimados.
- Escopo de serviços (RV00 a RV11), sequência de execução, pontos de parada, critérios de aceite e recálculo com a medida de obra.

PREMISSAS DESTA EMISSÃO

Superfície	Banheiro 1,43 × 2,64 m · altura 2,40 m (forro novo R03) · 4 paredes · 17,94 m² líquidos (vão P02 de 1,60 m² descontado)
Peça	Opção A 15,5 × 15,5 cm e opção B 7,5 × 15,5 cm (formato real). Os arquivos chamavam de 7×15 e 15×15.
Dados da caixa	A: 36 peças = 0,87 m². B: 26 peças = 0,30 m². Fonte: ficha Portobello da linha Gouache de mesmo formato (borda Bold, 9 mm, variação V4). Ficha do Bouché não localizada.
Junta	3,0 mm entre fiadas em toda a obra. Entre colunas: 3,0 mm, exceto na opção B das paredes de 2,64 m (2,7 mm) para fechar a meia peça.
Orientação	Faces como na folha do caderno (norte da folha no topo da planta). Elevações vistas de dentro do banheiro.
Reserva	10% sobre as peças físicas (quebra e reposição), arredondada para caixa fechada.

ÍNDICE DO CADERNO

01 Capa, índice e premissas
02 Análise dos cinco arquivos recebidos: erros e riscos
03 Critério de paginação e quadro antes × depois
04 Planta do banheiro e nomenclatura das paredes
05 Opção A · 15,5 × 15,5 · planificação das quatro paredes
06 Opção A · elevações Norte e Sul
07 Opção A · elevações Leste e Oeste
08 Opção B · 7,5 × 15,5 · planificação das quatro paredes
09 Opção B · elevações Norte e Sul
10 Opção B · elevações Leste e Oeste
11 Parede Leste 358 × 260 cm (a confirmar)
12 Quantitativo, lista de corte e consumíveis
13 Escopo de serviços
14 Execução: sequência, pontos de parada e aceite
15 Recálculo com a medida real e detalhes de encontro
16 Pendências e decisões

ESTADO DA EMISSÃO

Para conferência em obra. As cotas vêm dos arquivos recebidos e do scan de 02.09.2026 e ainda não foram medidas com o emboço pronto. O produto Bouché não foi localizado no site da Portobello e a parede Leste de 358 × 260 cm não casa com o banheiro. Feche as pendências da Prancha 16 antes de cortar e comprar.

Análise dos cinco arquivos recebidos

Os PDFs são impressões do Paginador de Revestimentos. Reproduzi cada um com os mesmos dados de entrada e os números bateram. Abaixo, o que está certo, o que está errado e o que oferece risco.

Arquivo	Entrada	Partida X · Y (cm)	Pontas esquerda · direita	Fiadas topo · piso	Compra no PDF → real	O que está errado
NORTE E SUL · 7×15	143 × 240 cm · peça 7,5 × 15,5 · junta 3 mm · a prumo	5,3 · 8,1	5,0 · 5,1 (67%) simétrica: boa	7,8 · 10,7 diferença de 2,9 cm	PDF sem resultado → 304 pç, 13 caixas	O PDF perdeu a 3ª página: faltam área, caixas, cortes de borda e régua. Fiadas desiguais: a de piso é 2,9 cm maior que a de topo.
NORTE E SUL · 15×15	143 × 240 cm · peça 15,5 × 15,5	8,1 · 6,6	7,8 · 8,5 (50–55%) quase simétrica	6,3 (41%) · 12,2 (79%) diferença de 5,9 cm	176 pç · 3 caixas → 5 caixas	Fiada de topo no limite e a de piso quase inteira. As fiadas começam a 6,6 cm do teto, enquanto Leste e Oeste começam a 9,5: as juntas horizontais saltam 2,9 cm em cada canto.
LESTE E OESTE · 7×15	264 × 240 cm · peça 7,5 × 15,5	0 · 9,5	7,5 (inteira) · 6,6 assimétrica	9,2 · 9,3 simétricas: boas	599 pç · 5 caixas → 24 caixas	Ponta esquerda inteira e a direita cortada: o corte pesa só de um lado. A caixa de 1,44 m² subestima a compra em 4,8 vezes.
LESTE E OESTE · 15×15	264 × 240 cm · peça 15,5 × 15,5	5,6 · 9,5	5,3 (34%) · 5,6 (36%) estreitas	9,2 · 9,3 simétricas: boas	317 pç · 6 caixas → 9 caixas	Pontas no limite de 1/3: o aviso do Paginador não disparou, mas são cortes frágeis. Com 15 inteiras o corte sobe para 13,35 cm nas duas pontas.
LESTE · 15×15	358 × 260 cm · peça 15,5 × 15,5	0 · 11,6	15,5 (inteira) · 10,4 assimétrica	11,3 · 11,4 simétricas: boas	431 pç · 8 caixas → 12 caixas	A parede Leste aparece com 358 × 260 aqui e com 264 × 240 em "Leste e Oeste". Ou são duas paredes, ou uma está errada. A altura de 2,60 m também não bate com o forro a 2,40 m.

PROBLEMAS QUE VALEM PARA OS CINCO ARQUIVOS

Caixa de 1,44 m².
É o valor de exemplo do Paginador, não o do produto. A ficha Portobello de mesmo formato traz 36 peças = 0,87 m² (15,5 × 15,5) e 26 peças = 0,30 m² (7,5 × 15,5). Todas as caixas dos PDFs estão baixas.

Junta de 3 mm sem validação.
A ficha da linha de mesmo formato indica 1,5 mm para parede interna molhada, e o anúncio de outra peça Portobello de borda Bold fala em mais de 2 mm. 3 mm pode ser a escolha certa, mas é decisão a provar em mock-up.

Produto e formato.
Não achei "Bouché" no site da Portobello. As medidas 7,5 × 15,5 e 15,5 × 15,5, com borda Bold e 9 mm, batem com a linha Gouache. Os nomes dos arquivos (7×15, 15×15) são nominais: o pedido usa o formato real.

Partida sem regra.
Cada arquivo usa um deslocamento digitado à mão, sem eixo comum. Por isso as paredes dão resultados incoerentes entre si.

TAMBÉM FALTOU

Vãos e elementos.
Porta P02 (Leste, 0,80 × 2,00), vidro K01, bancada, ralo e pontos elétricos e hidráulicos não aparecem. Só o vão da porta tira 65 peças da opção A e cria cortes de batente.

Cota vertical.
Os 2,40 m dependem do piso acabado (P05, cota única) e do forro novo (R03), ainda abertos. A fiada de piso e a de topo mudam com eles.

Aproveitamento da peça.
Na opção B, nas paredes de 2,64 m, as duas pontas saem de uma única peça cortada ao meio: 16 peças a menos por parede.

Impressão.
Cada PDF saiu em 2 ou 3 folhas A4, com o desenho cortado no meio da página e sem nome da parede, escala, data ou revisão. Dá para errar de parede na obra.

Impermeabilização.
O item C1 prevê rodapé virado no piso, mas não define a altura da subida nas paredes do box, que são revestidas até 2,40 m.

Critério de paginação e quadro antes × depois

A regra que você pediu, escrita para valer em todas as paredes: eixo no centro, cortes iguais nas duas pontas e, quando a junta deixa, meia peça de cada lado (7,5 cm vira 3,65 + 3,65).

AS REGRAS

R1 · Eixo no centro.
Cada parede nasce do seu eixo vertical. As duas pontas recebem o mesmo corte. Número ímpar de peças inteiras põe uma peça no eixo; par põe uma junta.

R2 · Meia peça sempre que a junta deixar.
Corte = (peça − 2 mm de disco) ÷ 2. A junta pode variar de 2,5 a 3,5 mm para chegar lá. Peça de 7,5 cm: 3,65 + 3,65, e as duas pontas saem da mesma peça.

R3 · Se não der meia peça.
Junta de 3,0 mm e o corte mais próximo da metade, nunca abaixo de 40% da peça. Abaixo de 1/3 é crítico e não entra.

R4 · Fiadas iguais nas quatro paredes.
Mesma regra na vertical, com junta fixa de 3,0 mm: corte igual embaixo e em cima (9,25 cm). Como as quatro paredes têm 2,40 m, as juntas horizontais fecham em volta do banheiro.

R5 · Cotas de referência.
Piso acabado (cota única P05) e forro novo (R03). Fiadas de piso e de topo são cortadas 3 a 5 mm menores para a junta de movimentação.

R6 · Vãos.
A malha é paginada na parede inteira e o vão é recortado depois, sem deslocar nada. Aresta de batente a menos de 2 cm de uma junta vira aviso.

R7 · Pontos.
Tomadas, registros e chuveiro no centro da peça ou exatamente na junta. Nunca a 1 cm de uma junta.

R8 · Espelhamento.
Norte e Sul têm a mesma malha, e Leste e Oeste também. Por isso a régua de uma serve à outra, espelhada.

COMO O NÚMERO DE PEÇAS INTEIRAS É ESCOLHIDO

Parede · peça	Inteiras	Corte nas pontas	% da peça	Decisão
A · 2,64 m	16	5,45 cm	35%	recusada: 35%, quase no limite de 1/3
A · 2,64 m	15	13,35 cm	86%	ESCOLHIDA
A · 1,43 m	8	8,15 cm	53%	ESCOLHIDA
B · 2,64 m	32	7,05 cm	94%	recusada
B · 2,64 m	33	3,65 cm (junta 2,7 mm)	49%	ESCOLHIDA · meia peça
B · 1,43 m	17	5,05 cm	67%	ESCOLHIDA

ANTES × DEPOIS


Arquivo	Pontas antes	Fiadas antes	Pontas depois	Fiadas depois	Efeito
Norte e Sul · 7×15	5,0 · 5,1	7,8 · 10,7	5,05 · 5,05	9,25 · 9,25	pontas já boas; fiadas igualadas
Norte e Sul · 15×15	7,8 · 8,5	6,3 · 12,2	8,15 · 8,15	9,25 · 9,25	fiada de topo sai de 41% para 60%
Leste e Oeste · 7×15	7,5 · 6,6	9,2 · 9,3	3,65 · 3,65	9,25 · 9,25	meia peça exata; junta 2,7 mm
Leste e Oeste · 15×15	5,3 · 5,6	9,2 · 9,3	13,35 · 13,35	9,25 · 9,25	de 34–36% para 86%
Leste · 15×15 (358 × 260)	15,5 · 10,4	11,3 · 11,4	12,95 · 12,95	11,35 · 11,35	a confirmar (Prancha 11)

ESQUEMA: A MESMA PAREDE, ANTES E DEPOIS (OPÇÃO A, 2,64 M, ESCALA FORA DE 1:1)

Antes: 16 inteiras e pontas de 5,3 e 5,6 cm (34–36%)



Depois: 15 inteiras e pontas de 13,35 cm (86%), peça central sobre o eixo




Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Planta do banheiro e nomenclatura das paredes

As quatro paredes recebem o nome da face da folha do caderno (norte da folha no topo da planta). Cada elevação deste caderno é vista de dentro do banheiro. Geometria lida do scan de 02.09.2026 e da Prancha 08 do caderno.

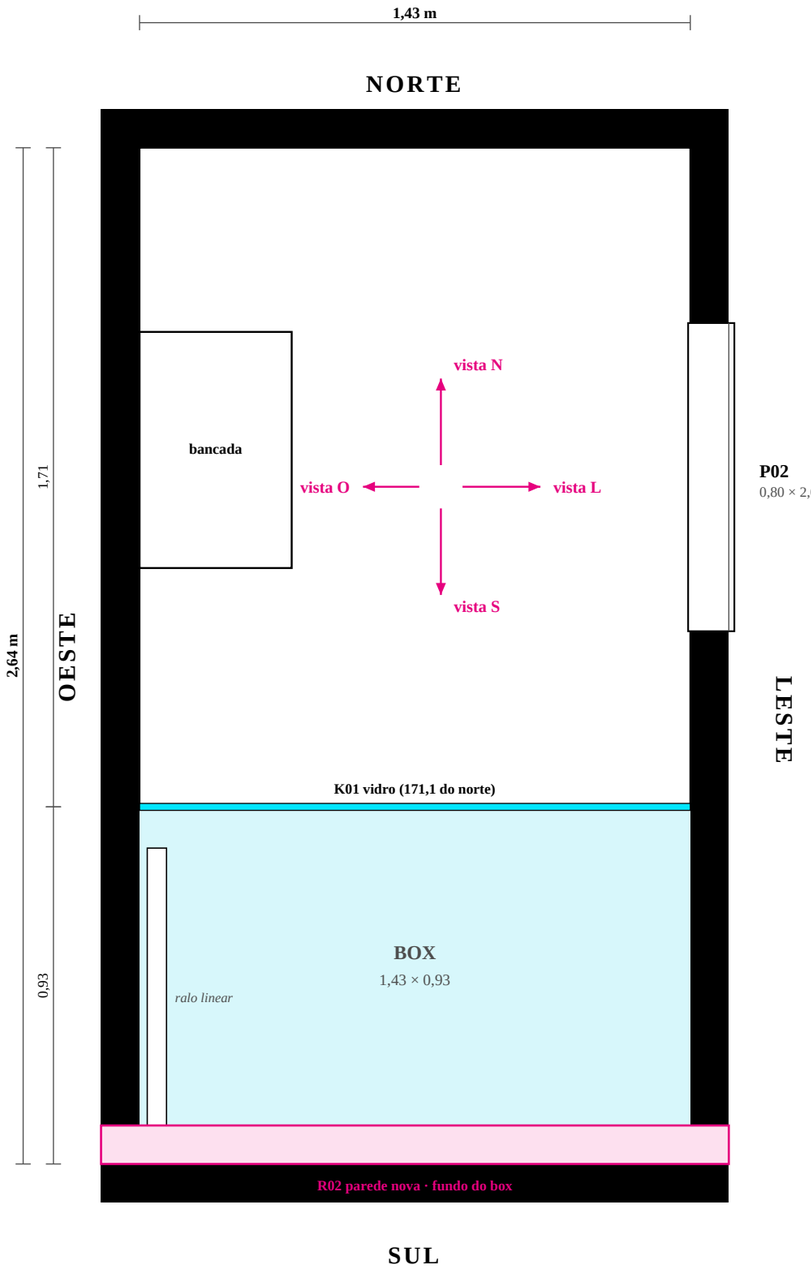

AS QUATRO PAREDES

Parede	L × A (cm)	Vista de dentro	O que tem
NORTE	143 × 240	Esquerda = oeste, direita = leste	Parede lisa, só revestimento. Embutidos EM no forro, sem ponto na parede.
LESTE	264 × 240	Esquerda = norte, direita = sul	Porta P02 a 45,5–125,5 cm do canto norte (zona seca). K01 a 171,1. Box em 171,1–264.
SUL	143 × 240	Esquerda = leste, direita = oeste	R02, parede nova no fundo do box. Toda molhada. Pontos do chuveiro a definir.
OESTE	264 × 240	Esquerda = sul, direita = norte	Box em 0–92,9. K01 a 92,9. Bancada de 0,61 m (de 154,9 a 216,2) com espelho, S03 e T17.

FONTES E TOLERÂNCIAS

Interior.
Scan: 1,432 × 2,638 m (3,78 m²). Os arquivos usaram 143 × 264, arredondado. O desenho usa 143,0 × 263,8 apenas na planta; a paginação usa 143 × 264.

Porta e bancada.
Posições lidas do vetor do scan (Prancha 08). Precisão de cerca de 1 a 2 cm: conferir com o batente instalado.

Altura.
2,40 m, do piso acabado ao forro novo, confirmada pelo cliente em 21.09. Depende de P05 e R03.

Norte.
Os nomes das faces seguem a folha do caderno. O norte verdadeiro está a 126° do topo da folha (Prancha 01).

LEGENDA DA PLANTA


área molhada (box) · vidro K01 · R02 parede nova · vão da porta P02

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção A · 15,5 × 15,5 cm · planificação das quatro paredes

As quatro paredes abertas em sequência, vistas de dentro, escala 1:25. As fiadas atravessam os cantos na mesma altura. Cada parede tem o eixo no centro e o mesmo corte nas duas pontas.

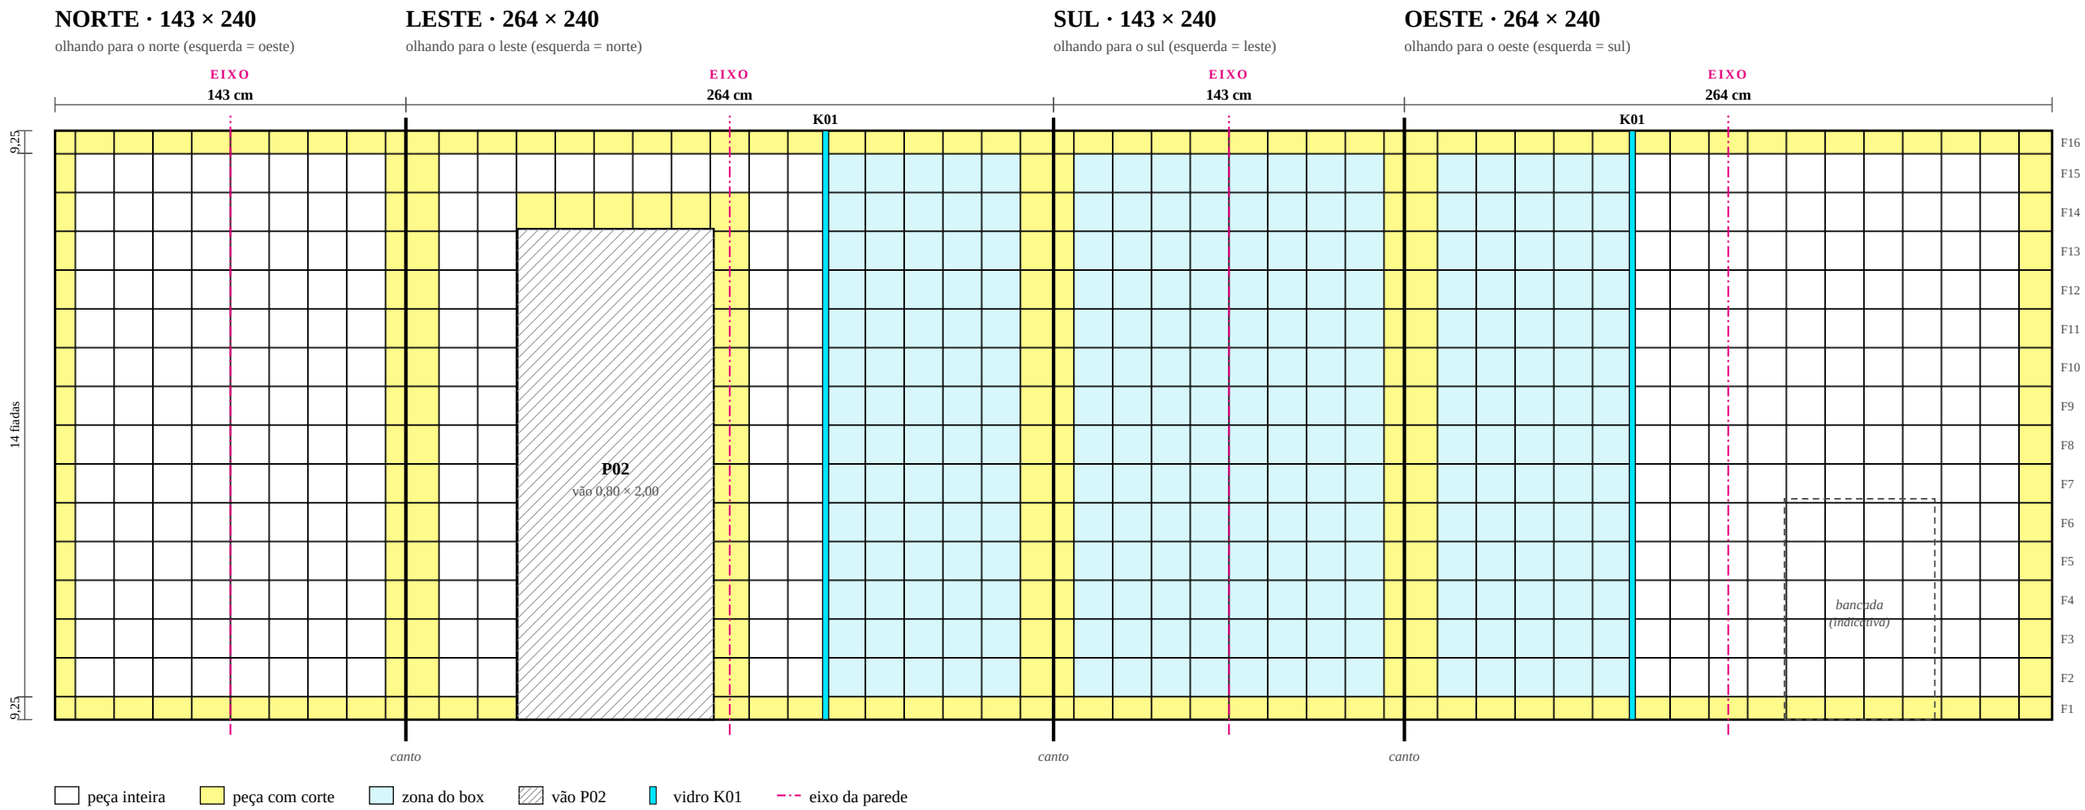

Parede	Malha (colunas × fiadas)	Inteiras na linha	Corte das pontas	Fiada piso · topo	Peças inteiras	Peças com corte	Peças físicas	Cortes
NORTE	10 × 16	8	8,15 cm · 53%	9,25 · 9,25 cm	112	48	160	52
LESTE	17 × 16	15	13,35 cm · 86%	9,25 · 9,25 cm	132	75	207	82
SUL	10 × 16	8	8,15 cm · 53%	9,25 · 9,25 cm	112	48	160	52
OESTE	17 × 16	15	13,35 cm · 86%	9,25 · 9,25 cm	210	62	272	66
Total					**566**	**233**	**799**	**252**

LEITURA

Mesma malha, espelhada.
Norte e Sul usam a mesma régua (junta do eixo entre C5 e C6), e Leste e Oeste também (peça inteira C9 centrada no eixo).

Fiadas contínuas.
14 fiadas inteiras e cortes de 9,25 cm no piso e no forro, nas quatro paredes: a junta horizontal não quebra no canto.

Fiada de piso e de topo.
Cortar 3 a 5 mm menores que o desenhado, para a junta de movimentação contra piso e forro. Medir a cota real antes (Prancha 15).

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).


Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção A · elevações Norte e Sul

Peça 15,5 × 15,5 cm cm, escala 1:20, vistas de dentro. As duas paredes têm a mesma malha. A Sul é a parede nova R02, no fundo do box.


NORTE · 143 × 240

olhando para o norte · esquerda = oeste

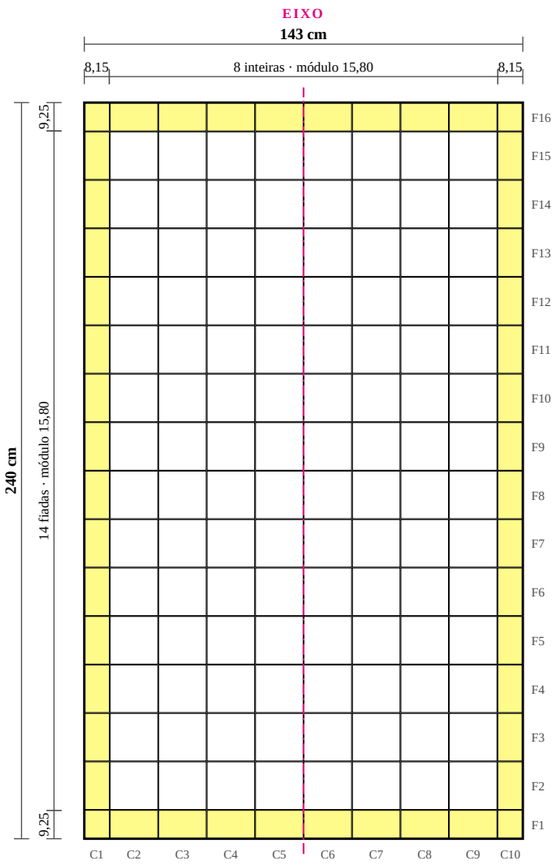

SUL · 143 × 240

olhando para o sul · esquerda = leste

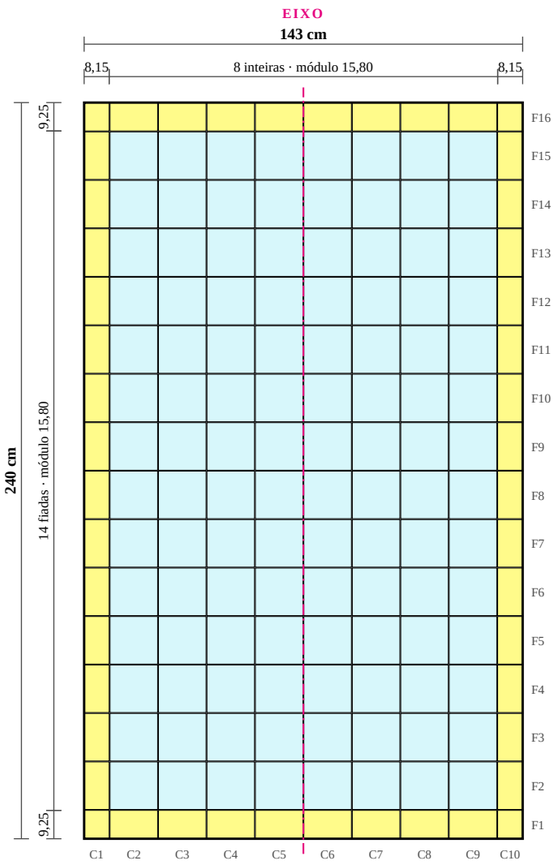

peça inteira · peça com corte · zona do box · vão P02 · vidro K01 · eixo da parede

RÉGUA DE MODULAÇÃO · NORTE E SUL

Início de cada peça inteira, em cm a partir do canto esquerdo:
8,5 · 24,2 · 40 · 55,8 · 71,6 · 87,4 · 103,2 · 119

Início de cada fiada inteira, em cm a partir do piso acabado:
9,6 · 25,4 · 41,2 · 57 · 72,8 · 88,5 · 104,3 · 120,1 · 135,9 · 151,8 · 167,6 · 183,4 · 199,2 · 215

LEITURA DAS PAREDES

Eixo e pontas.
Eixo a 71,5 cm do canto. 8 peças inteiras por fiada, junta do eixo entre C5 e C6. Pontas de 8,15 cm (53% da peça) nos dois lados.

Fiadas.
14 fiadas inteiras entre duas de 9,25 cm (piso e forro). Mesma altura das paredes Leste e Oeste.

NORTE.
Parede lisa, sem ponto elétrico ou hidráulico. Os embutidos EM ficam no forro.

SUL (R02).
Parede nova do fundo do box, toda molhada: a impermeabilização precisa subir antes do revestimento (altura a decidir, Prancha 16). Pontos do chuveiro e dos registros: centro da peça ou junta.

Cantos.
Canto interno com junta de movimentação selada, sem rejunte rígido. Peças de ponta de uma parede encostam na da vizinha com 3 a 5 mm de folga.

QUANTIDADE POR PAREDE

Parede	Malha	Inteiras	Com corte	Físicas	Cortes
NORTE	10 × 16	112	48	160	52
SUL	10 × 16	112	48	160	52

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).


Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção A · elevações Leste e Oeste

Peça 15,5 × 15,5 cm cm, escala 1:25, vistas de dentro. A malha é a mesma nas duas paredes. A Leste leva a porta P02; as duas levam o vidro K01 e a zona do box.


LESTE · 264 × 240

olhando para o leste · esquerda = norte

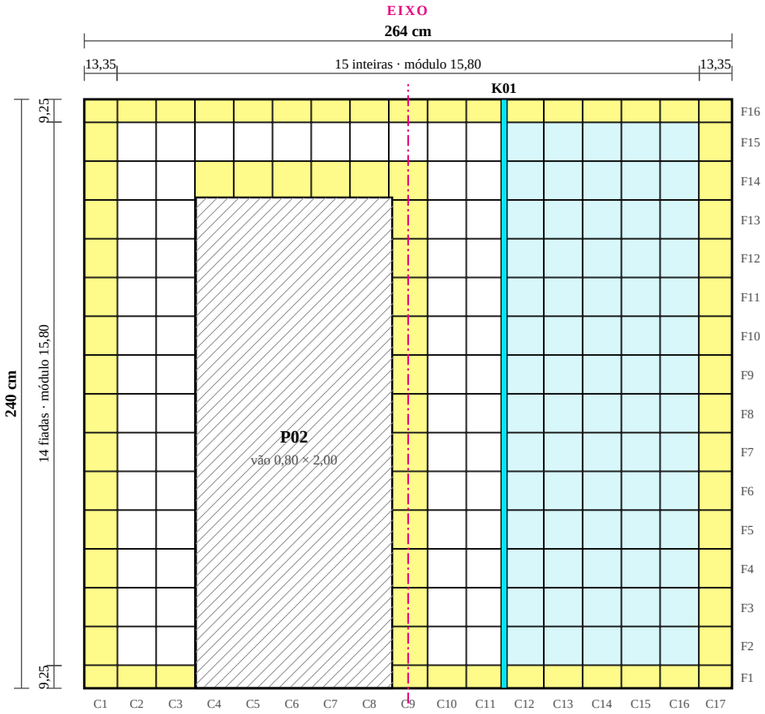

OESTE · 264 × 240

olhando para o oeste · esquerda = sul

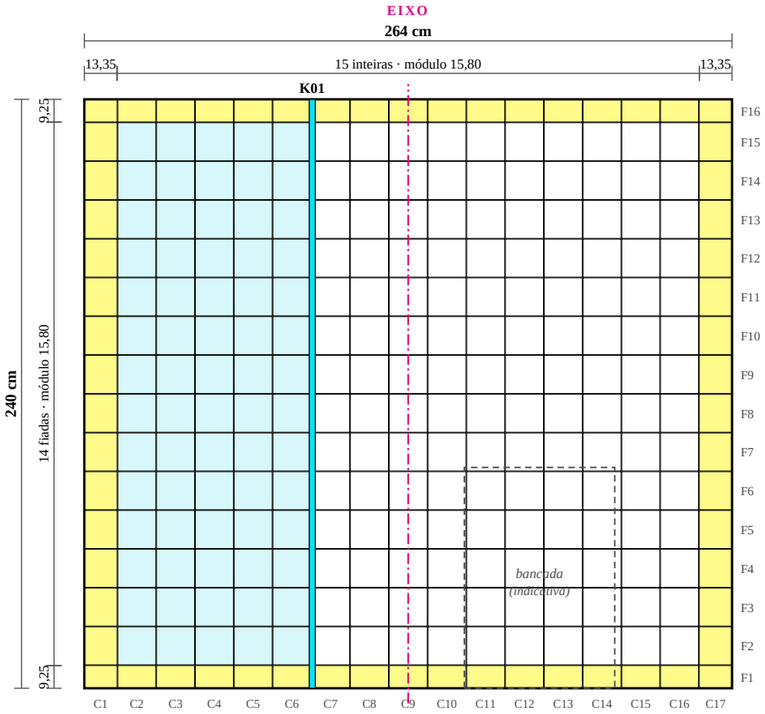

peça inteira · peça com corte · zona do box · vão P02 · vidro K01 · eixo da parede

MALHA

Eixo e pontas.
Eixo a 132 cm do canto. 15 inteiras por fiada, peça inteira C9 centrada no eixo. Pontas de 13,35 cm (86%), iguais nas duas paredes.

Fiadas.
14 inteiras e cortes de 9,25 cm no piso e no forro, iguais às paredes Norte e Sul.

QUANTIDADE

Parede	Malha	Int.	Corte	Fís.	Cortes
LESTE	17 × 16	132	75	207	82
OESTE	17 × 16	210	62	272	66

A Leste perde 65 peças da malha dentro do vão de 1,60 m².

RÉGUA DE MODULAÇÃO · LESTE E OESTE

Início de cada peça inteira, em cm a partir do canto esquerdo:
13,7 · 29,5 · 45,2 · 61 · 76,8 · 92,6 · 108,4 · 124,2 · 140 · 155,8 · 171,7 · 187,5 · 203,3 · 219,1 · 234,9

Início de cada fiada inteira, em cm a partir do piso acabado:
9,6 · 25,4 · 41,2 · 57 · 72,8 · 88,5 · 104,3 · 120,1 · 135,9 · 151,8 · 167,6 · 183,4 · 199,2 · 215

VÃO DA PORTA P02 (LESTE)

Batente esquerdo do P02 (45,5 cm).
Cai na junta entre C3 e C4, a 0,25 cm dela. O batente cobre a folga de cerca de 5 mm entre peça e madeira. Nenhum corte estreito.

Batente direito do P02 (125,5 cm).
Corta a coluna C9 e sobra uma faixa de 14,25 cm (92% da peça).

Cabeça do vão (2,00 m).
Corta a fiada F14 e sobra 14,65 cm (95% da peça) acima do vão. O canto direito pede um recorte em L pequeno.

VIDRO K01 E BANCADA

Vidro K01.
Nas duas paredes o vidro cai a 0,25 cm de uma junta vertical: perfil e junta ficam alinhados.


Bancada (Oeste).
Desenhada só como referência, de 154,9 a 216,2 cm. O revestimento corre por trás dela. Altura do espelho e da bancada ainda a definir.

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção B · 7,5 × 15,5 cm · planificação das quatro paredes

As quatro paredes abertas em sequência, vistas de dentro, escala 1:25. As fiadas atravessam os cantos na mesma altura. Cada parede tem o eixo no centro e o mesmo corte nas duas pontas.

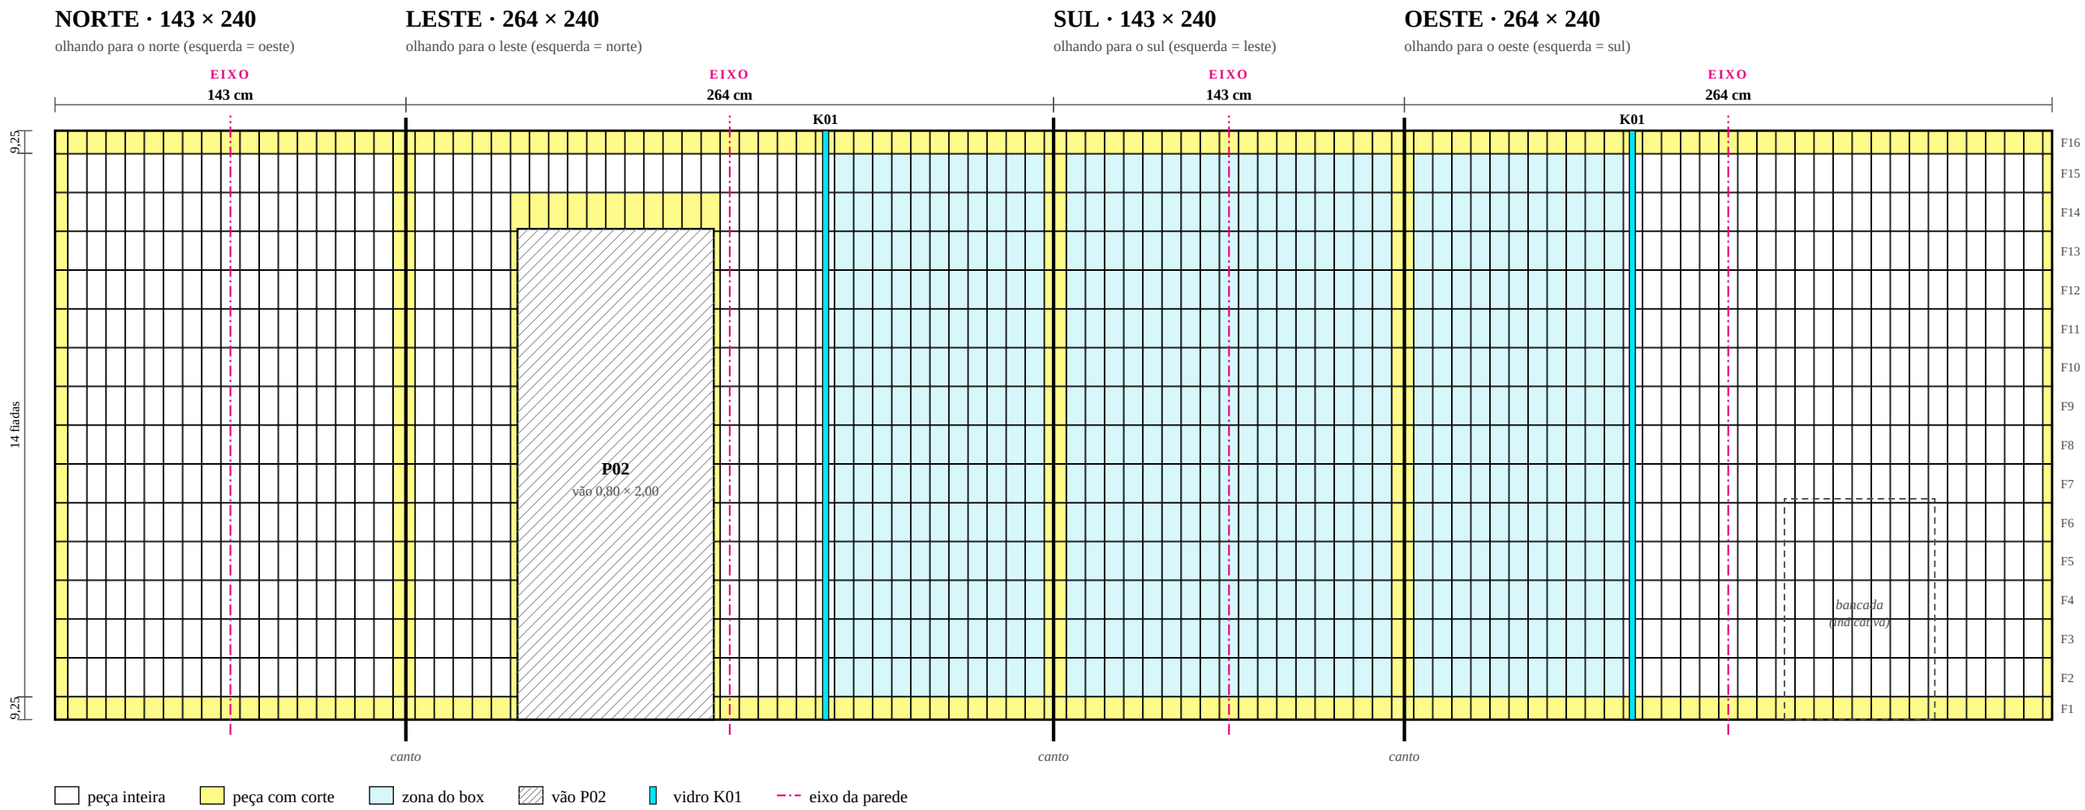

Parede	Malha (colunas × fiadas)	Inteiras na linha	Corte das pontas	Fiada piso · topo	Peças inteiras	Peças com corte	Peças físicas	Cortes
NORTE	19 × 16	17	5,05 cm · 67%	9,25 · 9,25 cm	238	66	304	70
LESTE	35 × 16	33	3,65 cm · 49% (junta 2,7 mm)	9,25 · 9,25 cm	319	124	427	116
SUL	19 × 16	17	5,05 cm · 67%	9,25 · 9,25 cm	238	66	304	70
OESTE	35 × 16	33	3,65 cm · 49% (junta 2,7 mm)	9,25 · 9,25 cm	462	98	544	86
Total					**1257**	**354**	**1579**	**342**

LEITURA

Mesma malha, espelhada.
Norte e Sul usam a mesma régua (peça inteira C10 centrada no eixo), e Leste e Oeste também (peça inteira C18 centrada no eixo).

Fiadas contínuas.
14 fiadas inteiras e cortes de 9,25 cm no piso e no forro, nas quatro paredes: a junta horizontal não quebra no canto.

Fiada de piso e de topo.
Cortar 3 a 5 mm menores que o desenhado, para a junta de movimentação contra piso e forro. Medir a cota real antes (Prancha 15).

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).


Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção B · elevações Norte e Sul

Peça 7,5 × 15,5 cm cm, escala 1:20, vistas de dentro. As duas paredes têm a mesma malha. A Sul é a parede nova R02, no fundo do box.


NORTE · 143 × 240

olhando para o norte · esquerda = oeste

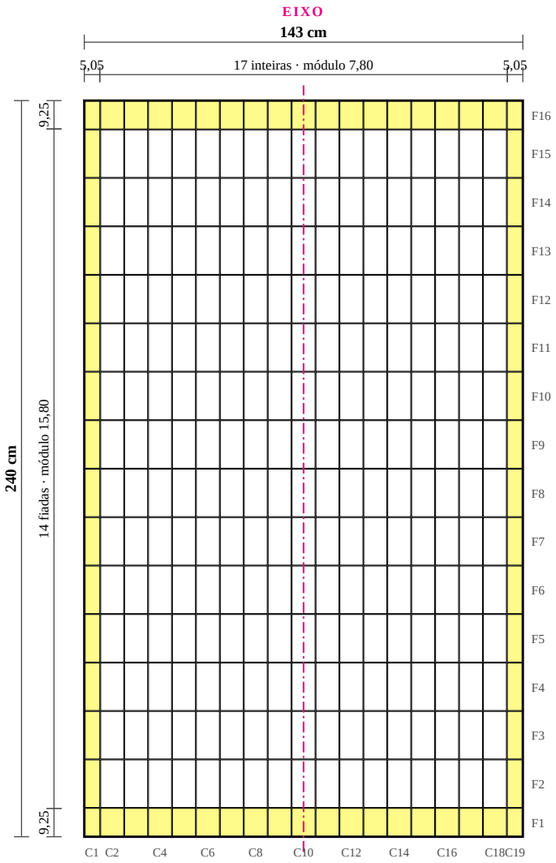

SUL · 143 × 240

olhando para o sul · esquerda = leste

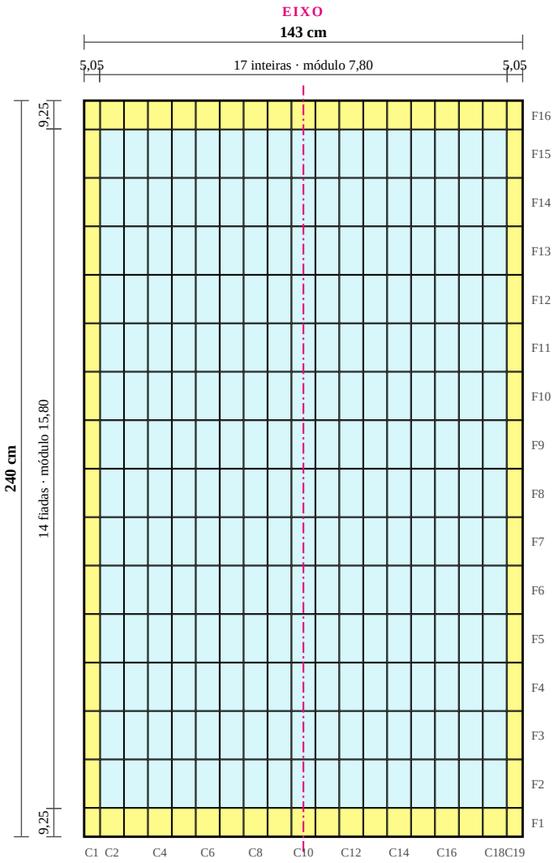

peça inteira · peça com corte · zona do box · vão P02 · vidro K01 · eixo da parede

RÉGUA DE MODULAÇÃO · NORTE E SUL

Início de cada peça inteira, em cm a partir do canto esquerdo:
5,4 · 13,2 · 20,9 · 28,8 · 36,5 · 44,3 · 52,1 · 59,9 · 67,7 · 75,5 · 83,3 · 91,1 · 98,9 · 106,7 · 114,5 · 122,3 · 130,1

Início de cada fiada inteira, em cm a partir do piso acabado:
9,6 · 25,4 · 41,2 · 57 · 72,8 · 88,5 · 104,3 · 120,1 · 135,9 · 151,8 · 167,6 · 183,4 · 199,2 · 215

LEITURA DAS PAREDES

Eixo e pontas.
Eixo a 71,5 cm do canto. 17 peças inteiras por fiada, peça inteira C10 centrada no eixo. Pontas de 5,05 cm (67% da peça) nos dois lados.

Fiadas.
14 fiadas inteiras entre duas de 9,25 cm (piso e forro). Mesma altura das paredes Leste e Oeste.

NORTE.
Parede lisa, sem ponto elétrico ou hidráulico. Os embutidos EM ficam no forro.

SUL (R02).
Parede nova do fundo do box, toda molhada: a impermeabilização precisa subir antes do revestimento (altura a decidir, Prancha 16). Pontos do chuveiro e dos registros: centro da peça ou junta.

Cantos.
Canto interno com junta de movimentação selada, sem rejunte rígido. Peças de ponta de uma parede encostam na da vizinha com 3 a 5 mm de folga.

QUANTIDADE POR PAREDE

Parede	Malha	Inteiras	Com corte	Físicas	Cortes
NORTE	19 × 16	238	66	304	70
SUL	19 × 16	238	66	304	70

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).


Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Opção B · elevações Leste e Oeste

Peça 7,5 × 15,5 cm cm, escala 1:25, vistas de dentro. A malha é a mesma nas duas paredes. A Leste leva a porta P02; as duas levam o vidro K01 e a zona do box.


LESTE · 264 × 240

olhando para o leste · esquerda = norte

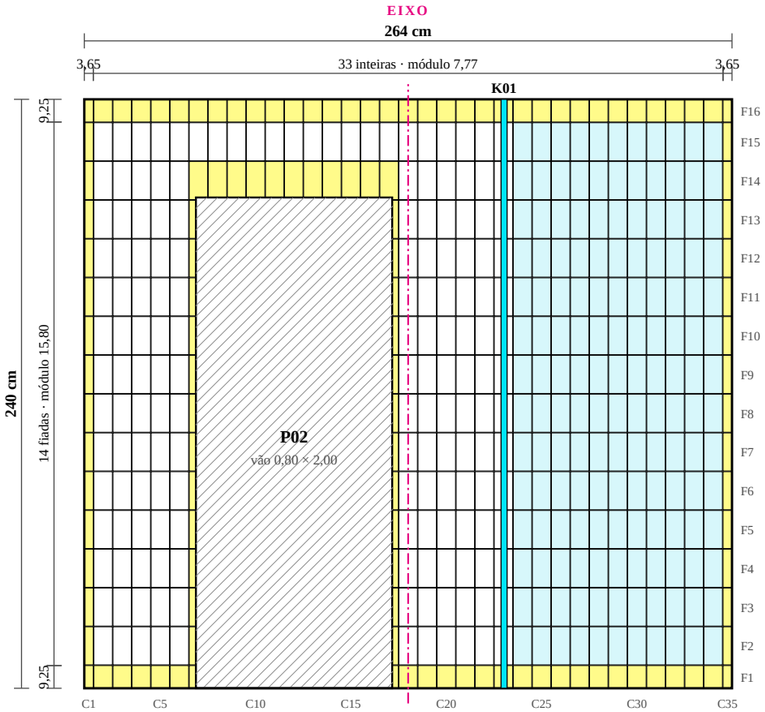

OESTE · 264 × 240

olhando para o oeste · esquerda = sul

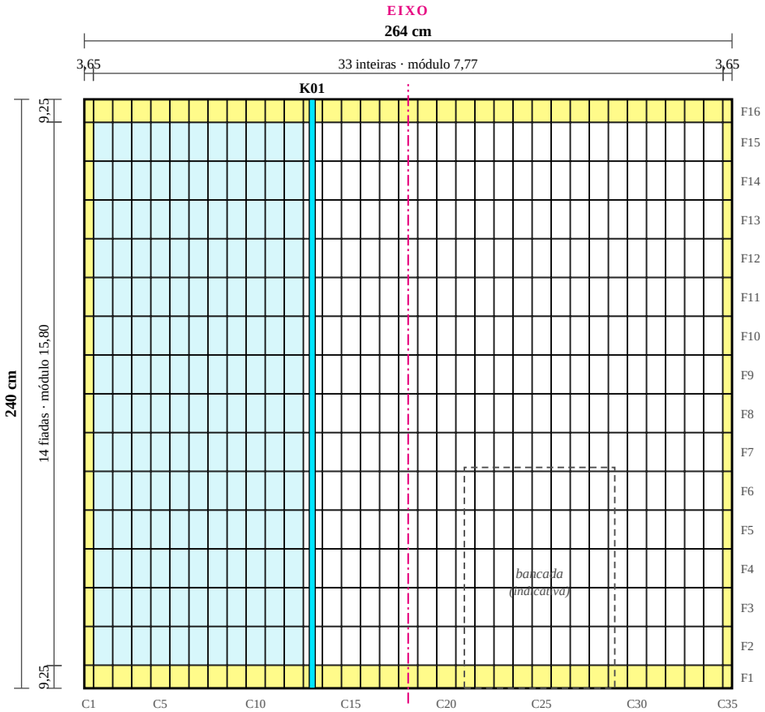

peça inteira · peça com corte · zona do box · vão P02 · vidro K01 · eixo da parede

MALHA

Eixo e pontas.
Eixo a 132 cm do canto. 33 inteiras por fiada, peça inteira C18 centrada no eixo. Pontas de 3,65 cm (49%), iguais nas duas paredes; junta de 2,71 mm entre colunas, para fechar a meia peça.

Fiadas.
14 inteiras e cortes de 9,25 cm no piso e no forro, iguais às paredes Norte e Sul.

QUANTIDADE

Parede	Malha	Int.	Corte	Fís.	Cortes
LESTE	35 × 16	319	124	427	116
OESTE	35 × 16	462	98	544	86

A Leste perde 117 peças da malha dentro do vão de 1,60 m².

RÉGUA DE MODULAÇÃO · LESTE E OESTE

Início de cada peça inteira, em cm a partir do canto esquerdo:
3,9 · 11,7 · 19,5 · 27,2 · 35 · 42,8 · 50,5 · 58,3 · 66,1 · 73,9 · 81,6 · 89,4 · 97,2 · 104,9 · 112,7 · 120,5 · 128,2 · 136 · 143,8 · 151,6 · 159,3 · 167,1 · 174,9 · 182,6 · 190,4 · 198,2 · 206 · 213,7 · 221,5 · 229,3 · 237 · 244,8 · 252,6

Início de cada fiada inteira, em cm a partir do piso acabado:
9,6 · 25,4 · 41,2 · 57 · 72,8 · 88,5 · 104,3 · 120,1 · 135,9 · 151,8 · 167,6 · 183,4 · 199,2 · 215

VÃO DA PORTA P02 (LESTE)

Batente esquerdo do P02 (45,5 cm).
Corta a coluna C7 e sobra uma faixa de 2,73 cm (36% da peça). É estreita: confirmar a posição do batente instalado antes de cortar.

Batente direito do P02 (125,5 cm).
Corta a coluna C17 e sobra uma faixa de 2,48 cm (33% da peça). No limite de 1/3: conferir o batente instalado antes de cortar.

Cabeça do vão (2,00 m).
Corta a fiada F14 e sobra 14,65 cm (95% da peça) acima do vão. O canto direito pede um recorte em L pequeno.

VIDRO K01 E BANCADA

Vidro K01.
Cai a 3,5 cm da junta mais próxima, no meio de uma peça. O perfil do vidro (opção B de K01) assenta sobre a peça, não na junta.

Bancada (Oeste).
Desenhada só como referência, de 154,9 a 216,2 cm. O revestimento corre por trás dela. Altura do espelho e da bancada ainda a definir.

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).


Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Parede Leste 358 × 260 cm · a confirmar

Esta parede aparece só no arquivo "Leste · 15×15" e não casa com o banheiro (Leste com 264 × 240 cm). A paginação está pronta nas duas opções, mas fica FORA do total do banheiro até alguém dizer que parede é esta.


OPÇÃO A · 15,5 × 15,5

358 × 260 cm · escala 1:25

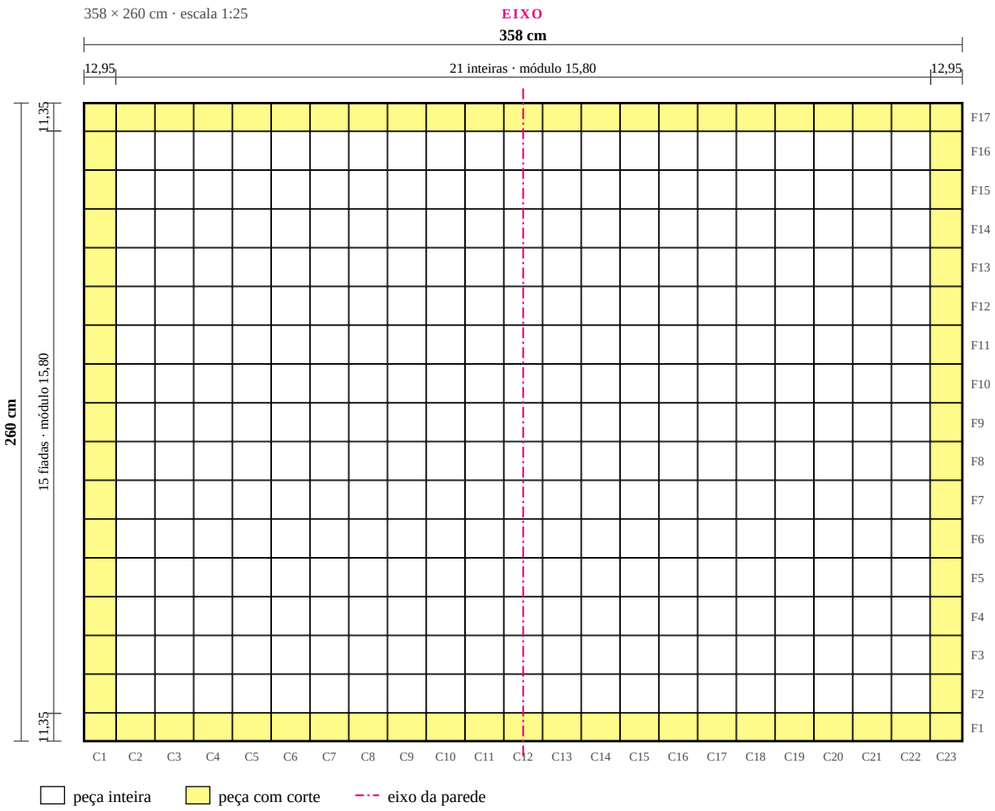

OPÇÃO B · 7,5 × 15,5

358 × 260 cm · escala 1:25

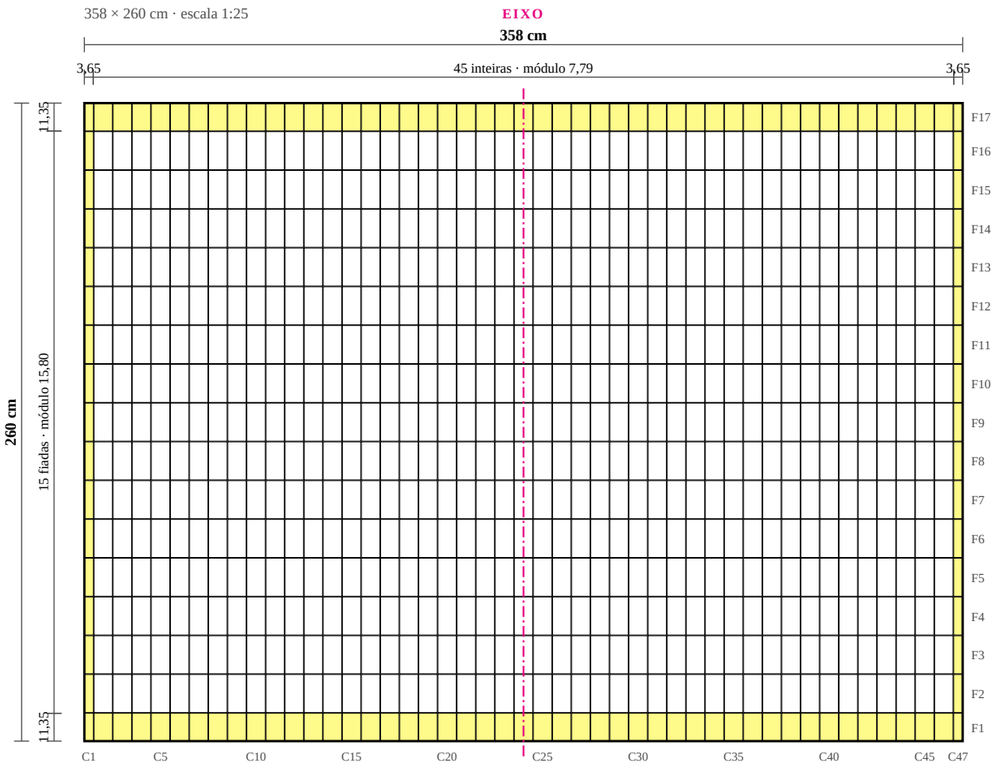

Opção	Colunas	Fiadas	Inteiras	Com corte	Físicas	+10%	Caixas
A · 15,5 × 15,5	21 inteiras · corte 12,95 cm (84%)	15 inteiras · corte 11,35 cm (73%)	315	76	391	431	12
B · 7,5 × 15,5	45 inteiras · corte 3,65 cm (49%) · junta 2,87 mm	15 inteiras · corte 11,35 cm (73%)	675	124	782	861	34

O QUE PRECISA SER RESPONDIDO

Que parede é esta?
A Leste do banheiro tem 2,64 m. Os 3,58 m podem ser a parede da casa vista de fora, outro ambiente ou um erro de digitação (2,64 + 0,93 = 3,57).

Altura de 2,60 m.
Combina com o pé-direito sem forro (2,62 m), não com o banheiro (2,40 m). Se é outro ambiente, o forro e a cota do piso mudam as fiadas.

Se for o banheiro.
As duas paredes Leste do desenho não podem coexistir. Vale a medida de obra.

COMO A MALHA FOI CALCULADA

Pontas iguais.
A: 21 inteiras por fiada, corte de 12,95 cm (84%). B: 45 inteiras, meia peça de 3,65 cm, junta de 2,87 mm entre colunas.

Fiadas.
15 inteiras e cortes de 11,35 cm (73%) no piso e no topo. Se a altura for 2,40 m, valem as fiadas do banheiro (9,25 cm).

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Parede fora do total do banheiro até a confirmação. Peças e caixas desta folha não entram no quantitativo da Prancha 12.

Quantitativo, lista de corte e consumíveis

Quantidades das quatro paredes do banheiro (17,94 m² líquidos, vão da porta descontado), nas duas opções. A caixa usada é a do produto, não a de 1,44 m² dos arquivos recebidos. A parede de 358 × 260 cm fica de fora.

PEÇAS POR PAREDE

Parede	Área líquida m²	A · peças físicas	A · cortes	B · peças físicas	B · cortes
NORTE	3,43	160	52	304	70
LESTE	4,74	207	82	427	116
SUL	3,43	160	52	304	70
OESTE	6,34	272	66	544	86
Total	**17,94**	**799**	**252**	**1579**	**342**

COMPRA, COM A CAIXA DO PRODUTO

	Opção A · 15,5 × 15,5	Opção B · 7,5 × 15,5
Peças físicas (as duas pontas da opção B nas paredes de 2,64 m saem de uma peça só)	799	1579
Reserva de 10% (quebra, reposição)	879	1737
Peças por caixa	36	26
m² por caixa	0,87	0,30
Caixas a comprar	**25**	**67**
Peças compradas	900	1742
m² comprados (líquido 17,94)	21,75	20,10
Metros de junta (aprox., sem descontar o vão)	242 m	372 m
Menor corte da malha	8,15 cm (53%)	3,65 cm (49%)

O QUE OS PDFS RECEBIDOS MANDAVAM COMPRAR

Arquivo	Peças com 10%	Caixas no PDF (1,44 m²)	Caixas reais
Norte e Sul · 7×15	304 + 10% = 335	sem resultado	13
Norte e Sul · 15×15	176	3	5
Leste e Oeste · 7×15	599	5	24
Leste e Oeste · 15×15	317	6	9
Leste · 15×15 (358 × 260)	431	8	12

LISTA DE CORTE · OPÇÃO A

Corte	L × A cm	Qtd	Paredes
Ponta	13,35 × 15,50	56	Leste, Oeste
Ponta	8,15 × 15,50	56	Norte, Sul
Fiada de piso ou topo	15,50 × 9,25	86	Leste, Norte, Oeste, Sul
Canto da malha	13,35 × 9,25	8	Leste, Oeste
Canto da malha	8,15 × 9,25	8	Norte, Sul
Batente do vão	14,25 × 15,50	12	Leste
Batente do vão	14,25 × 9,25	1	Leste
Cabeça do vão	15,50 × 14,65	4	Leste
Canto do vão (L)	15,50 × 15,50	2	Leste

LISTA DE CORTE · OPÇÃO B

Corte	L × A cm	Qtd	Paredes
Ponta	5,05 × 15,50	56	Norte, Sul
Ponta	3,65 × 15,50	56	Leste, Oeste
Fiada de piso ou topo	7,50 × 9,25	189	Leste, Norte, Oeste, Sul
Canto da malha	5,05 × 9,25	8	Norte, Sul
Canto da malha	3,65 × 9,25	8	Leste, Oeste
Batente do vão	2,73 × 15,50	12	Leste
Batente do vão	2,73 × 9,25	1	Leste
Batente do vão	2,48 × 15,50	12	Leste
Batente do vão	2,48 × 9,25	1	Leste
Cabeça do vão	7,50 × 14,65	9	Leste
Canto do vão (L)	7,50 × 15,50	2	Leste

Os cortes de ponta da opção B vêm em pares: cada peça de 7,5 cm é partida ao meio e as duas metades de 3,65 cm vão para as pontas esquerda e direita da mesma fiada. A lista conta as metades. Em A, cada corte consome uma peça.

CONSUMÍVEIS · ESTIMATIVAS PARA CONFIRMAR COM OS FORNECEDORES

Item	Base	Opção A	Opção B
Argamassa colante ACII (ACIII se a ficha pedir)	5,0 kg/m² com dentada de 6 mm, +15%	103 kg · 6 sacos de 20 kg	igual à A
Rejunte (tipo e cor a definir)	peça 155×155 / 75×155, 9 mm, junta 3 mm, densidade 1,9, +15%	0,66 kg/m² · 13,7 kg	1,01 kg/m² · 20,9 kg
Espaçadores de 3 mm	cerca de 1 por peça física	799 un	1579 un
Selante de movimentação 6 × 6 mm	4 cantos de 2,40 m + topo (8,14 m) + pé sem o vão (7,34 m) = 25 m	4 cartuchos de 280 mL	igual à A
Disco diamantado e corte úmido	um disco por parede é o usual	252 cortes	342 cortes
Peças de acabamento da linha	quinas e cantoneiras: a levantar com a Portobello	a definir	a definir

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Escopo de serviços

O que o assentador e a obra precisam fazer para o revestimento de parede do banheiro, na ordem em que acontece. Os IDs D, R, C e P são os do caderno MaxHaus; os RV são novos e cobrem só o revestimento.

ID	Serviço	O que inclui	Quantidade	Depois de	Aceite
RV00	Medida de obra	Medir largura (em três alturas), altura (em três posições), prumo e esquadro das quatro paredes, com o emboço pronto e a cota do piso acabado marcada. Refazer a paginação (Prancha 15) se a largura mudar mais de 5 mm ou a altura mais de 10 mm.	4 paredes	R02 emboçada · D04 · cota P05	Planilha de medidas assinada; paginação confirmada ou refeita.
RV01	Substrato	Remover resíduos de D04, chapisco e emboço regularizado nas paredes existentes e na R02, com cura pelo prazo do fornecedor da argamassa. Planeza conferida com régua de 2 m.	17,94 m² + vão	D04 · R02	Sem fissura nem pó; planeza conferida e registrada.
RV02	Interface com a impermeabilização do box	Subida da impermeabilização nas paredes do box na altura definida no projeto de impermeabilização e ensaio de estanqueidade antes de revestir. Hoje o caderno só cobre o piso (C1).	box · 7,90 m²	RV01 · C1	Ensaio aprovado por escrito. ALTURA A DECIDIR (Prancha 16).
RV03	Marcação	Eixo de cada parede, linha de piso (cota P05) e linha de forro (R03) com nível a laser, esquadro 3-4-5 nos cantos e régua de modulação com as marcas das Pranchas 06/07 ou 09/10. As fiadas atravessam os cantos na mesma altura.	4 paredes	RV00	Marcas conferidas contra as pranchas; fiadas iguais nos cantos.
RV04	Corte das peças	Cortar na bancada, com disco diamantado e água, todas as pontas, fiadas de piso e topo e recortes do vão; numerar e estocar por parede conforme a lista da Prancha 12.	A: 252 cortes · B: 342	RV03	Peças conferidas contra a lista; fiadas de piso e topo 3 a 5 mm menores.
RV05	Assentamento	Argamassa colante ACII (ACIII se a ficha do produto pedir), dentada de 6 mm, colagem simples, espaçadores de 3 mm. Abrir a partir do eixo, da fiada F2 para cima, com régua apoiada na linha de nível; as pontas e a fiada F1 por último. Misturar caixas (variação V4).	17,94 m²	RV03 · RV04	Juntas alinhadas, sem degrau perceptível com luz rasante, colagem sem vazios.
RV06	Recortes de pontos	Marcar T17, S03, registros e chuveiro sobre a malha antes de assentar. Furar com serra-copo diamantada. Centro da peça ou junta.	a definir	RV03 · projetos de elétrica e hidráulica	Pontos no centro de peça ou na junta; borda sem lasca.
RV07	Peças de acabamento	Cantoneiras ou peças de quina da linha nas quinas vivas: retorno do batente da P02 e, se houver, topo do box.	a levantar	RV05	Nenhuma aresta cortada exposta.
RV08	Juntas de movimentação	Selante elástico de 6 × 6 mm (poliuretano ou silicone neutro) nos quatro cantos internos, no encontro com o forro e com o piso, e na soleira, sem rejunte rígido atrás.	≈ 25 m	RV05	Selante contínuo, sem bolha, rente à peça.
RV09	Rejuntamento	Depois da cura da argamassa e com as juntas de movimentação limpas. Tipo e cor a definir (box: acrílico ou epóxi). Teste de cor em área pequena. Limpar o excesso na hora.	17,94 m²	RV05 · RV08	Junta cheia e uniforme, sem manchas.
RV10	Limpeza e proteção	Limpeza final e proteção do revestimento até a instalação de louças, do vidro K01 e do forro R03.	4 paredes	RV09	Revestimento sem riscos até a entrega.
RV11	Recebimento	Checklist da Prancha 14, fotos por parede, registro do lote e da tonalidade, entrega das peças de reposição identificadas.	4 paredes	RV10	Termo de aceite assinado.

FORA DESTE ESCOPO, MAS COM INTERFACE

Impermeabilização do piso e rodapé virado (C1) · regularização com caimento (C2) · ralo linear (C3) · piso (C4) · soleira (C5) · porta P02 · forro novo R03 · vidro K01 · louças e metais · pontos elétricos e hidráulicos. Cada um pede data e responsável na ordem de execução.

CONDIÇÕES

Quantidades da opção A ou B dependem da escolha do cliente. Alterações de escopo somente por escrito. Durações e prazos ficam em branco para a contratada preencher. Normas citadas para conferência na versão vigente: NBR 13754 (revestimento interno de parede com placas cerâmicas) e NBR 14081 (argamassa colante).

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Execução: sequência, pontos de parada e aceite

A ordem em que o revestimento é feito. Os pontos de parada não passam sem aceite por escrito. Os critérios de aceite são propostos para este projeto e valem junto com a norma vigente e a ficha do fabricante.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

1. Fechar as pendências críticas da Prancha 16 e medir as paredes (RV00).

   PARADA 1 · aceite das medidas; paginação confirmada ou refeita.

2. Substrato pronto e curado (RV01). Impermeabilização do box e ensaio de estanqueidade (RV02).

   PARADA 2 · ensaio de estanqueidade aprovado.

3. Mock-up de 3 × 3 peças numa parede: junta, rejunte, cor e brilho.

   PARADA 3 · cliente aprova o mock-up.

4. Marcar as quatro paredes (RV03): nível a laser, eixos, linhas de piso e de forro, régua de modulação.

5. Cortar e numerar as peças (RV04).

6. Assentar parede por parede a partir do eixo, da F2 para cima. Pontas e fiada de topo (F16) depois; fiada de piso (F1) por último, depois do piso acabado.

   PARADA 4 · antes do rejunte: alinhamento, planeza, som cavo e pontos conferidos.

7. Selante de movimentação (RV08), depois rejunte (RV09).

8. Limpeza, proteção e recebimento (RV10 e RV11).

   PARADA 5 · recebimento com checklist e fotos.

CRITÉRIOS DE ACEITE PROPOSTOS

Item	Como medir	Aceite
Juntas verticais	fio de prumo no eixo e a cada 1 m	sem desvio visível; pontas iguais nos dois lados, dentro de ±2 mm
Fiadas nos cantos	régua nivelada atravessando o canto	a junta horizontal passa de uma parede à outra sem salto
Corte das pontas	trena	igual nos dois lados e dentro de ±2 mm da prancha
Planeza	régua de 2 m	sem ondulação perceptível; tolerância da norma vigente
Degrau entre peças	luz rasante e ponta do dedo	sem degrau perceptível
Largura da junta	espaçador	3,0 mm (2,7 mm na opção B, paredes de 2,64 m), variação até ±0,5 mm
Colagem	percussão com cabo de espátula	sem som cavo; bordas e cantos com cobertura completa
Pontos	trena	no centro da peça ou na junta, nunca a 1 cm dela
Tonalidade	luz natural, caixas misturadas	sem mancha por caixa ou lote
Selante	visual	contínuo, sem bolha, rente

COMO MARCAR A MALHA

Eixo.
Marque o eixo de cada parede com linha de giz e confira com o esquadro nos cantos.

Nível.
Transfira a linha do piso acabado e a do forro com o laser. A régua de modulação começa no piso: as marcas estão nas Pranchas 06, 07, 09 e 10.

Referência.
Use a linha de 1,00 m acima do piso como conferência. Ela tem de passar pela mesma fiada nas quatro paredes.

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Recálculo com a medida real e detalhes de encontro

As cotas desta emissão vêm de arquivos e de um scan. Com o emboço pronto, meça de novo e refaça a conta. Uma variação de 1 cm na largura mexe 5 mm em cada corte de ponta.

COMO REFAZER A PAGINAÇÃO

1 **Medir.**
Largura em três alturas (rodapé, meio, forro) e use a MENOR. Altura do piso acabado ao forro em três pontos, também a menor.

2 **Escolher n.**
n é o número de peças inteiras por fiada. Corte de cada ponta: c = (L − n × peça − (n + 1) × junta) ÷ 2. Fica com a maior quantidade de inteiras em que c ainda seja de pelo menos 40% da peça.

3 **Meia peça.**
Para ter c = (peça − 0,2) ÷ 2, ajuste a junta entre colunas: j = (L − n × peça − (peça − 0,2)) ÷ (n + 1). Aceite se j ficar entre 2,5 e 3,5 mm. Fora disso, volte à junta de 3,0 mm.

4 **Fiadas.**
Mesma conta na vertical, com a peça de 15,5 cm e junta fixa de 3,0 mm, para as quatro paredes fecharem nos cantos.

5 **Conferir.**
Cortes iguais nos dois lados, nada abaixo de 1/3 da peça, fiadas iguais nas quatro paredes. Refazer o Paginador com os novos valores e emitir a revisão.

TABELAS DE BOLSO · CORTE EM FUNÇÃO DA LARGURA MEDIDA

A · PAREDE DE 1,43 M

L (cm)	n	Corte	%	Junta mm	Modo
142,0	8	7,65	49%	3,0	meia peça
142,5	8	7,90	51%	3,0	junta nominal
143,0	8	8,15	53%	3,0	junta nominal
143,5	8	8,40	54%	3,0	junta nominal
144,0	8	8,65	56%	3,0	junta nominal

B · PAREDE DE 1,43 M

L (cm)	n	Corte	%	Junta mm	Modo
142,0	17	4,55	61%	3,0	junta nominal
142,5	17	4,80	64%	3,0	junta nominal
143,0	17	5,05	67%	3,0	junta nominal
143,5	17	5,30	71%	3,0	junta nominal
144,0	17	5,55	74%	3,0	junta nominal

A · PAREDE DE 2,64 M


L (cm)	n	Corte	%	Junta mm	Modo
263,0	15	12,85	83%	3,0	junta nominal
263,5	15	13,10	85%	3,0	junta nominal
264,0	15	13,35	86%	3,0	junta nominal
264,5	15	13,60	88%	3,0	junta nominal
265,0	15	13,85	89%	3,0	junta nominal

B · PAREDE DE 2,64 M

L (cm)	n	Corte	%	Junta mm	Modo
263,0	32	6,55	87%	3,0	junta nominal
263,5	33	3,65	49%	2,6	meia peça
264,0	33	3,65	49%	2,7	meia peça
264,5	33	3,65	49%	2,9	meia peça
265,0	33	3,65	49%	3,0	meia peça


DETALHES DE ENCONTRO · ESQUEMAS SEM ESCALA

D1 · canto interno (planta)




Canto interno: as peças de ponta das duas paredes não se tocam. Folga de 3 a 5 mm preenchida com selante elástico (amarelo), sem rejunte rígido atrás.

D2 · topo, encontro com o forro (corte)

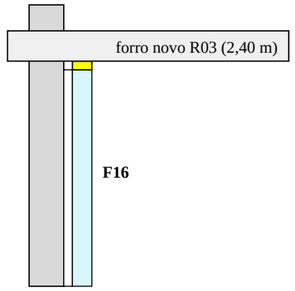

A fiada de topo (F16, 9,25 cm) termina 3 a 5 mm abaixo do forro; o vão é selado. Medir a cota real do forro antes de cortar a fiada.

D3 · pé da parede e soleira (corte)

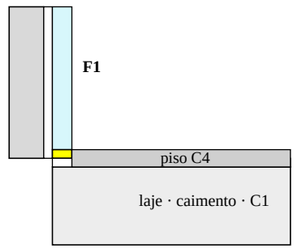

A fiada de piso (F1, 9,25 cm) é a última a entrar, depois do piso acabado, com 3 a 5 mm de folga selada. Na soleira da P02 a junta de material é a C5, sem degrau.

FIADAS · ALTURA MEDIDA (PEÇA DE 15,5 CM, JUNTA DE 3,0 MM)

H (cm)	n	Corte	%
238,0	14	8,25	53%
239,0	14	8,75	56%
240,0	14	9,25	60%
241,0	14	9,75	63%
242,0	14	10,25	66%

Cotas internas 1,43 × 2,64 × 2,40 m herdadas dos arquivos de paginação e do scan de 02.09.2026 (±1 cm). Refazer a paginação com a medida real depois do emboço (ver Prancha 15).

Emissão para conferência em obra. Não liberada para corte e compra de peças antes de fechar as pendências da Prancha 16.

Pendências e decisões

O que precisa ser respondido antes de cortar e comprar. As quatro críticas mudam número de peças, caixas ou a própria paginação.

#	Pendência	Por que trava	Quem decide	Efeito na paginação	Peso
1	Confirmar o produto: "Bouché" existe na Portobello? Pedir a ficha técnica.	As quantidades usam dados da linha Gouache de mesmo formato (36 e 26 peças por caixa, borda Bold, 9 mm). Formato real, borda, junta mínima e peças especiais podem ser outros.	Cliente e arquiteto, com a Portobello Shop	Pode mudar formato, caixa, junta e todos os números das Pranchas 5 a 12.	Crítica
2	Que parede é a Leste de 358 × 260 cm?	Há duas Lestes no projeto (264 × 240 e 358 × 260) e a altura de 2,60 m não bate com o forro a 2,40 m.	Arquiteto	Entra ou não no total. Prancha 11 pronta nas duas opções.	Crítica
3	Medir as paredes com o emboço pronto.	As cotas 143 × 264 vêm de arquivos e de scan (±1 cm).	Obra	Recálculo pela Prancha 15; pontas mudam 5 mm por centímetro.	Crítica
4	Cota do piso acabado (P05) e do forro novo (R03).	As fiadas de piso e de topo (9,25 cm) saem da altura de 2,40 m entre os dois.	Obra e arquiteto	Se a altura mudar, as fiadas mudam; as quatro paredes mudam juntas.	Crítica
5	Escolher a opção A (15,5 × 15,5) ou B (7,5 × 15,5).	A tem 25 caixas e 8,15 cm de menor corte; B tem 67 caixas, o dobro de juntas e menor corte de 3,65 cm.	Cliente	Define as Pranchas 5 a 10 que valem.	Importante
6	Validar a junta de 3 mm em mock-up.	A ficha da linha de mesmo formato indica 1,5 mm; o anúncio de outra peça Portobello de borda Bold fala em mais de 2 mm.	Cliente e assentador	Entre 2,5 e 3,5 mm a simetria se mantém. Fora disso, recalcular.	Importante
7	Altura da impermeabilização nas paredes do box.	C1 cobre o piso e o rodapé virado; as paredes do box (7,90 m²) vão até 2,40 m.	Arquiteto e impermeabilizador	Não muda a malha; muda o prazo e o escopo (RV02).	Importante
8	Posição final do batente da P02.	A posição vem do vetor do scan (±2 cm). Na opção B os cortes de batente têm 2,7 e 2,5 cm.	Obra	Pode estreitar ou alargar os cortes de batente (Pranchas 7 e 10).	Importante
9	Vidro K01: manter (A) ou trocar (B, perfis na parede antes do revestimento).	Perfil e fixação entram no revestimento. Na opção A de peça o vidro cai sobre uma junta.	Cliente	Define onde ficam furos e perfis.	Importante
10	Posição final de T17, S03, registros, chuveiro e ducha.	Recortes precisam estar na malha antes de assentar.	Elétrica e hidráulica	Cada ponto vai para o centro de uma peça ou para a junta.	Importante
11	Rejunte: tipo e cor (box: acrílico ou epóxi).	Define consumo e acabamento.	Cliente	Nenhum na malha.	Menor
12	Peças de acabamento: quinas e cantoneiras.	Retorno do batente e topo do box.	Cliente	Soma ao pedido.	Menor
13	Lote único e reposição.	Variação visual V4 (grande). Reserva de 10% a validar.	Compras	Caixas e reposição guardada.	Menor

Quando as quatro críticas estiverem fechadas, a emissão passa a REV. 01 e vale para corte e compra. O Paginador de Revestimentos atualizado (cortes iguais nas duas pontas e caixa do produto) refaz tudo em segundos.
