Cortina e claraboia

Cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável e fechamento elétrico da claraboia (2027/28). Vidro não furável: tudo apoia no concreto em volta.

FO6 — CORTINA / CLARABOIA

extraído do caderno de estudo REV. O

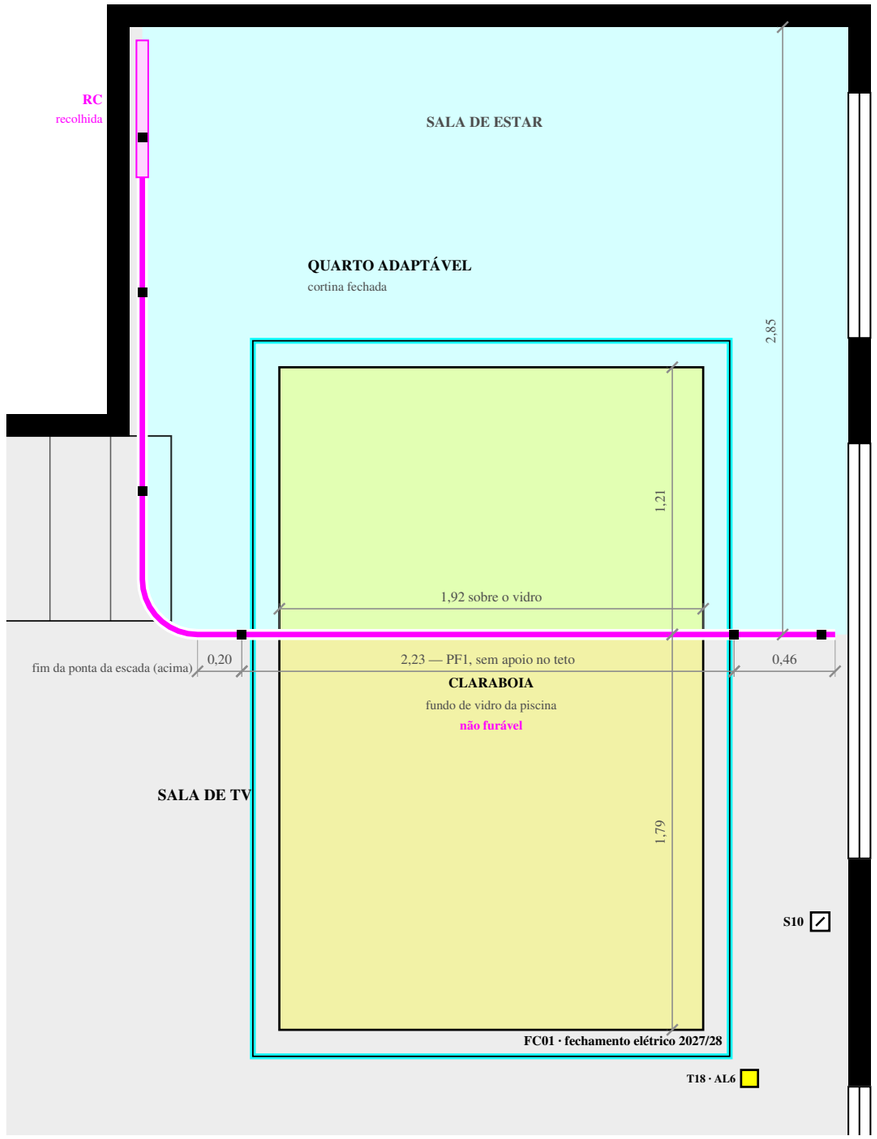

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
CT01	Trilho reto com uma curva: descida 2,44 + curva 0,39 + reta 2,89 m, até a fachada	5,72 m
PF1	Perfil autoportante sob a claraboia, x 5,00 a 7,23 (vidro 1,92 · moldura 2,16)	2,23 m de vão
AP	Apoios no concreto — nunca no vidro nem na faixa da moldura	6 pontos
CT02	Cortina de tecido, pé-direito inteiro — franzido 2×, blackout a definir	~11,4 m de largura
RC	Pacote recolhido no canto noroeste da sala de estar	~0,62 m de trilho
MR1	Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura FC01	10,80 m de perímetro
FC01	2027/28 — fechamento elétrico: moldura, motor e painel	1 conjunto
FC02	2027/28 — ligação na espera T18 e programação do comando S10	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Estrutura em volta da claraboia.**
   O vidro não é furável. Confirmar com engenheiro onde há viga de borda da piscina e onde o concreto admite apoio, antes de marcar qualquer furo.
2. **Medição em obra da linha da cortina.**
   Vira no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte. Medir vidro, ponta da escada e a J02: se tiver montante central, o trilho termina nele.
3. **Espera da claraboia entregue pela elétrica — AL6 (FO3).**
   Caixa T18 fora da moldura, eletroduto aparente e guia até o S10. Antes da pintura.
4. Apoios e perfil autoportante — AP e PF1.
   Somente fora da faixa de 0,12 m em volta do vidro. 2,23 m sem apoio no teto.
5. Pintura da laje concluída antes do trilho.
6. Montagem do trilho CT01.
   Trilho reto junto à parede, passando sobre o degrau; curva só no fim da ponta.
7. Cortina CT02.
   Medir a altura final com o piso pronto; folga de ~1 cm do piso acabado.
8. **2027/28 — fechamento elétrico FC01 e FC02.**
   Moldura na faixa reservada, motor ligado na espera T18, comando S10. Não pode interferir no perfil PF1 que cruza por baixo da claraboia.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ensaios e proteção	Demolição	Preparo de superfícies	**Infraestrutura**	Reconstruções	Piso	Pintura	**Marcenaria e luminárias**

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.
