Iluminação

FO4 — ILUMINAÇÃO

Projeto de iluminação: FAS. Trilhos e luminárias desta folha são só referência de posição; a alimentação é da elétrica (FO3).

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

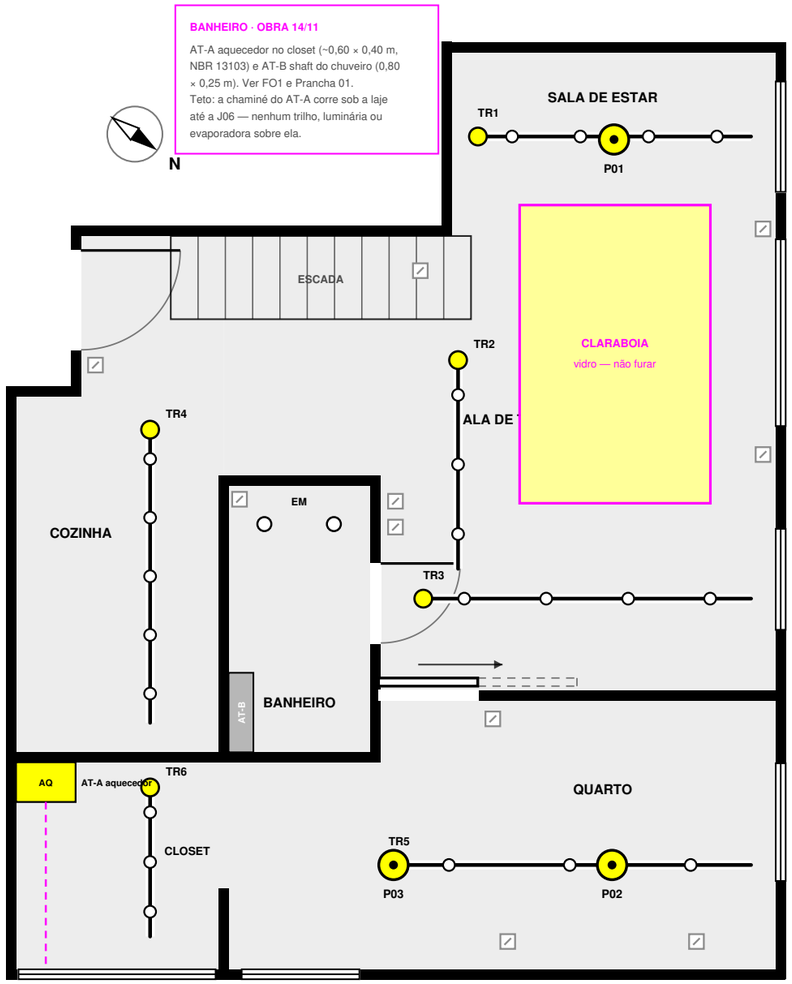

REFERÊNCIA DO ESTUDO — VALEM QUANTIDADES E MODELOS DO PROJETO FAS

ID	Tarefa	Quantidade
TR1	Trilho eletrificado — sala de estar, 4,75 a 7,50 m	2,75 m · 4 spots
TR2	Trilho eletrificado — sala de TV, eixo 4,55 m	2,10 m · 3 spots
TR3	Trilho eletrificado — sala de TV, 4,20 a 7,50 m	3,30 m · 4 spots
TR4	Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m, até 6,85 m	2,95 m · 5 spots
TR5	Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m	3,65 m · 3 spots
TR6	Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m	1,50 m · 3 spots
—	Total de trilho e de spots nos seis trechos	16,25 m · 22 spots
P01	Luminária de destaque — sala de estar, plafon (fica sobre a cama)	1 peça
P02	Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5	1 peça
P03	Luminária de destaque — office, no eixo do TR5	1 peça
EM	Embutido no forro novo do banheiro (R03)	2 peças
CT	Conector, emenda e terminação de trilho	a definir
FX	Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso	a medir

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Projeto de iluminação da FAS recebido e compatibilizado.**
   Trilhos, spots e fluxos desta folha são referência: valem os da FAS.
   Conferir as alimentações AL1 a AL3 (FO3) contra o projeto antes de comprar.
2. **Conferência da laje preparada — P03.**
   A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista.
   Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
3. **Marcação dos eixos no teto.**
   Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
4. **Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**
   Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste, mais 0,12 m em volta para a moldura FC01. Nada fixa ali.
5. Pintura concluída antes de instalar.
   Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
6. Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.
7. Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.
   P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
8. Embutidos do banheiro — EM.
9. Ajuste de foco e entrega.
   Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

ALVO POR AMBIENTE — REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS

Ambiente	Nível	Fluxo alvo	Temperatura
Sala de TV	150 lux	6.975 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.400 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	6.138 lm	3.000 K
Sala de estar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	1.825 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	**8 Marcenaria e luminárias**

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.
