
Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

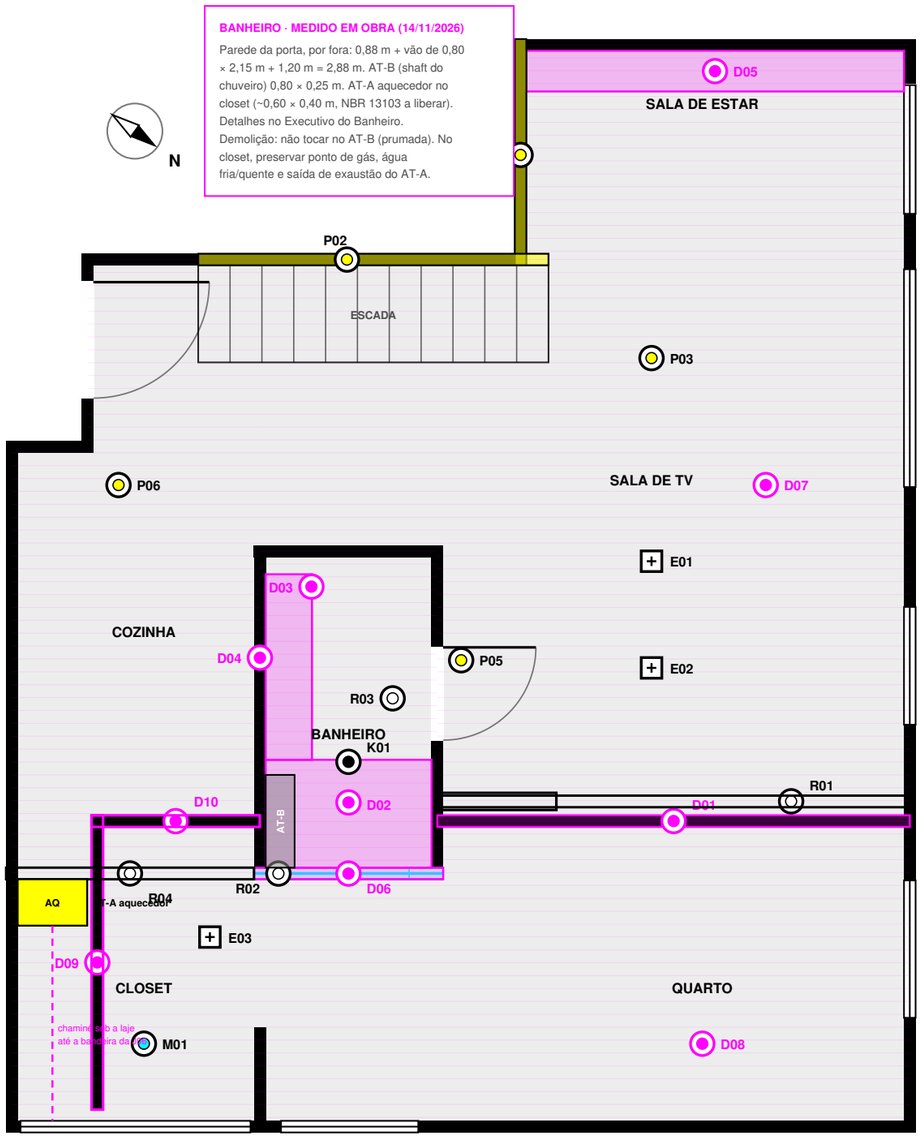

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ensaios e proteção	**Demolição**	**Preparo de superfícies**	Infraestrutura	**Reconstruções**	Piso	Pintura	Marcenaria e luminárias

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	1 ensaio
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	1 ensaio
E03	Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro	2 paredes
M01	Desmontar closet, etiquetar e acondicionar — volta com módulos novos	1 conjunto
D05	Retirar canto alemão da sala de estar	1 conjunto
D07	Retirar forro — 100%, inclusive o do banheiro	60,30 m²
D01	Demolir drywall entre sala de TV e quarto	4,08 m
D02	Demolir fechamento e base do box do banheiro	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Banheiro: revestimento de todas as paredes, bancada, louças e metais	16,70 m² + 1 conj.
D09	Demolir parede interna do closet — somente após E03	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — somente após E03	1,45 m
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m²
D03	Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje	3,80 m²
P01	Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento	1,95 m
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	a confirmar
P04	Demais paredes com revestimento retirado	mapear em obra
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m²
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado	60,30 m²
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única
R01	Reconstruir drywall sala de TV/quarto 0,17 m ao norte, com vão de porta 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 vão
R02	Construir parede de fechamento do fundo do box	1,63 m
R03	Forro novo do banheiro, resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m²
R04	Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste	2,17 m
K01	Vidro do box — proteger até a escolha A/B (FO7)	1 peça

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Ensaios antes de qualquer demolição — E01, E02 e E03.**
   Resultado por escrito. Sem laudo do E03, D09 e D10 não saem.
2. Proteção e canteiro.
   Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
3. Desmontagem — M01 e D05.
   Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão da sala de estar.
4. Forro — D07, 100%.
   Libera a laje e revela a altura livre real.
5. Vedações — D01, D02, D06, D04, D09 e D10.
   Abrir D10 com cautela: confirmar hidráulica ou gás embutido no trecho.
6. Pisos e base — D08 e D03.
   Banheiro desce até a laje.
7. Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.
8. Laje — P03.
   Restauro, descascamento e limpeza.
9. **Reconstruções — R01, R02, R03 e R04.**
   Marcar R04 antes de levantar: face sul do banheiro, em esquadro com a oeste. R01 e R03 fecham só depois da infraestrutura embutida.
10. **Contrapiso e nível — P06 e P05.**
    Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.


Piso

FO2 — PISO


Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

OPÇÃO A · monolítico integral, com banheiro

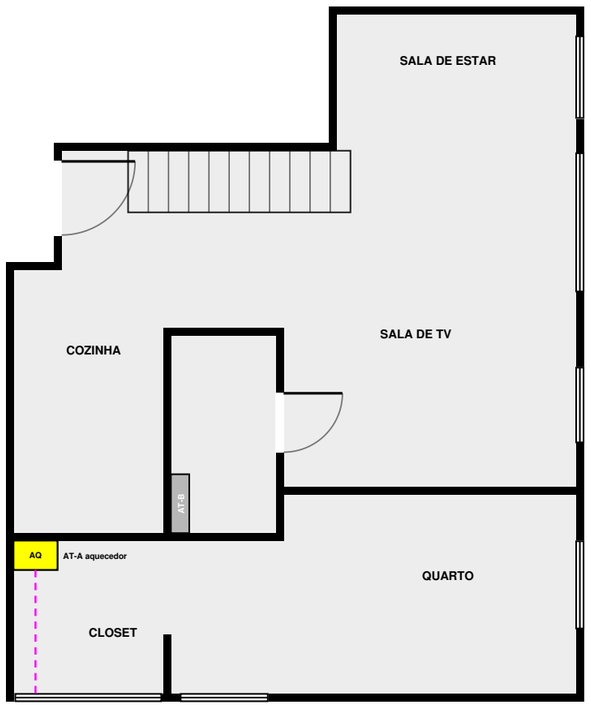

OPÇÃO B · porcelanato acetinado + monolítico

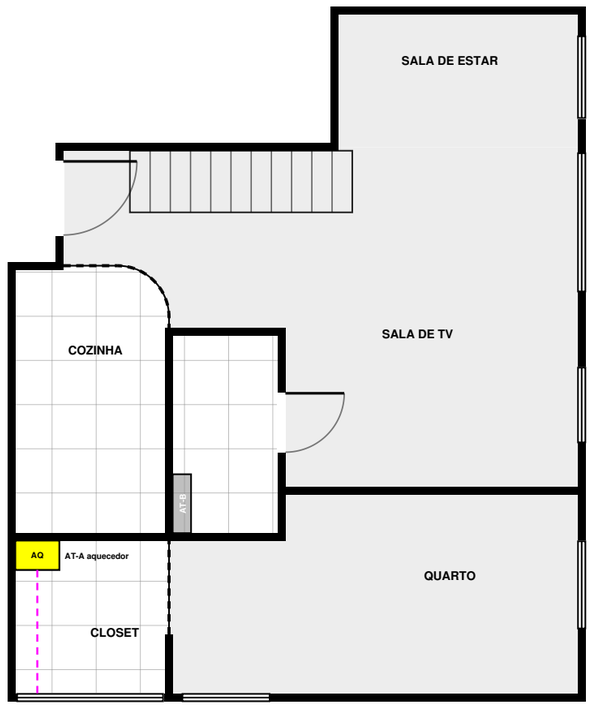

0 1 2 m (base do scan)

Monolítico · Porcelanato acetinado — grade ilustrativa · Junta / soleira

OPÇÃO A — MONOLÍTICO INTEGRAL, COM BANHEIRO E BOX

ID	Tarefa	Quantidade
A1	Monolítico contínuo — sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar, closet e corredor	56,26 m²
A2	Monolítico no banheiro e no box — sistema de área molhada, antiderrapante no box	3,60 m²
A3	Juntas de movimentação conforme projeto; junta na soleira do banheiro	a definir
A4	Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco	—

OPÇÃO B — PORCELANATO ACETINADO NO BANHEIRO, BOX, COZINHA E CLOSET

ID	Tarefa	Quantidade
B1	Monolítico — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor; juntas conforme projeto	44,69 m²
B2	Porcelanato acetinado — cozinha + closet, sem o nicho AT-A	11,57 m²
B3	Porcelanato Confete 100 × 100 — banheiro e box, sem o AT-B; ver executivo do banheiro	3,60 m²
B4	Reserva de 10% sobre B2 + B3 — cortes, perdas e reposição	1,52 m²
B5	Perfil de transição monolítico/porcelanato; filete de 0,70 m na ponta	a medir em obra

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Recebimento do contrapiso.**
   Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).
   Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
2. **Marcação da cota de piso acabado.**
   Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
3. Banheiro — C1 e C2.
   Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
4. Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.
   A: monolítico contínuo, com o banheiro sobre a impermeabilização (A1 a A4).
   B: porcelanato e perfil de transição, depois o monolítico (B1 a B5).
5. Soleiras — C3 e C4.
6. **Cura e proteção.**
   Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
7. Liberação para marcenaria.
   Closet somente após a cura — e com módulos novos: nesta proposta o closet fica 0,45 m mais raso, os módulos antigos não voltam iguais.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

ID	Tarefa	Quantidade
C1	Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento	3,80 m²
C2	Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau	1 conjunto
C3	Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau	1,00 m
C4	Soleira da porta de entrada	1,00 m

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção · 2 Demolição · 3 Preparo de superfícies · 4 Infraestrutura · 5 Reconstruções · **6 Piso** · 7 Pintura · 8 Marcenaria e luminárias

BANHEIRO · MEDIDO EM OBRA (14/11/2026)

Parede da porta, por fora: 0,88 m + vão de 0,80 × 2,15 m + 1,20 m = 2,88 m. AT-B (shaft do chuveiro) 0,80 × 0,25 m. AT-A aquecedor no closet (~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar). Detalhes no Executivo do Banheiro.
Piso não corre sob AT-A nem AT-B: closet 4,14 m² e banheiro 3,60 m² líquidos.


Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Elétrica

FO3 — ELÉTRICA

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

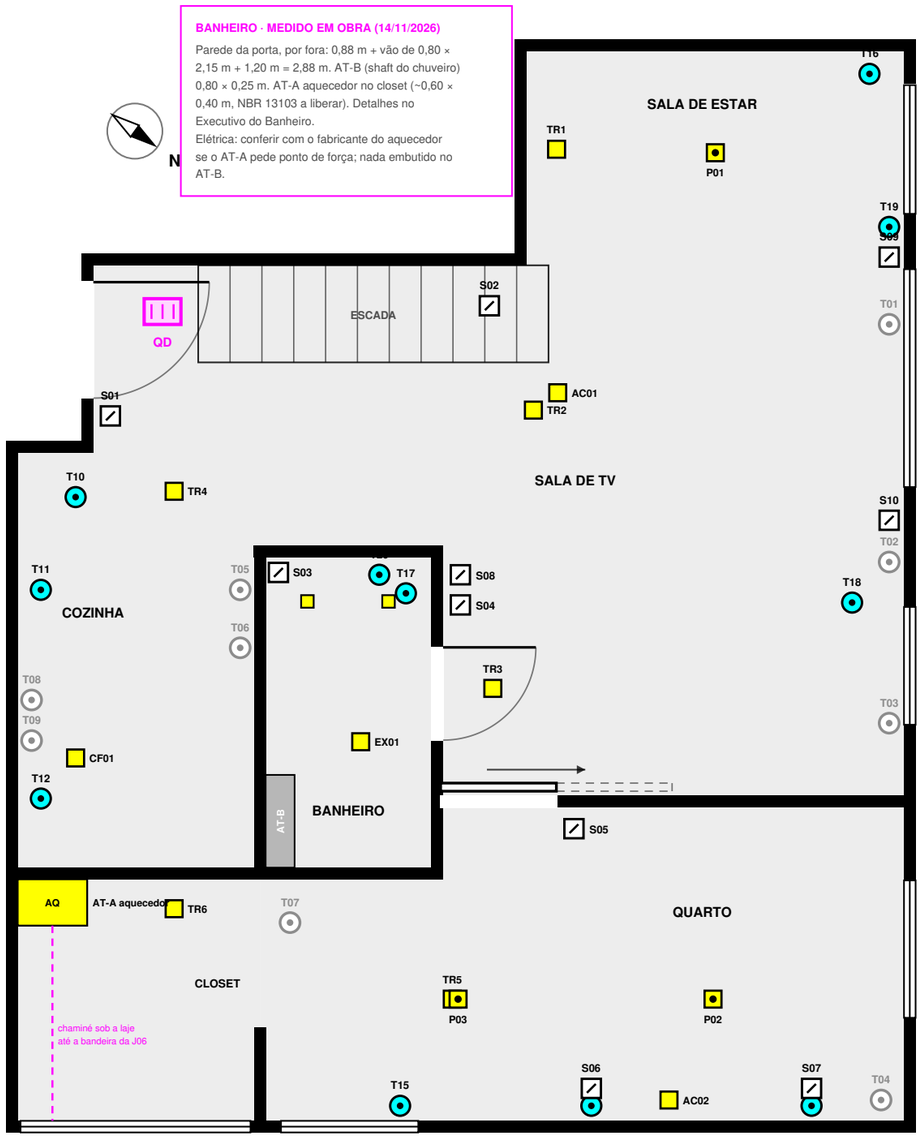

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T20	Tomadas novas; T18 é espera no teto, T20 é o toalheiro acima do vaso	11 pontos
S01–S10	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	10 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
AL1	Alimentação de trilho no teto — posição do projeto FAS (ver FO4)	6 pontos
AL2	Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)	3 pontos
AL3	Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)	2 pontos
AL4	Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)	2 pontos
AL5	Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)	2 pontos
AL6	Espera do motor da claraboia: caixa T18, eletroduto e guia até S10 (ver FO6)	1 ponto
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaios: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Levantamento e ensaio — E02.**
   Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
2. **Estudo de demanda e projeto executivo.**
   Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
3. **Marcação de pontos em obra.**
   Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
4. **Infraestrutura embutida — IN1.**
   Concluir antes de fechar a drywall R01.
5. Infraestrutura aparente no teto — IN2.
   Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
6. **Descidas, caixas e passagem de cabos.**
   Concluir antes do piso.
7. **Entrega das alimentações — AL1 a AL6.**
   Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4), o ar (FO5) e a claraboia (FO6, 2027/28) instalarem sem abrir laje.
8. Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
9. Ensaios — EN.
   Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
10. Ligação final e acabamento de placas.
    Somente após a pintura concluída.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 **Ensaios e proteção**	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 **Infraestrutura**	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias


Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Iluminação

Projeto de iluminação: FAS. Trilhos e luminárias desta folha são só referência de posição; a alimentação é da elétrica (FO3).

FO4 — ILUMINAÇÃO

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

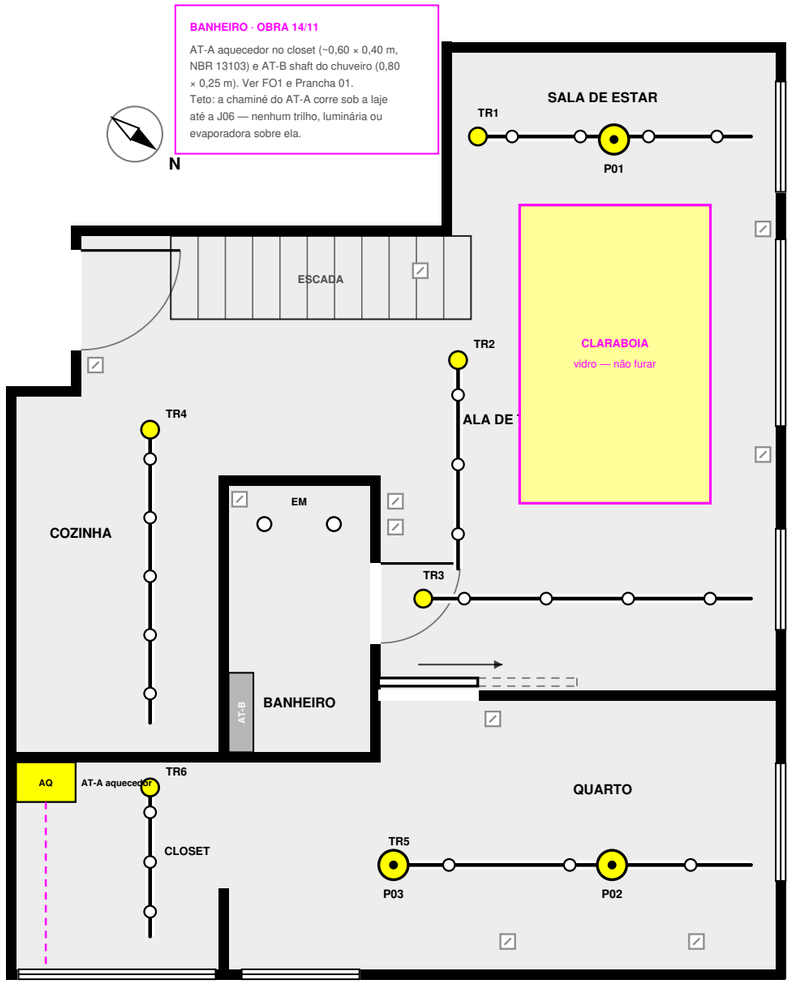

ALVO POR AMBIENTE — REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS

Ambiente	Nível	Fluxo alvo	Temperatura
Sala de TV	150 lux	6.975 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.400 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	6.138 lm	3.000 K
Sala de estar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	1.825 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

REFERÊNCIA DO ESTUDO — VALEM QUANTIDADES E MODELOS DO PROJETO FAS

ID	Tarefa	Quantidade
TR1	Trilho eletrificado — sala de estar, 4,75 a 7,50 m	2,75 m · 4 spots
TR2	Trilho eletrificado — sala de TV, eixo 4,55 m	2,10 m · 3 spots
TR3	Trilho eletrificado — sala de TV, 4,20 a 7,50 m	3,30 m · 4 spots
TR4	Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m, até 6,85 m	2,95 m · 5 spots
TR5	Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m	3,65 m · 3 spots
TR6	Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m	1,50 m · 3 spots
—	Total de trilho e de spots nos seis trechos	16,25 m · 22 spots
P01	Luminária de destaque — sala de estar, plafon (fica sobre a cama)	1 peça
P02	Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5	1 peça
P03	Luminária de destaque — office, no eixo do TR5	1 peça
EM	Embutido no forro novo do banheiro (R03)	2 peças
CT	Conector, emenda e terminação de trilho	a definir
FX	Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso	a medir

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Projeto de iluminação da FAS recebido e compatibilizado.**
   Trilhos, spots e fluxos desta folha são referência: valem os da FAS.
   Conferir as alimentações AL1 a AL3 (FO3) contra o projeto antes de comprar.
2. **Conferência da laje preparada — P03.**
   A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista.
   Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
3. **Marcação dos eixos no teto.**
   Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
4. **Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**
   Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste, mais 0,12 m em volta para a moldura FC01. Nada fixa ali.
5. Pintura concluída antes de instalar.
   Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
6. Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.
7. Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.
   P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
8. Embutidos do banheiro — EM.
9. Ajuste de foco e entrega.
   Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ensaios e proteção	Demolição	Preparo de superfícies	Infraestrutura	Reconstruções	Piso	Pintura	**Marcenaria e luminárias**


Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Ar-condicionado e exaustão

FO5 — AR

Evaporadoras, exaustor e coifa sobre laje aparente, sem forro para dutar. Somente Electrolux. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3).

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

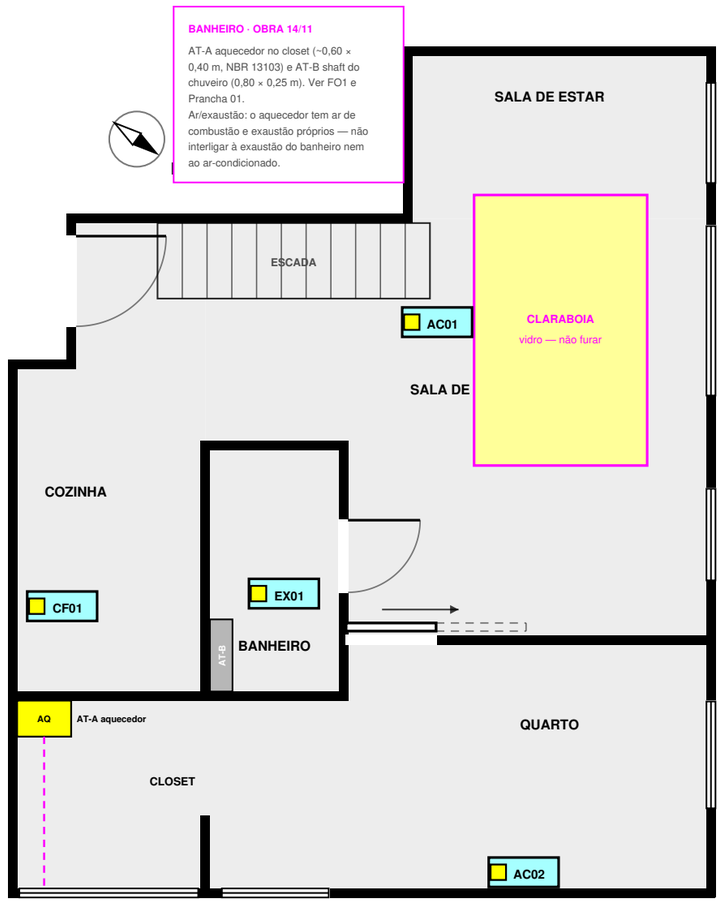

CARGA TÉRMICA — 600 / 800 BTU/h POR m², SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	38,04 m²	22.824 BTU/h	30.432 BTU/h
Quarto + closet	18,46 m²	11.076 BTU/h	14.768 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA DO DUTO

ID	Cálculo de referência	Vazão
EX01	Banheiro — 3,80 m² × 2,40 m × 10 trocas/h	91,2 m³/h
CF01	Cozinha — 9,82 m² × 2,62 m × 12 trocas/h	308,7 m³/h

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
AC01	Evaporadora — social + cozinha (38,04 m²)	1 unidade
AC02	Evaporadora — quarto + closet (18,46 m²)	1 unidade
CD	Condensadora: conferir modelo existente e capacidade real	1 unidade
FG	Linha frigorígena aparente, em calha, isolada	a medir
DR	Dreno aparente, com caimento contínuo até ponto de descarte	a medir
IE	Interligação elétrica entre condensadora e evaporadoras	2 linhas
SU	Suporte de evaporadora fixado na laje ou na parede	2 conjuntos
EX01	Exaustor do banheiro, no forro novo (R03)	1 unidade
DU1	Duto e rota de descarte do exaustor do banheiro	a definir
CF01	Coifa da cozinha — alimentação e fixação	1 unidade
DU2	Duto e rota de descarte da coifa, independente do banheiro	a definir
VF	Vedação e acabamento das passagens de parede e de laje	a medir
CG	Carga de gás, vácuo e teste de estanqueidade da linha	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Conferência da condensadora existente.**
   Modelo, capacidade e número de evaporadoras que admite. Não assumir que a atual aceita duas: se não aceitar, entra no orçamento.
2. **Seleção pela coluna base sol — 30.432 e 14.768 BTU/h, somente Electrolux.**
   A fachada envidraçada é noroeste e pega o sol da tarde. Marca igual não garante compatibilidade: conferir o par no catálogo antes de comprar.
3. Não há forro para dutar, fora do banheiro.
   Evaporadora hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação aparentes, em calha, alinhados às vigas e ao perfilado da elétrica.
4. **Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**
   Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, mais 0,12 m em volta para a moldura do fechamento. Nem equipamento, nem suporte, nem tubulação ali.
5. **Posição definitiva do AC01 em obra — reserva em 4,76 / 3,05 m.**
   Fora da linha da cortina do quarto adaptável e da moldura da claraboia. Confirmar apoio e altura livre na faixa de 2,62 m antes de fixar.
6. Infraestrutura: passagens, calha, frigorígena e dreno — FG, DR, IE.
   Executar após o preparo da laje (P03) e antes da pintura.
7. **Exaustão — EX01 e CF01, com rotas próprias.**
   Uma rota não serve às duas. Validar vazão com a perda de carga do duto e a rota de descarte com o condomínio antes de furar fachada.
8. Recebimento da alimentação elétrica — AL4 e AL5.
   Caixa no ponto e circuito identificado, entregues pela FO3, passo 7.
9. Montagem, vácuo, carga e teste — CG.
   Equipamento entra após a pintura. Entregar com teste de estanqueidade, medição de temperatura e nota de garantia por escrito.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	**4 Infraestrutura**	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	**8 Marcenaria e luminárias**


Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Cortina e claraboia

Cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável e fechamento elétrico da claraboia (2027/28). Vidro não furável: tudo apoia no concreto em volta.

FO6 — CORTINA / CLARABOIA

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

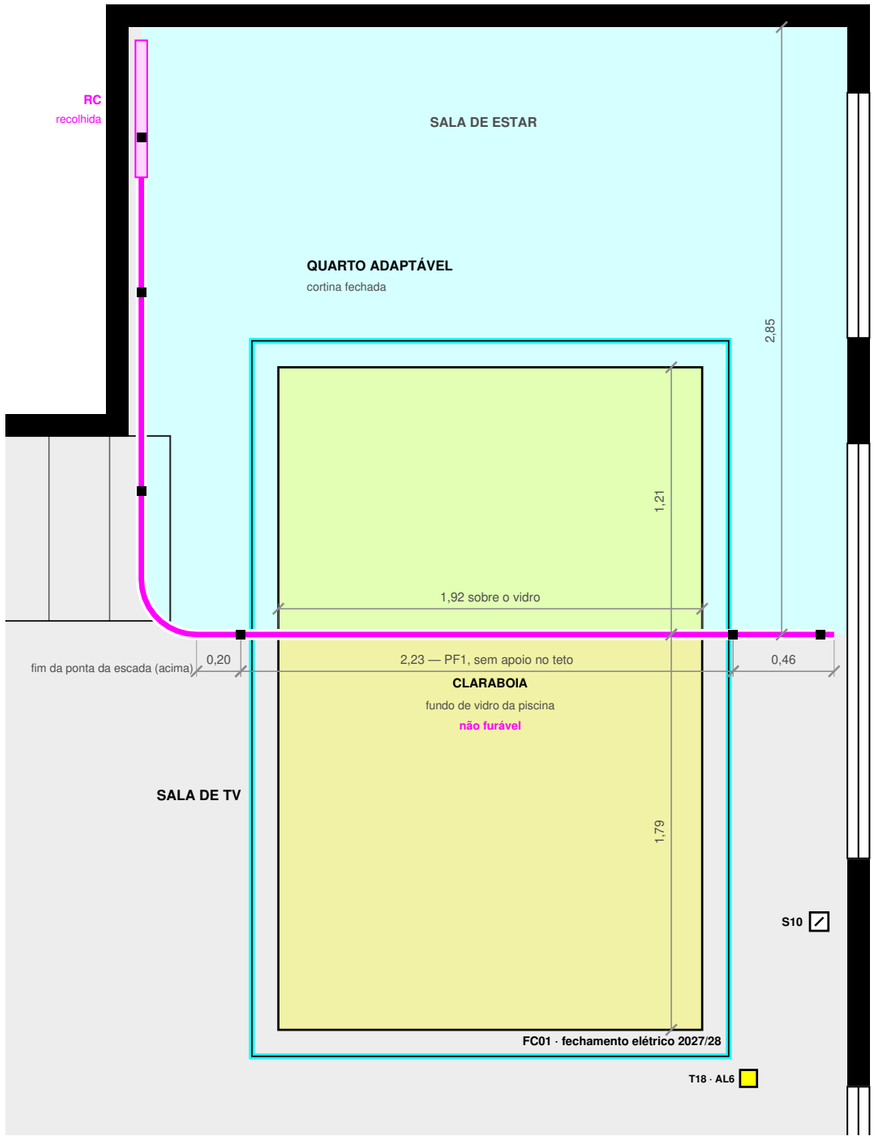

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	**4 Infraestrutura**	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	**8 Marcenaria e luminárias**

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
CT01	Trilho de ponta a ponta: descida 2,44 + curva 0,39 + reta 2,89 m	5,72 m
PF1	Perfil autoportante sob a claraboia, x 5,00 a 7,23 (vidro 1,92 · moldura 2,16)	2,23 m de vão
AP	Apoios no concreto — nunca no vidro nem na faixa da moldura	6 pontos
CT02	Cortina de tecido, pé-direito inteiro — franzido 2×, blackout a definir	~11,4 m de largura
RC	Pacote recolhido no canto noroeste da sala de estar	~0,62 m de trilho
MR1	Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura FC01	10,80 m de perímetro
FC01	2027/28 — fechamento elétrico: moldura, motor e painel	1 conjunto
FC02	2027/28 — ligação na espera T18 e programação do comando S10	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Estrutura em volta da claraboia.**
   O vidro não é furável. Confirmar com engenheiro onde há viga de borda da piscina e onde o concreto admite apoio, antes de marcar qualquer furo.
2. **Medição em obra da linha da cortina.**
   Vira no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte. Medir vidro, ponta da escada e a J02: se tiver montante central, o trilho termina nele.
3. **Espera da claraboia entregue pela elétrica — AL6 (FO3).**
   Caixa T18 fora da moldura, eletroduto aparente e guia até o S10. Antes da pintura.
4. Apoios e perfil autoportante — AP e PF1.
   Somente fora da faixa de 0,12 m em volta do vidro. 2,23 m sem apoio no teto.
5. Pintura da laje concluída antes do trilho.
6. Montagem do trilho CT01.
   Trilho reto junto à parede, passando sobre o degrau; curva só no fim da ponta.
7. Cortina CT02.
   Medir a altura final com o piso pronto; folga de ~1 cm do piso acabado.
8. **2027/28 — fechamento elétrico FC01 e FC02.**
   Moldura na faixa reservada, motor ligado na espera T18, comando S10.
   Não pode interferir no perfil PF1 que cruza por baixo da claraboia.

BANHEIRO · MEDIDO EM OBRA (14/11/2026)

Parede da porta, por fora: 0,88 m + vão de 0,80 × 2,15 m + 1,20 m = 2,88 m. AT-B (shaft do chuveiro) 0,80 × 0,25 m. AT-A aquecedor no closet (~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar).
Detalhes no Executivo do Banheiro.


Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Pedras, vidro do box e portas

Medidas adiantadas para orçamento: bancadas da cozinha e do banheiro, as duas propostas do vidro do box e as portas P01 a P03.


FO7 — PEDRAS / VIDRO / PORTAS

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

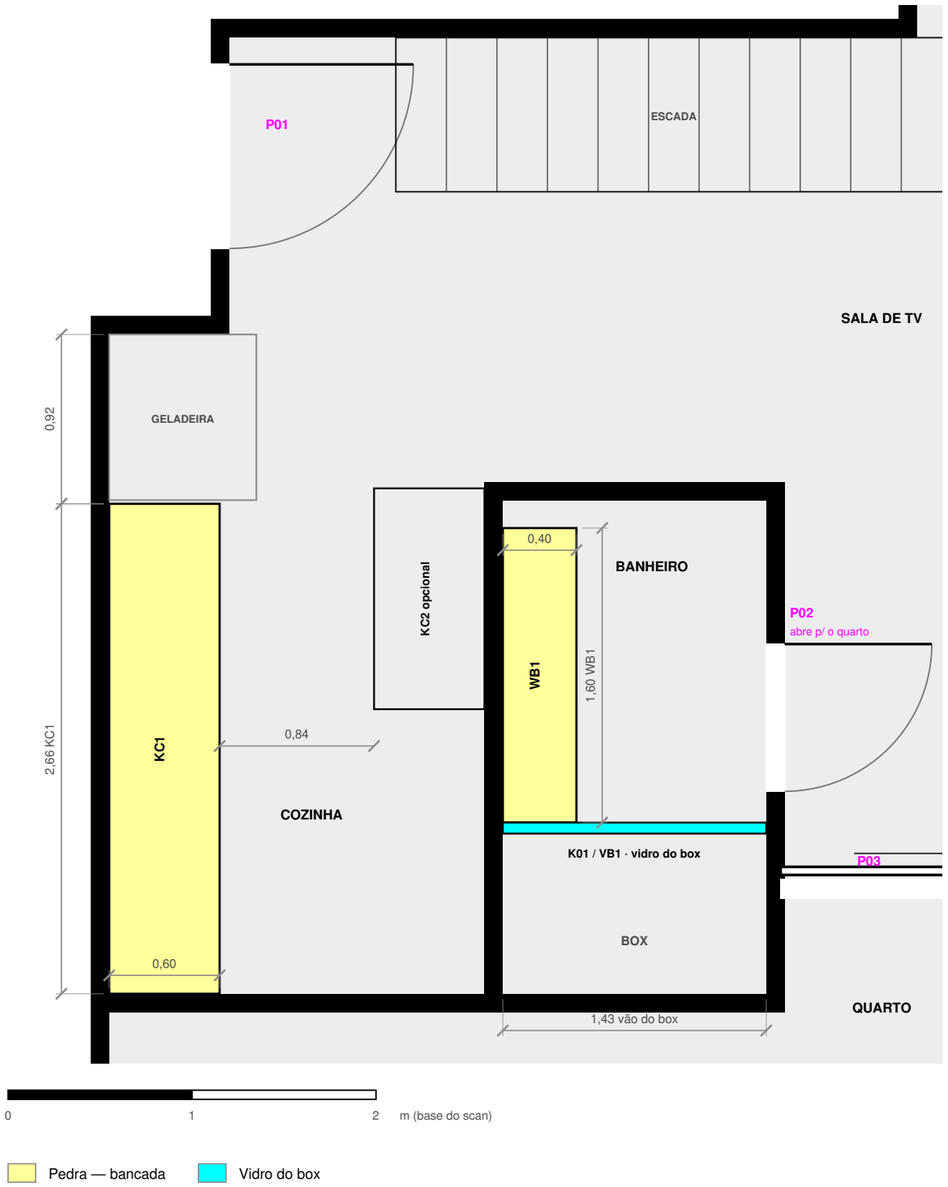


VISTAS


A · K01 mantido
altura a medir



B · VB1 novo
fixo + porta



P02 · banheiro
vista da sala de TV



PEDRAS — COZINHA E BANHEIRO

ID	Tarefa	Medida
KC1	Bancada da cozinha, parede oeste, do nicho da geladeira à parede nova R04 — pedra 2 cm	2,66 × 0,60 m
KC1f	Frontão 10 cm na parede oeste e na lateral da geladeira	~3,26 m
KC1r	Recortes na KC1: cuba e cooktop — modelos definidos antes do gabarito	2 recortes
KC2	OPCIONAL — bancada na parede leste, junto a T05/T06; sobra 0,84 m de passagem	~1,20 × 0,60 m
WB1	Bancada do banheiro sobre o gabinete (0,88 m), saia de 10 cm, topo a 0,98 m — ver executivo	1,60 × 0,40 m
WB1f	Saia frontal de 10 cm; sem frontão (material: executivo do banheiro)	1,60 m
WB1r	Recorte da cuba — inventário 0,60 × 0,50: na bancada de 0,40 só apoio ou semiencaixe	1 recorte

VIDRO DO BOX — DUAS PROPOSTAS (A OU B)

ID	Tarefa	Medida
A	K01 — manter o vidro atual, proteger durante a obra	1,43 × ~2,10 m
A1	Conferir altura real, ferragens e vedação; trocar só borrachas e silicone	1 conjunto
B	VB1 — vidro novo, temperado 8 mm incolor, do piso acabado a 2,00 m	1,40 × 2,00 m
B1	Painel fixo, lado oeste (encontro com a WB1), perfil U no piso e na parede	0,69 × 2,00 m
B2	Porta de giro, lado leste, abre para fora do box; dobradiça de vidro na parede	0,69 × 2,00 m

PORTAS

ID	Tarefa	Medida
P01	Entrada — existente, sem alteração	1,00 × 2,29 m
P02	Banheiro — abre para fora em sentido anti-horário; vão a 0,88 m do canto norte	0,80 × 2,15 m
P02a	Dobradiças no batente norte; fechadura ao sul — empurra com a direita, puxa com a esquerda	1 conjunto
P03	Quarto / sala de TV — nova, de correr, trilho aparente; folha estaciona a leste, pela face da sala de TV	vão 1,00 × 2,29 m

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Decidir antes do revestimento: box A (K01) ou B (VB1).**
   B pede perfis e reforço na parede R02 antes de revestir.
2. **Modelos de cuba, cooktop e metais definidos.**
   Sem modelo não há gabarito nem recorte.
3. **Medição final e gabarito em obra — KC1, KC2 e WB1.**
   Com as paredes revestidas; as medidas desta folha são para orçamento.
4. Pedras assentadas depois da pintura; frontões por último.
5. Vidro do box — medir o vão com o revestimento pronto.
   Desconta revestimento e folgas de 5 mm; altura a partir do piso acabado.
6. Portas — P02 com giro invertido e P03 de correr.
   P03 só depois da laje pintada; deixar livre o trecho de parede a leste.

BANHEIRO · MEDIDO EM OBRA (14/11/2026)

Parede da porta, por fora: 0,88 m + vão de 0,80 × 2,15 m + 1,20 m = 2,88 m. AT-B (shaft do chuveiro) 0,80 × 0,25 m. AT-A aquecedor no closet (~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar).
Detalhes no Executivo do Banheiro.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	**5 Reconstruções**	6 Piso	7 Pintura	**8 Marcenaria e luminárias**

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.

Programação da obra

FO8 — PROGRAMAÇÃO

Em que fase cada fornecedor entra, quando volta e qual decisão precisa estar fechada antes. Durações: cada contratada preenche as suas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. T

FORNECEDOR	FOLHA	1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso e revestimentos	7 Pintura	8 Acabamentos e equipamentos	9 2027/28 claraboia
Empreiteira — demolição e obra civil	FO1	proteção · ensaios E01, E02 e E03	forro, pisos, banheiro e D09/D10	laje P03 e paredes P01–P04		R01 · R02 · forro R03 · parede R04	contrapiso P06 · cota P05			
Hidráulica do banheiro	—	ensaio de estanqueidade E01			pontos novos: cuba, bacia, ducha, ralo				louças e metais	
Elétrica	FO3	isolamento E02			eletrodutos, quadro, esperas AL e T18				tomadas, comandos e testes	
Ar-condicionado e exaustão	FO5				frigorígena, dreno e duto do EX01				evaporadoras e exaustor	
Iluminação — projeto FAS	FO4				projeto FAS e esperas	embutidos no forro novo R03			trilhos e luminárias	
Banheiro — impermeabilização e revestimento	FO2					impermeabilização e caimento C1–C2	piso e paredes até 2,40 m			
Piso da casa	FO2						opção A (monolítico integral) ou B (porcelanato + monolítico)			
Pintura	—							laje, paredes e forro R03		
Marmoraria — bancadas KC1, KC2, WB1	FO7						gabarito com paredes revestidas		assentar pedras e frontões	
Vidraçaria — box	FO7					se B: perfis na parede R02	medir vão revestido		instalar K01 (A) ou VB1 (B)	
Portas P02 e P03	FO7					vão de 1,00 m na drywall R01			trilho P03 · giro novo da P02	
Cortina e claraboia	FO6			apoios no concreto confirmados	espera T18 e comando S10	apoios e perfil PF1			trilho CT01 e cortina CT02	
Marcenaria — closet	FO1		desmontar M01 · medir o closet novo						closet com módulos novos	
Fechamento elétrico da claraboia	FO6									FC01 e FC02 na espera T18

DECISÕES QUE LIBERAM A FASE
fechadas antes de a fase começar

- **Laudos E01/E02 e E03:** instalações e paredes cozinha/closet
- **Engenheiro (claraboia)** e laudo NBR 13103 do aquecedor AT-A
- **Box A (K01) ou** B (VB1 de 2,00 m)
- **Piso A ou B · cuba,** cooktop e metais
- **Luminárias (FAS),** tecido da cortina e louças

Entrada do fornecedor · Retorno à obra · 2027/28 — fora desta obra · Decisão que libera a fase

Ninguém entra antes de a fase anterior entregar a frente limpa. Pedras e vidro medem sobre o revestimento pronto; trilhos, portas e luminárias só depois da pintura.
O banheiro é o caminho crítico: hidráulica, forro novo R03, impermeabilização, revestimento e, por último, pedra, vidro, louças e metais.

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.
