# Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

**FO3 — ELÉTRICA**

extraído do Caderno Alternativo A — REV. R

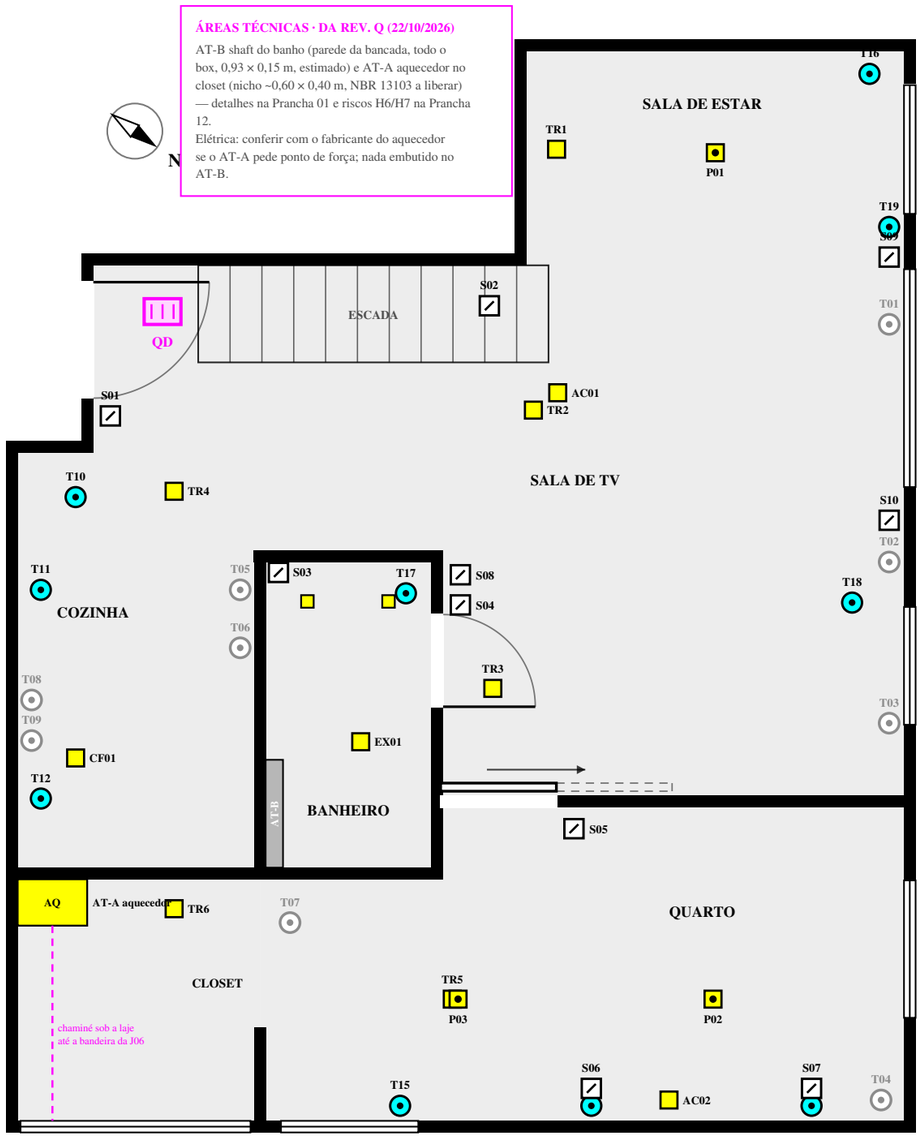


## ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID | Tarefa | Quantidade |
|---|---|---|
| **QD** | Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir | 1 conjunto |
| **T01–T09** | Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito | 9 pontos |
| **T10–T19** | Tomadas novas, T18 é espera no teto | 10 pontos |
| **S01–S10** | Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira | 10 pontos |
| **IN1** | Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01 | 4,08 m |
| **IN2** | Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada | a medir |
| **IN3** | Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa | 5 circuitos |
| **AL1** | Alimentação de trilho no teto — posição do projeto FAS (ver FO4) | 6 pontos |
| **AL2** | Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4) | 3 pontos |
| **AL3** | Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4) | 2 pontos |
| **AL4** | Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5) | 2 pontos |
| **AL5** | Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5) | 2 pontos |
| **AL6** | Espera do motor da claraboia: caixa T18, eletroduto e guia até S10 (ver FO6) | 1 ponto |
| **PR** | Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico | 1 conjunto |
| **AT** | Aterramento e equipotencialização | 1 conjunto |
| **EN** | Ensaios: continuidade, isolamento, DR e aterramento | 1 conjunto |

## ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Levantamento e ensaio — E02.**
   Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
2. **Estudo de demanda e projeto executivo.**
   Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
3. **Marcação de pontos em obra.**
   Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
4. **Infraestrutura embutida — IN1.**
   Concluir antes de fechar a drywall R01.
5. Infraestrutura aparente no teto — IN2.
   Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
6. **Descidas, caixas e passagem de cabos.**
   Concluir antes do piso.
7. **Entrega das alimentações — AL1 a AL6.**
   Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4), o ar (FO5) e a claraboia (FO6, 2027/28) instalarem sem abrir laje.
8. Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
9. Ensaios — EN.
   Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
10. Ligação final e acabamento de placas.
    Somente após a pintura concluída.

## SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ensaios e proteção** | Demolição | Preparo de superfícies | **Infraestrutura** | Reconstruções | Piso | Pintura | Marcenaria e luminárias |

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.
