# Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

**estado existente: o que sai, o que se prepara**

demolir e reconstruir são serviços separados

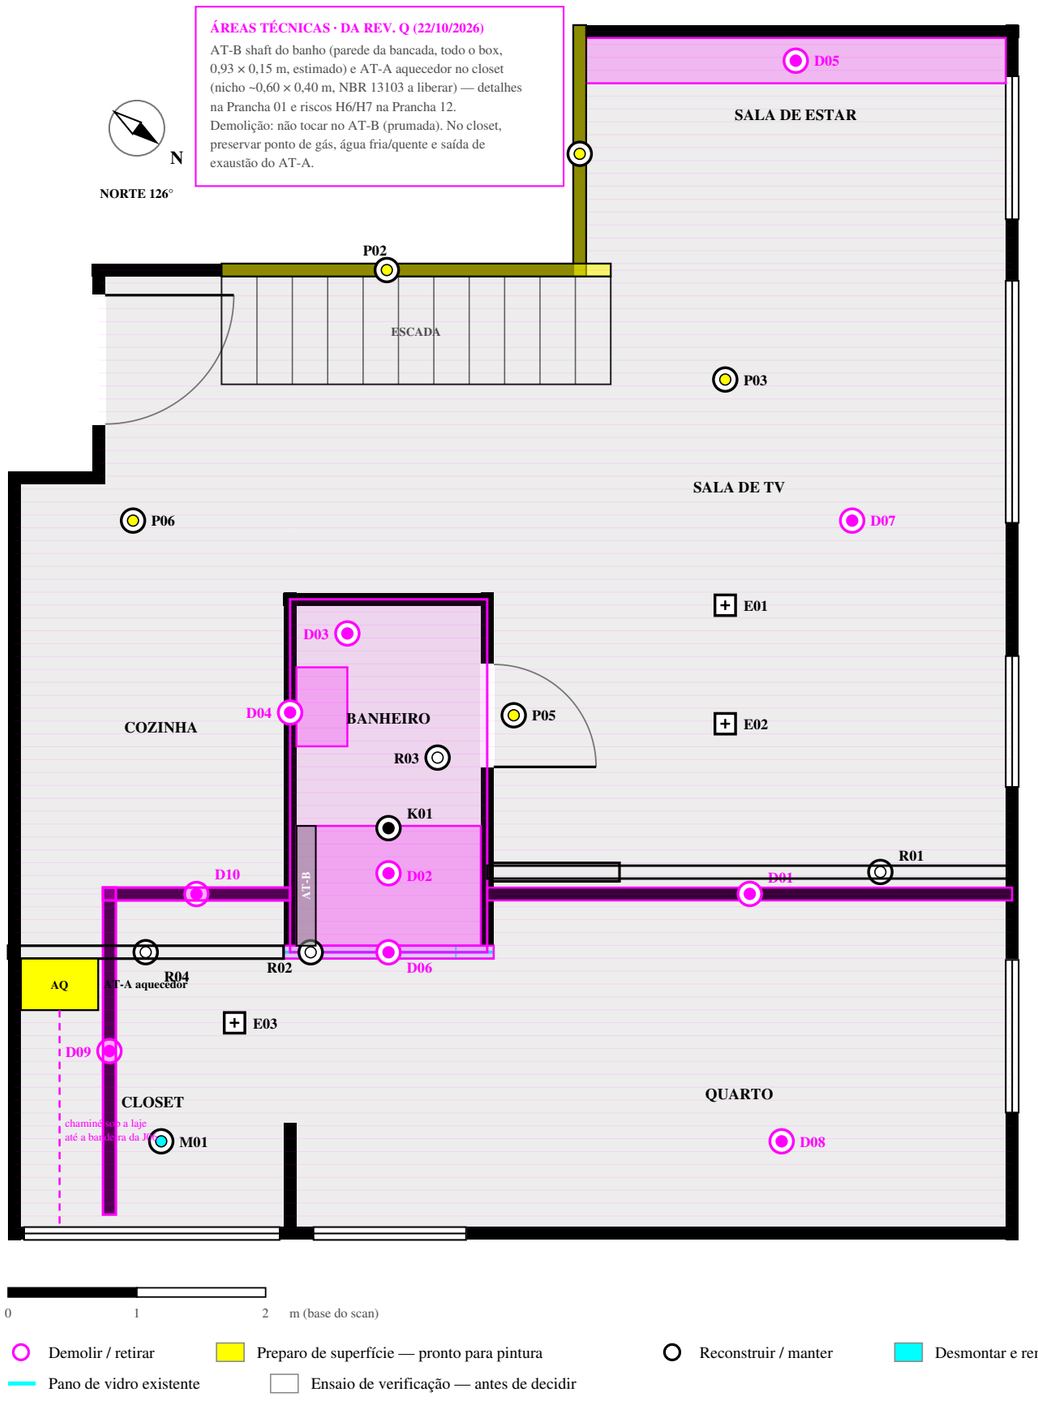


ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

| ID | Serviço | Quantidade preliminar |
|---|---|---|
| **D01** | Drywall entre sala de TV e quarto | 1 trecho — 4,08 m |
| **D02** | Box do banheiro: fechamento e base | 1 conjunto |
| **D03** | Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo | 3,80 m² — descer até a laje |
| **D04** | Banheiro: revestimento de todas as paredes, bancada, cuba, louças e metais | 16,70 m² de parede + 1 conj. |
| **D09** | Parede interna do closet — só depois do E03 | 2,54 m |
| **D10** | Parede cozinha/closet, trecho existente — só depois do E03 | 1,45 m |
| **D05** | Canto alemão da sala de estar | 1 conjunto — inventário por módulo |
| **D06** | Pano de vidro chão-teto do fundo do box | 1,63 m, ponta a ponta |
| **D07** | Forro: retirar 100%, inclusive o do banheiro | 60,30 m² — fora do banheiro, laje aparente |
| **D08** | Retirar pisos do MainFloor | 60,30 m² úteis, sem dupla contagem |
| **P01** | Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento | 1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura |
| **P02** | Parede sob a escada: retirar revestimento | trecho a confirmar — preparo p/ pintura |
| **P03** | Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar | 60,30 m² — acabamento a definir |
| **P04** | Demais paredes com revestimento retirado | preparo p/ pintura — mapear em obra |
| **P05** | Nivelar o banheiro com o piso da casa | cota única — soleira sem degrau |
| **P06** | Regularizar e lixar todo o contrapiso | 60,30 m² — plano e nivelado |
| **R01** | Nova drywall sala de TV/quarto, 0,17 m ao norte, com porta de correr | 4,08 m + 1 porta |
| **R02** | Nova parede de fechamento do box | 1,63 m, no lugar do vidro |
| **R03** | Forro novo do banheiro, resistente à umidade, a 2,40 m | 3,80 m² — embutidos e exaustor |
| **R04** | Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste | 2,17 m · 2 faces |
| **M01** | Desmontar o closet; volta com módulos novos (0,45 m mais raso) | 1 conjunto — inventário |
| **K01** | Vidro do box — manter (A) ou trocar (B): ver FO7 | 1 peça |
| **E01** | Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica | antes de decidir a troca |
| **E02** | Medição de resistência de isolamento na elétrica | megômetro — antes de decidir |
| **E03** | Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro | antes de D09 e D10 |

**Esta planta mostra o estado existente.**
Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para o quarto — está nas Pranchas 03 a 08.

**Demolir para refazer, não só demolir.**
A drywall sala de TV/quarto cai e volta 0,17 m ao norte (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

**Banheiro: reforma completa — paredes, piso e teto (REV. O).**
Sai tudo até o osso: revestimento das quatro paredes, bancada, louças e metais (D04), box (D02), piso e base até a laje (D03) e o forro (D07), que volta novo (R03) a 2,40 m com embutidos e exaustor. O piso renasce na cota da casa (P05): soleira sem degrau, contenção no ralo linear.

**Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).**
Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

**Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.**
Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

**Alternativo A: a parede cozinha/closet desce 0,45 m (D09, D10 e R04).**
Sem projeto estrutural do edifício: o ensaio E03, com engenheiro, vem antes de demolir. Abrir a D10 com cautela (hidráulica ou gás embutido). O closet fica 0,45 m mais raso: M01 volta com módulos novos, não os mesmos remontados.

**Ensaios antes de decidir (E01, E02 e E03).**
Estanqueidade na hidráulica, isolamento na elétrica e estrutura das paredes cozinha/closet. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição.
Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.
