


Demolição e construção

Sequência de execução desta alteração — orientação de escopo, não laudo.

7 passos · 2 paradas

ver Prancha 04 para os riscos

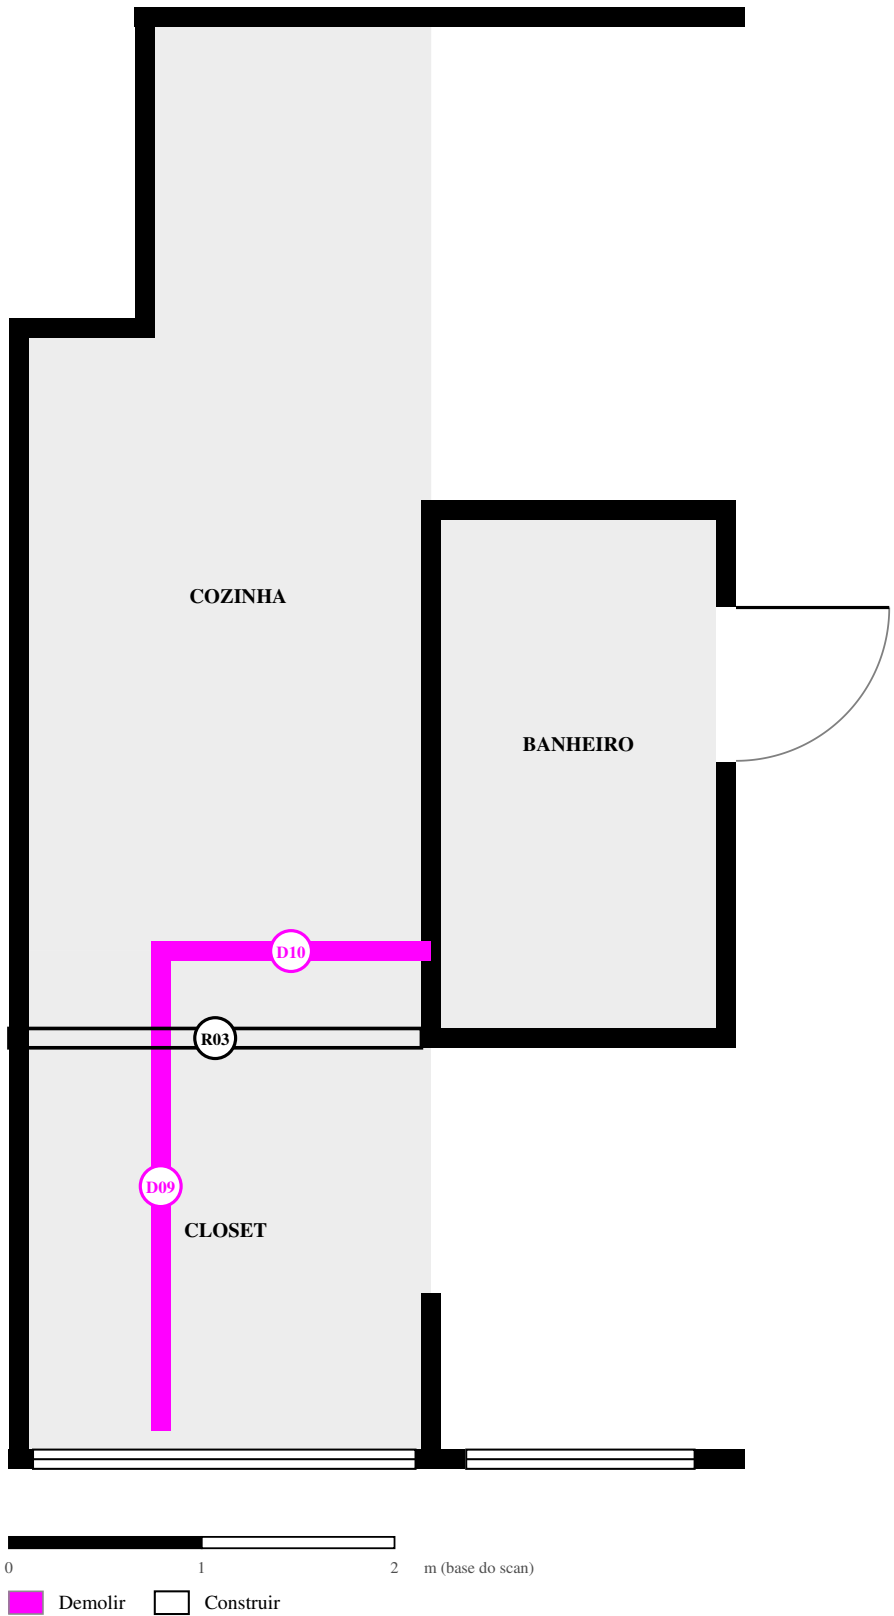

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Ensaio estrutural — E03.**
Confirmar com engenheiro que as duas paredes não têm função estrutural antes de qualquer demolição. Não há projeto estrutural do edifício disponível nesta emissão — orientação de escopo, não laudo.
- 2 Verificar interferências ocultas.**
A parede antiga corre junto à cozinha: confirmar se há hidráulica ou gás embutidos no trecho antes de abrir. Nenhum ponto elétrico documentado nesta faixa além de T12, que fica mais afastado com a mudança.
- 3 Demolição — D09 e D10.**
A parede interna do closet (D09) e o trecho cozinha/closet (D10).
- 4 PARADA — Marcação da nova parede antes de levantar.**
Conferir o alinhamento com a face sul do banheiro e o esquadro contra a parede externa oeste. Uma vez levantada, o erro custa desmontar.
- 5 Construção — R03.**
Mesma espessura das demais paredes internas, 0,10 m. Confirmar material (drywall ou alvenaria) pelo que for encontrado nas paredes vizinhas.
- 6 Revestimento e pintura — P08, nas duas faces.**
- 7 Entrega com nível e esquadro conferidos.**
Não iniciar armário novo do closet (M01) sem essa conferência.

Nada aqui é laudo estrutural.

Sem acesso ao projeto estrutural do edifício, a leitura desta alteração é visual, sobre o scan. O ensaio E03 é o que transforma essa leitura em decisão segura — não pular esse passo por parecer óbvio.
