


Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados

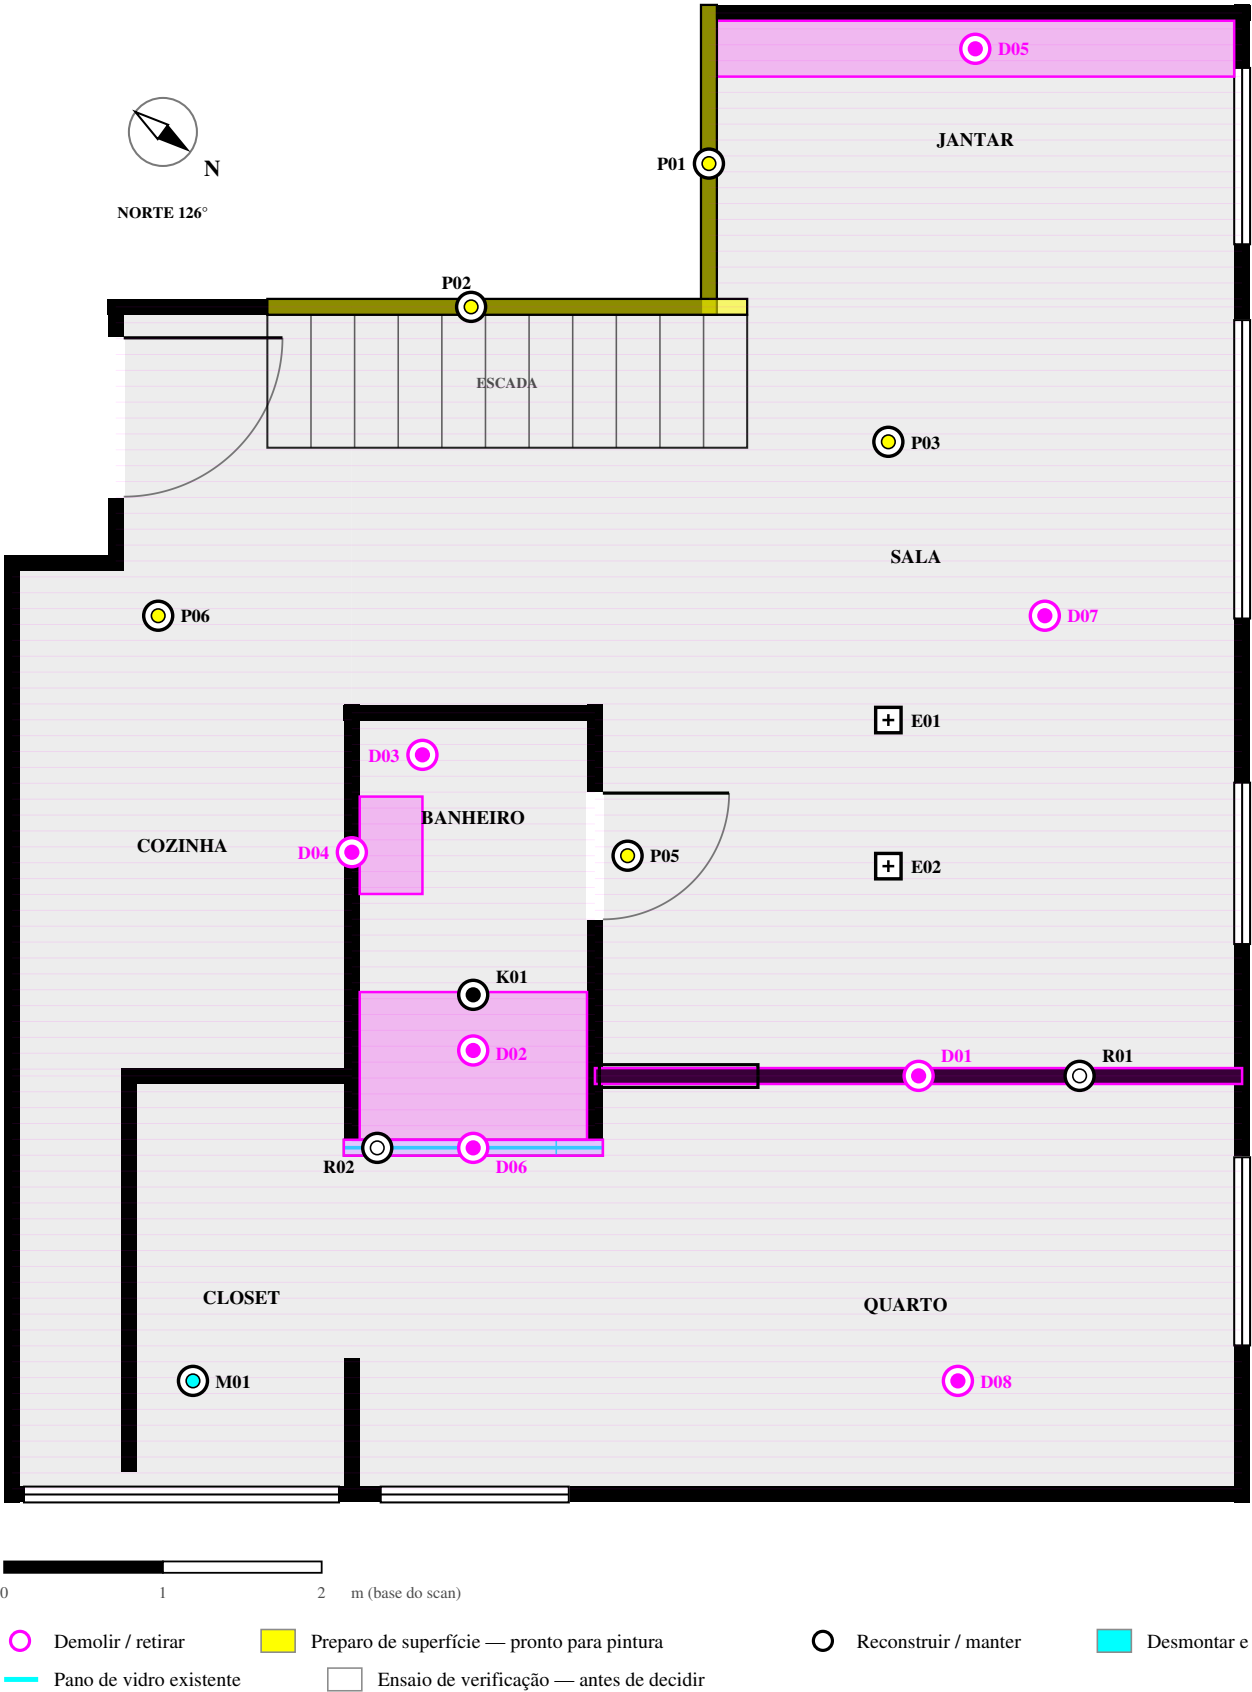

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo	3,80 m² — descer até a laje
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
P05	Nivelar o banheiro com o piso da casa	cota única — soleira sem degrau
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso	60,30 m² — plano e nivelado
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta de correr 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	antes de decidir a troca
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	megômetro — antes de decidir

Esta planta mostra o estado existente.

Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para a escada — está nas Pranchas 03 a 06.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e volta (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

Banheiro: reforma integral, e agora no nível da casa.

Saem piso, revestimentos, box e a parede atrás do espelho. A base desce até a laje (D03) para o banheiro nascer na cota do piso seco (P05) — soleira sem degrau, o que joga a contenção de água para dentro do box: ralo linear, caimento e fecho de vidro fazem o serviço que o degrau fazia.

Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).

Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.

Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

A laje inteira é serviço, não sobra da demolição (P03).

Restauro, descascamento e limpeza dos 60,30 m², com o acabamento definido com a empreiteira.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.

Dois ensaios antes de decidir a troca de hidráulica e elétrica (E01 e E02).

Estanqueidade por pressão na hidráulica e resistência de isolamento com megômetro na elétrica: custam pouco e dizem a condição real da instalação, em vez da idade. Com 17 anos de imóvel e a obra abrindo piso, forro e paredes, é a janela. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição. Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.
