


Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo e reconstruções, com a parede cozinha/closet da proposta alternativa (D09, D10, R03). Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do Caderno Alternativo A

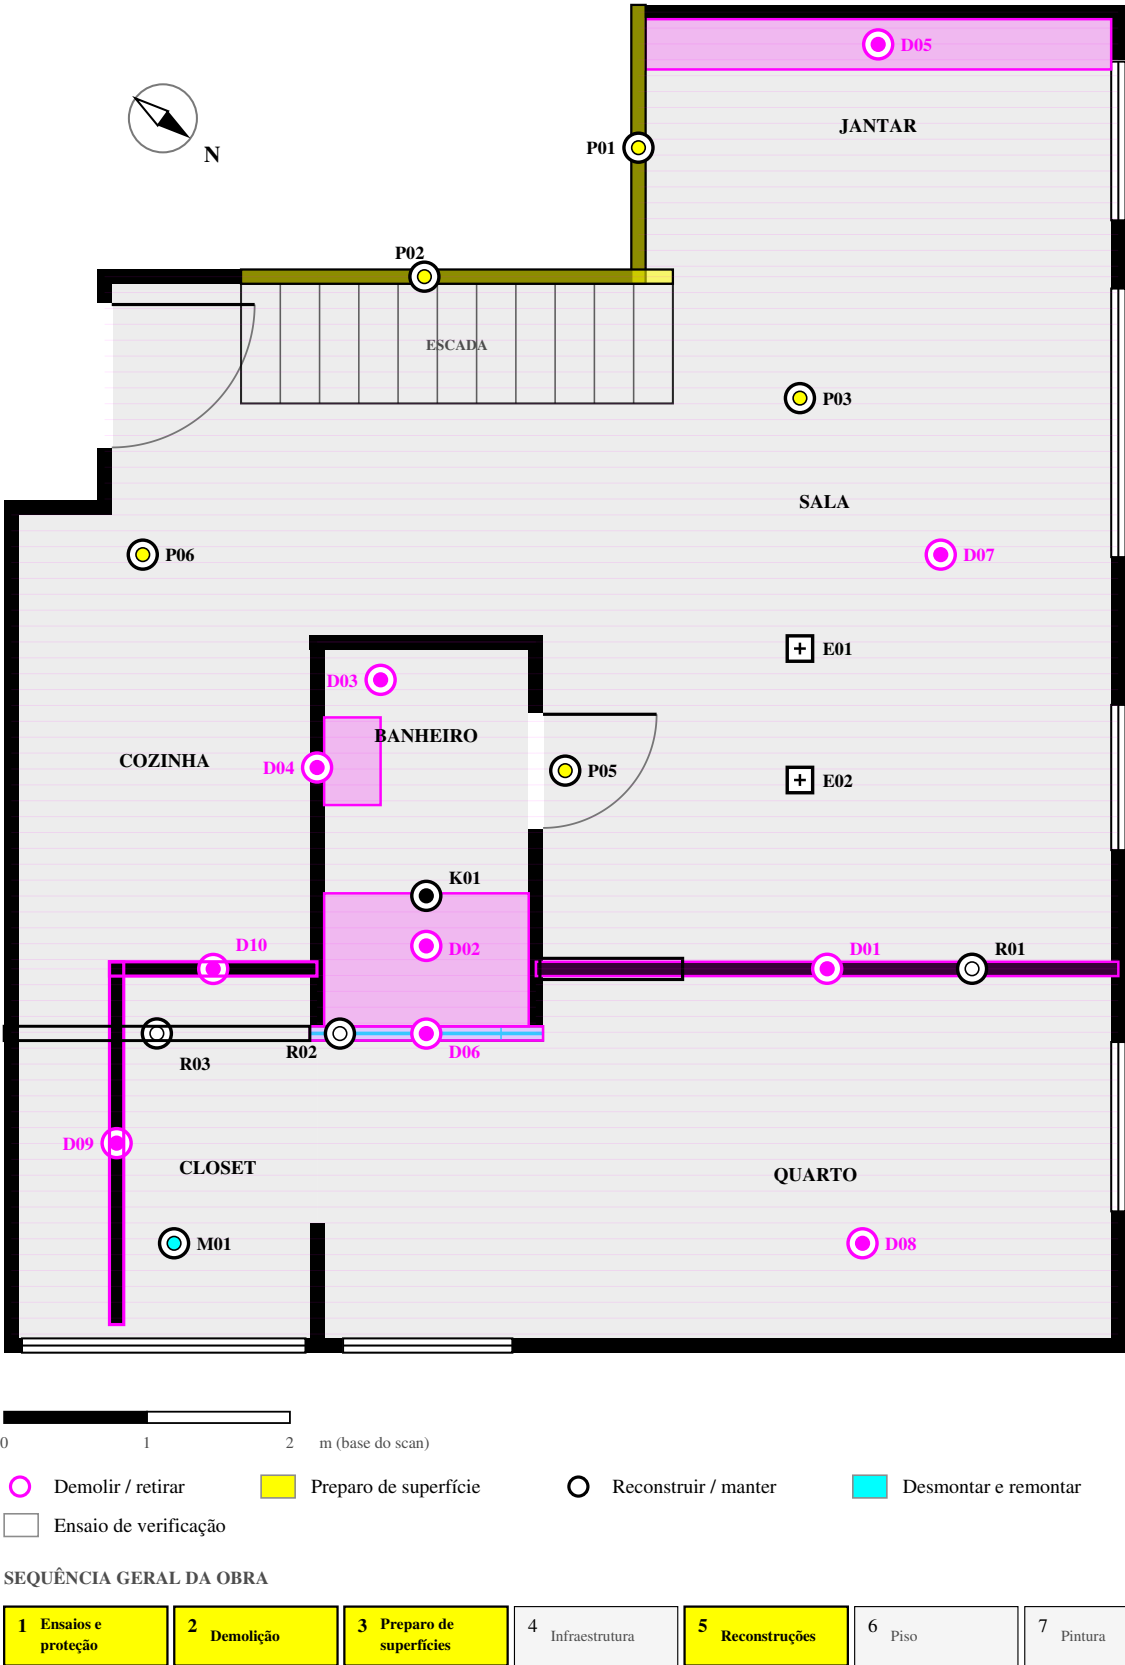

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	1 ensaio
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	1 ensaio
E03	Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro	2 paredes
M01	Desmontar closet, etiquetar módulos e ferragens, acondicionar	1 conjunto
D05	Retirar canto alemão do jantar	1 conjunto
D07	Retirar forro — 100%	60,30 m²
D01	Demolir drywall entre sala e quarto	4,08 m
D02	Demolir fechamento e base do box do banheiro	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Demolir parede atrás do espelho e da bancada do banheiro	2,64 m a conferir
D09	Demolir parede interna do closet — somente após E03	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — somente após E03	1,45 m
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m²
D03	Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje	3,80 m²
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1,95 m
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	a confirmar
P04	Demais paredes com revestimento retirado	mapear em obra
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m²
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado	60,30 m²
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única
R01	Reconstruir drywall sala/quarto com vão de porta 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 vão
R02	Construir parede de fechamento do fundo do box	1,63 m
R03	Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste	2,17 m
K01	Vidro do box — MANTER e proteger	1 peça

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Ensaios antes de qualquer demolição — E01, E02 e E03.**
Resultado por escrito. Sem laudo do E03, D09 e D10 não saem.
- Proteção e canteiro.
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos; entulho e horário do condomínio.
- Desmontagem — M01 e D05.
- Forro — D07, 100%.
- Vedações — D01, D02, D06, D04, D09 e D10.
Abrir D10 com cautela: confirmar hidráulica ou gás embutido no trecho.
- Pisos e base — D08 e D03. Banheiro desce até a laje.
- Revestimentos de parede — P01, P02 e P04. Laje — P03.
- Marcação da parede nova R03 antes de levantar.**
Alinhada à face sul do banheiro, em esquadro com a parede oeste.
- Reconstruções — R01, R02 e R03.**
R01 fecha somente após a infraestrutura elétrica embutida.
- Contrapiso e nível — P06 e P05.**
Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.
