


Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

estado existente: o que sai, o que se prepara

demolir e reconstruir são serviços separados

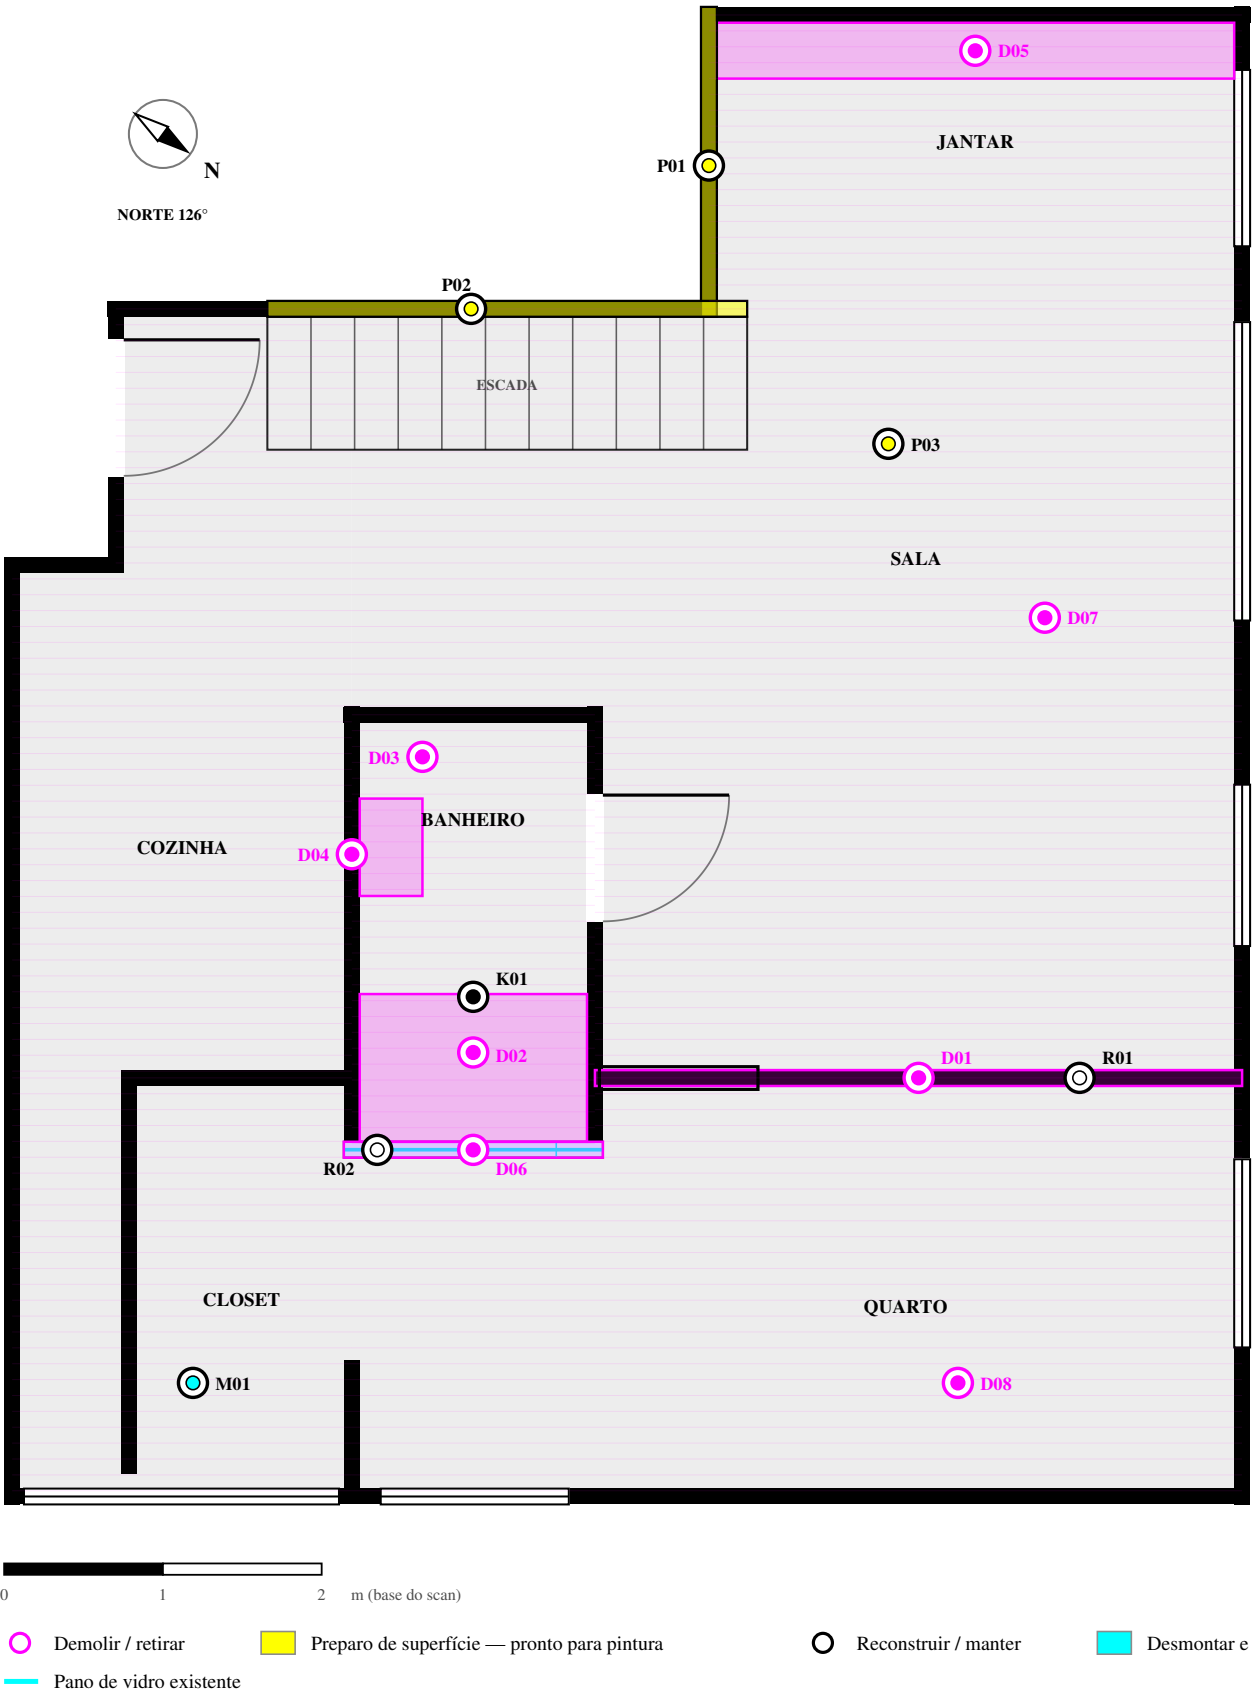

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro	3,80 m²
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta de correr 1,00 × 2,30 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça

Esta planta mostra o estado existente.

O fundo do box aparece como o pano de vidro chão-teto que existe hoje (D06) e a drywall ainda sem porta. O estado proposto — box fechado em parede, drywall nova com porta de correr e a porta do banheiro abrindo para fora, no sentido da escada — está nas Pranchas 03, 04 e 05.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e é reconstruída (R01), agora com uma porta de correr de 1,00 × 2,30 m. A folha estaciona sobre a parede: o trecho de 1,00 m a leste do vão fica reservado — nada de tomada, quadro ou marcenaria ali. Definir se o trilho é aparente, mantendo a drywall de 10 cm, ou embutido em cassete, que exige engrossar a parede. O pano de vidro do fundo do box cai e vira parede (R02): orçar demolição e obra nova como serviços separados.

Banheiro: reforma integral.

Saem piso, revestimentos, fechamento do box e a parede atrás do espelho e da bancada. O vidro do box (K01) segue marcado para manter — confirmar se a reforma o preserva.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.

Hoje isso está mapeado no jantar (P01) e sob a escada (P02) — as duas paredes ficam, só perdem espelho e revestimento. P04 cobre o que aparecer depois: não tem alvo fixo em planta, mas entra no mesmo serviço. Definir o nível de acabamento antes de orçar: massa, lixa e demão de fundo não são a mesma linha que regularização de parede castigada.

A laje inteira é serviço, não sobra da demolição (P03).

Com o forro fora (D07), a laje aparece como está: restos de fixação, marca de fôrma, desnível, fissura, eventual ferro exposto. Prever restauro, descascamento, limpeza e preparo dos 60,30 m², e definir com a empreiteira o acabamento — concreto nu, selador, verniz ou pintura. É esse plano que recebe trilho, evaporadora e calha: quanto mais torto, mais aparece.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição. Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.
